

澎湖縣 112 年度「路面管線工程協調小組」

第 2 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，辦理道路刨除加封工程時，請各管線單位務必在指定期程內配合預埋管線及檢討減量、人手孔蓋下地，並應確保挖掘範圍臨鋪品質，倘沉陷經查驗未符平坦度規定將進行裁罰。
- 二、各管線單位應於人手孔提升施工後，辦理調降下地作業，以維持現有道路平整性，除路面上之人手孔蓋除具有救災功能或特殊需求，經核准得免下地外，其餘人手孔蓋以下地至少十公分為原則，並建議於孔蓋上方加裝地工格網或其他妥適處理方式，以增加其摩擦力避免滑動。
- 三、未下地人手孔蓋及制水閥為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，並派員定期巡視，以維持道路平整確保人車通行安全，如發現缺失(含老舊無止滑效果)應立即改善，倘經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰。
- 四、新設未下地人手孔蓋（面積 $\geq 900\text{cm}^2$ ）抗滑能力之規定，以「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應在 50BPN 以上。

貳、道路挖掘管理事宜

一、有關路證申請單位：

1. 本府工務處：縣道 205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
2. 公路局工務段：縣道 201-204。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

- 二、各機關及管線單位應於施工現場放置施工告示牌或道路挖掘許可證，俾利人員辨識。
- 三、請各管線單位督促施工廠商確實做好相關交通安全維持措施及勞工安全衛生講習，並於道路管線挖掘時，應責成施工廠商注意道路整潔及落實交通

維持計畫書與勞工安全相關規定之執行。

- (一) 將工地相關施工車輛備妥”輪擋”與相關警示標誌，施工中如有占用車道，請派員做好交通指揮工作，倘須封路請提早於路口告示改道。
- (二) 如當日無法完成施工，請做好交維措施並鋪設鐵板(如車輛經過會發出聲響請墊軟墊)，避免高低差之情形，以及加強夜間警示設施，避免意外發生。
- (三) 如暫停施工且無施工人員在場，應於施工範圍放置交通錐做好安全防護措施，確保用路人安全。
- (四) 路旁設施物維(檢)修(基地台、箱體)作業，車輛使(占)用車道，依規應申請臨時路權，並做好相關交維措施。

四、道路挖掘工程範圍：

- (一) 如遇公車行駛路線或靠站地點，請於施工前告知車船處，以利安排公車行駛路線相關事宜。
- (二) 如為大範圍、於社區內或期程較長，施工前協調會除通知管線單位(含本府下水道科)配合，應告知村里長，協調相關事宜(如垃圾車路線，避免造成民眾不便)。

發言紀要：

- (一) 主席：本府委託監理單位進行施工現場稽查，針對不合格比率高及改善成效不佳之單位將以公告方式或行文總公司要求提報改善計畫，並依規裁罰，後續研議將相關辦理事項納入法規。
- (二) 林科長宜德：路權單位辦理道路刨鋪工程希望管線單位能配合預先用戶埋管，另個案用戶申挖，也請以最少挖掘或其他方式，減少道路挖掘，維持道路平整性。
- (三) 中華電信公司：針對預埋部份，需有用戶提出申請才有辦法埋設，無法事先全路段都進行預埋。
- (四) 自來水公司：同中華電信公司意見，考量成本無法施作全路段預埋。

參、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

- 一、系統首頁-最新消息不定時公告道路挖掘資訊及相關配合事項，各單位應定期查看並密切配合，如有相關道路挖掘事宜(範圍大、施工期長、封路)需刊登亦可聯繫本府。
- 二、各管線單位於道路管線挖掘前應先上系統申請，於申請案件時請先釐清施工範圍之土地使用權，勿將非道路用地繪製申請，避免退件造成審核時程延宕；另路權單位應盡速審核案件，避免造成管線單位施工期程延誤及民怨。
- 三、申挖應取得許可證方可施工，如未申請或於未取得許可證前施工將視為擅自挖掘，依規裁罰，如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位也應依程序核發路證。
- 四、各管線單位應配合辦理施工打卡作業，確實於施工期間每日進退場完成打卡(附上進場交維照片、退場警示措施)。
- 五、完工後管線單位應確實上傳資料及圖資更新作業俾利結案。路權單位應於管線單位申報完工後盡速審核，檢視案件資料確認無誤，並於現場查驗平坦度，符合規定再行辦理路權接管。

路權單位	核發路證總數(A)	應申報完工案件數(B)	已申報完工案件數(C)	未申報完工案件數(D) D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件數(F)	完工未結案案件數(G) G=C-F	完工結案比例(H) H=F/C
湖西鄉公所	101	96	77	19	80.2%	21	56	27.2%
七美鄉公所	11	8	6	2	75.0%	0	6	0.0%
澎湖縣政府工務處	129	115	82	33	71.3%	80	2	97.5%
交通部公路局南區養護工程分處澎湖工務段	130	117	99	18	84.6%	46	53	46.4%
馬公市公所	257	217	183	34	84.3%	37	146	20.2%
白沙鄉公所	26	23	19	4	82.6%	5	14	26.3%
吉甯鄉公所	40	36	33	3	91.6%	4	29	12.1%
望安鄉公所	9	5	4	1	80.0%	2	2	50.0%
總計	703	617	503	114	81.5%	195	308	38.7%

申挖單位	核發路證總數(A)	應申報完工案件數(B)	已申報完工案件數(C)	未申報完工案件數(D) D=B-C	申報完工比例(E) E=C/B	完工結案案件數(F)	完工未結案案件數(G) G=C-F	完工結案比例(H) H=F/C
台灣自來水股份有限公司	255	245	204	41	83.2%	64	140	31.3%
台灣電力股份有限公司	264	251	211	40	84.0%	77	134	36.4%
中華電信股份有限公司	173	116	87	29	75.0%	54	33	62.0%
台灣自來水股份有限公司南區工程處	1	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
澎湖縣政府工務處下水道科	4	2	0	2	0.0%	0	0	0.0%
台灣廣網	1	1	0	1	0.0%	0	0	0.0%
澎湖縣政府管線電	2	2	1	1	50.0%	0	1	0.0%
台灣中油股份有限公司	1	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
台灣電力股份有限公司南區供電區管線維護處	2	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
總計	703	617	503	114	81.5%	195	308	38.7%

- 六、道路管理機關辦理路面刨鋪工程完工後，應於系統繪製標示禁挖路段，避免重複開挖，造成民眾觀感不佳。
- 七、有關道路緊急開挖或漏水搶修之案件，管線單位應於系統先行申請緊急案件，並於 Line 群組內上傳地點及照片作為依據，於道路挖掘完成後，依規定三日內辦理系統申請，路權單位亦應追蹤有無申請。
- 八、近期系統資訊安全定期檢測作業，帳密遭破解及侵入，為考量使用安全性，請使用單位及人員配合辦理修改(帳密勿一致，12 碼以上，英文大小寫符號至少各 1，如已離職或無使用請告知本府辦理停用)

發言紀要：

(一) 主席：針對未結案案件請路權單位積極追蹤盡速辦理完成。

肆、道路修復費用支用情形

- 一、本府控管之道路管理基金，依澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第 25 條【管理機關應於申請人辦理管線挖掘路基路面回填完工後六個月內，依收取道路修復費之修復面積，對該挖掘路段進行重新鋪設。】為避免管線單位因有其他因素須辦理道路修復費退費等事宜，請各管理機關務必先行確認已完工結案後，再提報相關修復計畫，辦理請撥修復費用，應以結案久或現況差優先辦理。
- 二、本府所管道路管理基金 113 年度各公所預計提報經費：馬公市公所 3,000 萬，湖西鄉公所 680 萬，七美鄉公所 560 萬，西嶼鄉公所 300 萬，考量本府預算執行率，將以提報順序核定經費，逾期提報或預算匡列完畢將暫不受理，俟追加減預算程序再行辦理請撥作業，請各公所於 113 年 4 月底前提報道路修復計畫送本府核辦(預算書圖需附上欲施工路段照片，以確為管挖事實)，並於 6 月底前辦理發包完成，於 10 月 30 月底前報府核銷結案，每月應回報本府承辦人員執行進度，俾利控管預算執行。

伍、其他配合事項：

- 一、請各管線單位於每季次月 10 日前統計人手孔蓋及制水閥下地數量，提報本府彙整資料。

- 二、申請道路側溝及雨水下水道纜線暫掛之單位應依「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」規定辦理定期檢視工作，以確保現有排水設施正常，並於每季次月 15 日前提送季巡查結果予管理機關備查(如暫掛雨水下水道之單位，請函文下水道科)，並同步資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續纜線暫掛。
- 三、申請共同管道納管之單位應依「澎湖縣共同管道管理辦法」規定於每年一月三十一日前提送年度定期安全巡檢計畫報府核辦，並依計畫辦理巡檢工作提送季巡查結果予本府備查，並同步將資料上傳系統，倘未依規定提送者將不同意繼續納管。
- 四、本縣沙港土資場刨除料可提供各單位做為回填材料粗細骨材，如有所需求，請洽本府土木科申請。
- 五、本府預訂 112 年 11 月份辦理系統操作教育訓練，請各單位務必派員參加。

發言紀要：

- (一) 土木科：纜線附掛側溝，請依照規定釘掛或使用管套，不應垂落，施作清溝作業挖掘易損壞。
- (二) 澎湖有線電視公司：本公司積極配合，視現場情形配合辦理釘掛作業，部份水溝內部有多條管線，如再加上管套，空間將不夠，釘掛位置多於溝蓋下方，抽換或檢修方好操作，亦會拉緊中間管線不垂落。
- (三) 主席：是否強制使用管套，後續將另案討論修法。

陸、施工路段協調

- 一、112 年度施工路段管線協調(附件 1)。
- 二、113-115 年度預計施工路段管線協調(附件 2)。
- 三、112-115 年度施工位置圖檔(附件 3)。

柒、臨時動議

- 一、道路修復費為專款專用經費，目前鄉市公所主要辦理 PC 道路管挖改善刨鋪工程，AC 道路如遇路段少無法發包，是否納入本府開口契約辦理，屆時扣除各轄管單位道路修復費用？

發言紀要：

- (一) 與會單位-湖西鄉公所、白沙鄉公所、西嶼鄉公所：配合辦理。
- (二) 未與會單位(會後與承辦確認)-望安鄉公所、西嶼鄉公所：配合辦理；
馬公市公所：俟收到會議紀錄,簽核彙整本所意見後函復。

捌、會議結論

- 一、本次會議共協調路面工程 112 年度 82 案，113-115 年度 16 案，會議決議詳如彙整表，請各路權單位及管線單位遵照辦理。
- 二、本會議為年度大會，各單位務必派員與會，路權單位更應以身作則，爾後未與會說明之單位，提案將駁回不予受理，延至下一次會議審核；未提報之計畫型案件一律不予受理申請路權。
- 三、有關道路挖掘回填作業多被民眾詬病，已成重大民怨之一，為提升道路品質，本府已委託顧問公司辦理監理作業，依近期監理成果，抽查合格率仍偏低，故請各管線單位積極要求提升工程品質，確保道路平整，未來針對不合格比率高及改善成效不佳之單位將以公告方式或行文總公司要求提報改善計畫，並依規裁罰，後續研議將相關辦理事項納入法規。

玖、散會

澎湖縣轄區內112年度辦理之道路及管線工程項目彙整表

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
1	公路局 澎湖工務段	201縣道7K+000-10K+103路面改善及縣道擇要路面整修工程(時裡到風櫃)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路局 澎湖工務段	W=m, L=m	預計113年初	112/2/6工務段已開協調會	照案通過 請管線單位配合辦理	
2	公路局 澎湖工務段	203線4K+832-6K+818路面整修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路局 澎湖工務段	W=m, L=m	已完工		解除列管	
3	公路局 澎湖工務段	澎湖縣主要道路改善工程 203縣道26K+500~28K+000路面改善(竹灣-大池)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路局 澎湖工務段	W=18-20m, L=1500m	112/10/11開工 預計112年底完工	112/2/6工務段已開協調會	照案通過	
4	公路局 澎湖工務段	203線34K+095-34K+970路面整修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	公路局 澎湖工務段	W=m, L=m	已完工		解除列管	
5	澎湖縣政府	澎25號線鄉道改善工程 (烏坎至鎖港圓環)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=4121m	已完工		解除列管	
6	澎湖縣政府	馬公市民權路(民生路至惠民路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=12m, L=260m	路面施工期112/11	已開施工前協調會	照案通過 請管線單位配合辦理	台電配合共管設置

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
7	澎湖縣政府	馬公市四維路(六合路至民族路)共同管溝埋設及道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=1000m	已完工		解除列管	
8	澎湖縣政府	馬公市中華路(樹德路至同和路)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=590m	路面施工期112/11	已開施工前協調會	照案通過 請管線單位配合辦理	
9	澎湖縣政府	馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=15m, L=600m	路面施工期112/11	已開施工前協調會	照案通過 請管線單位配合辦理	新生路-北辰街口自來水工程核准期程內配合辦理，逾期不受理
10	澎湖縣政府	112年度市區道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年下半年度	仁愛路 中山路 新復路	照案通過 請管線單位配合辦理	
11	澎湖縣政府	澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=15m, L=2089m	施工中 預計112年11月底完工		照案通過	
12	澎湖縣政府	112年度道路挖掘改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		施工中	西衛、鐵線、大賢街、興港北街 介壽街、經國路、文德路、案山、菊島福園	照案通過 請管線單位配合辦理	1. 馬公市公所道管經費(路修費專款專用) 2. 中華電信西衛中路於112/10/20前配合用戶接管

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
13	澎湖縣政府	風櫃蛇頭山聯外道路建置工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		路面施工期112/11		照案通過 請管線單位配合辦理	1. 台電目前進行埋管 2. 與112-69案自來水重複路段 3. 中華電信辦理共管銜接工程
★14	澎湖縣政府	鎖港都市計畫國宅段市區道路開闢工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	國土管理署南區工程署	W=8m, L=310m W=12m, L=120m	已開工，路面施工期113上半年度	已開施工前協調會	照案通過 請管線單位配合辦理	
15	澎湖縣政府	澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=1800m~ L=650m	已完工	澎7、澎8	解除列管	
★16	澎湖縣政府	澎21線鄉道改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		發包中，預計11月開工		照案通過 請召開管線協調會	
★17	澎湖縣政府	112年度村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		112年底施工	龍門、東衛、東石、隘門	照案通過 請召開管線協調會	
18	澎湖縣政府	112年度望安村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		已完工		解除列管	
19	澎湖縣政府	將軍玄武岩露頭景觀道路串連計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		已完工		解除列管	

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
20	澎湖縣政府	112年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府 下水道科	W=m L=400m	已完工	重光海堤公園至重光出海 日箱涵新建工程	解除列管	
21	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道 系統第一期工程分支管網及 用戶接管工程第二標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府 下水道科	W= m, L= 3012m	施工中-113年6月	光榮地區： 民族路約-五福路-文光 路660m、文光路-陽明 路-貿商街約720m、三 多路-貿商街約 340m(200mm連接管)、 忠孝路影響長度約 38.5m、民遠路140m、 自立路影響長度約 82.5m、治平路 91.7m(200mm連接管)、 山仔頂路140.0(200mm連	照案通過 請管線單位配合辦 理	1. 公所道路修復暫緩實施 2. 中華電信已提供管線位 置資料，請下水道科施工 前再次聯繫確認，避免挖 壞管線
22	澎湖縣政府	澎湖縣馬公地區污水下水道 系統第一期工程-分支管網及 用戶接管工程第三標	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府 下水道科		預計112年下半年 度	五福路78巷89m、五福 路61巷77m、五福路138 巷215m、五福路638m、 忠孝路85m、忠孝路77 巷52m、信義路165m、 文光路150m	照案通過 請管線單位配合辦 理	已開施工前協調會
23	澎湖縣政府 及 市公所	「馬公市光榮集污區內機關 及學校污水下水道用戶接管 新建工程」	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府 下水道科	忠孝路61.5m、 治平路68.8m	預計112年		照案通過 請召開管線協調會	

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
24	澎湖縣政府、 各鄉市公所	紅綠燈及監視系統	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府 警察局		預計112年	號誌燈桿 中華、新村路口(新增) 文學路、永福街口(新增) 新生路、永福街口(新增) 新店路、永福街口(新增) 明遠、信義路口(新增) 同和路、北辰街口 光復路、明遠路口(汰換) 路燈桿 縣道203線西文里97-50 號前岔路口(新增) 新生、水源路口(新增) 縣道204線澎26線中華 電信機房前岔路口(新增)	照案通過 禁挖路段請過禁挖 期再行施作	需道路挖掘請警察局上系 統申請，核准方可施作， 如遇禁挖路段請於過禁挖 再行申請
25	公路局澎湖 工務段及 湖西鄉公所	澎204縣道及澎19號線交通號 誌設置	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府 警察局		已完工		解除列管	
26	馬公市公所	112年度馬公市各里道路改善 工程(第1標)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	馬公市公所		施工中	大仁街、時裡水仙宮前	照案通過 請管線單位配合辦 理	屆時完工請公所於系統繪 製禁挖範圍
★27	馬公市公所	112年度馬公市各里道路改善 工程(第2標)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局	馬公市公所		預計112年下半年 度	五福路、石泉、風櫃、 前寮、興仁	照案通過 請召開管線協調會	屆時完工請公所於系統繪 製禁挖範圍

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
★28	馬公市公所	112年度馬公市各里道路改善工程(第3標)	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局 	馬公市公所		預計112年下半年度	鐵線、井坎	照案通過 請召開管線協調會	屆時完工請公所於系統繪製禁挖範圍
29	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第1標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=2.54-8.16m, L=1954.5m	完工	道路翻修為混凝土道路 (含水溝清淤、溝面重作 北寮村(長246M、均寬約2.54M、面積620.03	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
30	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第2標	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	湖西鄉公所	W=4.0-6.78m, L=1504.5m	完工	道路翻修為混凝土道路 (含水溝清淤、溝面重作 許家村(長401.5M、均寬約6.78M、面積計	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
31	澎湖縣湖西鄉公所	(112)湖西鄉農路改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉公所	W=約3.8m L=約1400m	施工中	澎湖022號農路改善(澎19號線)往西溪太武南營區路段	照案通過	1. 已發文，無配合單位 2. 屆時完工請公所於系統繪製禁挖範圍
32	澎湖縣湖西鄉公所	(112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉公所	W=約3.5m, L=約1000m	施工中	1.沙港廣聖殿往澎11號線2條道路改善 2. 尖山舊顯祭殿澎17號線東側管挖路段改善	照案通過	1. 變更追加路段請與管線單位協調 2. 屆時完工請公所於系統繪製禁挖範圍
33	澎湖縣湖西鄉公所	(112)湖西鄉龍門村道路水溝改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 	澎湖縣湖西鄉公所	W=約4.15m, L=約355m	完工	1. 龍門中路至青擔尾產業道路改善 2. 龍門育安診所至觀音宮旁公廁水溝整建 3. 龍門村119-41、42號宅前水溝新設	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
34	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)湖西鄉龍門村119-11號 宅旁排水改善工程	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約5.89m, L=約83.4m	預計112年12月	119-11號宅旁排水暨路面改 善	照案通過 請召開管線協調會	1. 規劃設計中 2. 屆時完工請公所於系統 繪製禁挖範圍
35	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)湖西鄉南寮村道路水 溝改善工程	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約3.16m, L=約709.3m	取消	A:南寮活動中心至119-6號 宅路面暨水溝改善 B:南寮142號宅旁路面改 善 C:南寮106號宅旁路面改 善	解除列管	
★36	澎湖縣湖西 鄉公所	(112)中油睦鄰專案-湖西鄉湖 西村道路排水改善工程	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約5.74m L=約80.4m	完工	湖西村41-15宅東至41-5宅 前道路	解除列管	
★37	澎湖縣湖西 鄉公所	湖西鄉道路改善工程第3標	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約6.42m, L=約1204m	113年上半年度 (過年後發包)	1.澎湖13號鄉道至白坑活動中 心路段 2.青螺、白坑生命紀念館聯 外道路 3.許家村152號宅至203縣道 4.沙港社區活動中心西側及 北側道路 5.潭邊新段1051-8地號(潭 邊村21-3號~32-3號)	照案通過 請召開管線協調會	1. 規劃設計中 2. 中華電信須配合 3. 屆時完工請公所於系統 繪製禁挖範圍
★38	澎湖縣湖西 鄉公所	湖西鄉道路改善工程第4標	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約5m, L=約1840m	113年上半年度 (過年後發包)	1. 西溪國小西側通學道路 2. 龍門戰車廁所至風力發 電沿線 3. 沙港國小西南側通學道 路	照案通過 請召開管線協調會	1. 規劃設計中 2. 中華電信須配合 3. 屆時完工請公所於系統 繪製禁挖範圍
★39	澎湖縣湖西 鄉公所	湖西鄉許家村AC路面及排水 改善工程	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	澎湖縣湖西鄉 公所	W=約8m, L=約450m	112年下半年度	許家村四季常照養護中心 至許家飛彈部隊軍營水溝 新設及AC路面重鋪	照案通過 請召開管線協調會	1. 規劃設計中 2. 中華電信須配合 3. 屆時完工請公所於系統 繪製禁挖範圍

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
40	白沙鄉公所	白沙鄉通梁村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=2.04M-12.33 M——長度 L=2400.2M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
41	白沙鄉公所	白沙鄉講美村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=3.25M-12.05 M——長度 L=679.4M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
42	白沙鄉公所	白沙鄉巷子村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=2.64M-21M 長度L=371.2M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
43	白沙鄉公所	白沙鄉赤炭村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=3.03M-16.23 M——長度 L=740.5M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
44	白沙鄉公所	白沙鄉小赤村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=3.11M-10.6M 長度L=319.1M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
45	白沙鄉公所	白沙鄉瓦硯村路面改善工程	■台電↖ ■自來水公司↖ ■中華電信↖ ■澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=4.65M-18.22 M——長度 L=534M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
46	白沙鄉公所	白沙鄉後寮村路面改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	白沙鄉公所	平均寬 W=2.25M-14.99 M——長度 L=2068.4M	完工	配合內政部營建署前瞻計畫(竣工後3年內不得有開挖管線行為)	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
47	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 7.1 m L= 915 m	施工中 預計年底前完工	月鯉灣-龍埕	照案通過	1. 請台電於年底配合完成 2. 屆時完工請公所於系統繪製禁挖範圍
48	七美鄉公所	澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	七美鄉公所	W= 4.6 m L= 1,692 m	完工	環海道路	解除列管	請公所於系統繪製禁挖範圍
49	公路局 澎湖工務段	尖山~赤崁線M42人孔提升及降埋 (203 縣道 4K+953, 往安宅社區路口)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	113年中發包	因人孔曾有滲水情形，故須抽水配合澎湖工務段路面改善工程降埋後，俟完工後提升(203縣道4K+953, 往安宅社區路口)	照案通過	請上系統申請
50	公路局 澎湖工務段	69kV澎湖~尖山紅白線M1及澎湖~馬公紅白線M2人孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *2處	施工中 預計112年12月中完工	人孔開孔點檢(204縣道8K+911~204縣道9K+171, 尖山電廠周圍)	照案通過	
51	澎湖縣政府	69kV澎湖~紅白線M36-M40人孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *5處	施工中 預計112年12月中完工	人孔開孔點檢(新店路4之2號(花菜干)-197號(喜來登飯店旁))	照案通過	1. 共同管道永久禁挖區 2. 專案報府

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
52	湖西鄉公所	白坑村(社區)架空線路地下 化預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份 有限公司澎湖 區處	W= 0.6m, L=2,000m	預訂113年 4月-10月	澎13號線部分~白坑社 區 規劃設計中	照案通過	1. 規劃設計中 2. 縣府預計113年度施作 工程(113-02)，請與土木 科確認路段及期程，並於 前辦理完成
53	公路局 澎湖工務段	馬公海淡廠至成功場管線連 絡工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處	W=1.5 m, L=1,300m	預計112年至113年	本案預定由澎202號線 (國軍副食品供應站門 口)至成功淨水場路段	照案通過	1. 設計中，預計年底發包 2. 經查202縣道禁挖時間 至112年11月，請於過禁 挖專案向工務段申請，施 工完成需重新鋪設道路 3. 澎21線部分路段與土木 科(112-16)重複，請於縣 府施作前完成
54	公路局 澎湖工務段	烏崁海淡廠送白沙淨水場清 水管工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處	W=1.0m, L=14,000m	預計112年至113年	本案預計由澎202號線 (東衛國軍副食品供應 站門口)沿澎12號線至 鼎灣轉203號線至赤崁 白沙淨水場，全長約 14,000m，依各路段未 禁挖可施工路段分別於 112-113年辦理。	照案通過	1. 設計中 2. 經查部分(圖檔黑線)禁 挖時間至112年11月11日 ，請於過禁挖向工務段申 請 3. 施工完成需重新鋪設道 路
55	湖西鄉公所	馬公海淡廠送水管大城北音 管段連接工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m- L=900m	完工	原澎21線道經城北村反 應已無空間可供埋設施 工，經協助後改由鄉道 連結管線	解除列管	
56	七美鄉公所	七美嶼900噸海水淡化廠興建 工暨委託代操作維護	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m- L=2200m	完工	海淡廠出水管線與暨有 送水管線連結	解除列管	

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
57	白沙鄉公所	吉貝嶼600噸海水淡化廠興建 工程暨委託代操作維護	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司南區工程處	W=1m、 L=1600m	完工	海淡廠出水管線與暨有 送水管線連結	解除列管	
58	七美鄉公所	澎湖湖七美鄉平和村汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=5,600m	設計中 預計113年度發包	本案預計汰換平和村頂 茄埕、下茄埕與九孔生 態園區等區域管線汰換	待七美鄉公所決議	1.請與七美鄉公所確認是 否有無禁挖並取得同意 2.部分路段與鄉公所113 年度工程重複(紅色路線) ，請與鄉公所協調
59	馬公市公所	澎湖馬公市民族路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,500m	取消	本案預計辦理馬公市民 族、忠孝、民遠、信義 路等市區道路管線汰 換。	解除列管	
60	馬公市公所	澎湖馬公市民權路等市區道 路汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=13,000m	取消	本案預計辦理馬公市民 權、光復、文化、民 生、二民、中興、光 明、惠民、中山路等市 區道路管線汰換。	解除列管	
61	馬公市公所	澎湖馬公東衛、城北汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=9,000m	本案已解約，預計 112年10月起再辦 理發包施作	本案預計辦理馬公市東 衛里及湖西鄉城北村社 區內管線汰換。	照案通過	
62	湖西鄉公所	澎湖湖西鄉澎12號線汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,100m	預定112年12月開 工	本案預計辦理澎12號線 (鼎灣監獄-203號線路 口)管線汰換。	照案通過	
63	馬公市公所	澎湖馬公市文化路、文康街 汰換管線工程(三總小區汰換 管線工程)	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=470m	預計最慢112年11 月進場	本案預計汰換文化路與 文康街路段管線汰換	照案通過	文康街鋪磚請原狀回復

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
64	公路局 澎湖工務段 澎湖縣政府	澎湖馬公供水改善工程(海淡 300汰換管線工程)	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 1m、 L=70m	預計112年11月開 工	本案預計辦理澎204號 線3K+200M-3K+250M(含 橫越)(204號線與205號 線路口)，及澎205號線 0K+700M處(三官殿前)	照案通過	三官殿前開挖範圍如涉及 禁挖路段，請於過禁挖再 行申請
65	馬公市公所	澎湖馬公市文明路126巷等汰 換管線工程(三總小區汰換管 線工程)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,500m	預計最慢112年11 月進場	本案預計辦理馬公市文 明路126巷及周邊道路 管線汰換，原列於111 年辦理，改列入112年 辦理。	照案通過	
66	馬公市公所	澎湖馬公市六合路等汰換管 線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=2,300m	預計112年11月開 工	本案預計辦理馬公市六 合路整段及周邊道路管 線汰換，原列於111年 辦理，改列入112年辦 理。	照案通過	請專案申請，後續辦理專 款專用創鋪改善工程
67	公路局澎湖 工務段及馬 公市公所	澎湖馬公市烏坎海淡廠前送 水管汰換工程(海淡300汰換 管線工程)	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=800m	預計112年11月開 工	本案預計辦理烏坎海淡 廠前至204號線(含橫越 204線路段)送水管汰換	照案通過	縣府預計113年度(113- 01)施作工程，請於前施 作完成
68	馬公市公所	澎湖馬公市新營路南段管線 汰換工程(三總小區汰換管線 工程)	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1100m	預計最慢112年11 月進場	本案預計辦理新營路南 段及澎澄飯店南側道路 管線汰換	照案通過	
69	馬公市公所	澎湖風櫃里增設200噸配水池 工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公 司第七區管理 處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.8m、 L=420m	施工中	本案預計於風櫃里金王 殿東側辦理增設配水池 埋設連接配水管線	照案通過	與縣府112-13路段重複， 請參加月會討論，並於前 施作完成
70	馬公市公所	澎湖地區加油站地下儲槽暨 油電管等更新工程-鎖港漁船 站	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電 視、	中油公司澎湖 營業處馬公直 銷服務中心	W= 1 m L= 365 m	預計113年年中開 工	鎖港漁船站發油管線汰 換工程	待馬公市公所決議	請與馬公市公所確認是否 有無禁挖並取得同意

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
71	公路局澎湖 工務段及馬 公市公所	台灣中油6吋及8吋管線開挖 檢查(202縣道國軍副食品段)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=1.5 m, L= 40 m	預計112年中至113 年中	1. 澎21縣及202縣道(國 軍副食品)交接處橫切 道路至202縣道國軍副 食品段檢查2條長途管 線狀況。2. 確認其它管 線是否有影響到中油管	照案通過	1. 禁挖期限至112年11月 11日，請於過禁挖再行申 請 2. 與台電嘉南供電確認有 無影響
72	公路局澎湖 工務段及馬 公市公所	台灣中油6吋及8吋管線智慧 型通管器檢查後開挖驗證	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電 視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=4 m, L= 60 m	預計113年1月施工	1. 範圍:馬公至湖西約 12公里(興港南街-民福 路-樹德路-203線 1K+110-4K+200- 202線 0K+000-7K+530-澎19 號-湖西供油中心。2. 針 對智慧型通管器檢查後 管線腐蝕較嚴重處進行 開挖檢查	待路權單位決議	1. 禁挖期： 澎19號-111/7/19 203線-112/7/10 民福路、興港南街- 112/12/10 請與各路權單位確認是否 有無禁挖並取得同意 2. 預計112年底檢查報告 出再施工
73	公路局 澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查 (明興驗車廠前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電 視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=2 m, L= 5 m	預計112年年底安 排施工	目前暫緩，待檢查後再 決定是否開挖	待審議	
74	公路局 澎湖工務段	台灣中油馬公管線開挖檢查 (文東加油站前開挖)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電 視、	台灣中油澎湖 營業處湖西供 油服務中心	W=2 m, L= 5 m	預計112年年底安 排施工	目前暫緩，待檢查後再 決定是否開挖	待審議	
75	公路局 澎湖工務段	臺澎#4長途光纜登陸點管道 土木工程(204縣道 7K+585~7K+600路段)	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	中華電信	管道挖掘	預計112年下半年 度	臺灣澎湖第一、二海纜 老舊，亟需汰換。	照案通過	與台電嘉南供電確認
76	公路局 澎湖工務段	澎金#4長途光纜登陸點管道 土木工程(203縣道 21K+850~21K+855路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖掘	預計112年下半年 度	澎湖金門一、二海纜不 敷使用，亟需增設。	照案通過	

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦 道路工程單 位名稱	工稱項目名稱概要	配合之管 線單位	施工單位	施工寬、長	施工期程	說明	決議	備註
77	湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜管道土木 工程(20號道路終點70公尺 及往白灣道路登陸點人孔管 道)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	完工	臺灣澎湖#4長途光纜陸 纜佈放需要。	解除列管	
78	白沙鄉公所	澎金#4長途光纜陸纜管道土 木工程(海底寶商店前至通樑 北港聯外道路)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	管道挖埋	預計112年下半年 度	澎湖金門#4長途光纜陸 纜佈放需要。	照案通過	
79	公路局澎湖 工務段及 湖西鄉公所	臺澎#4長途光纜陸纜佈放線 路工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	預計112年下半年 度	澎湖金門#4長途光纜陸 纜佈放需要(林投登陸 人孔-通樑登陸人孔區 間路段)。	照案通過	
80	公路局 澎湖工務段	白沙局-西嶼局96C中繼光纜 線路佈接工程(203線 18K+000~27K+000區間路段)	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	中華電信	提升人孔	預計112年下半年 度	局間中繼需要	照案通過	
★81	澎湖縣政府	澎湖縣政服務中心周邊道路 改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		預計112年11月施 作	忠孝路、民遠路、民族 路、治平路人行道施作	照案通過 請召開管線協調會	請與下水道科確認範圍
★82	澎湖縣政府	112年度排水急需改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 新世紀資通	澎湖縣政府	橋板拆除重建	預計112年下半年 度	湖西鄉城北1號過路橋 板拆除重建	照案通過	自來水公司須配合，現場 協調

澎湖縣轄區內113年至115年度預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

紅字為已提報案件修改資料，黃底為新增案件

編號	路權或主辦道路工程單位名	工稱項目名稱概要	配合之管線單位	施工單位	施工寬、長	施工工期	說明	決議	備註
113-1	澎湖縣政府	「澎20線道路拓寬工程（烏崁-隘門）」	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=m, L=1288m	預計113年下半年度		照案通過 請召開管線協調會	自來水公司需配合
2	澎湖縣政府	澎13線0K+000~2K+200	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府	W=8m, L=2200m	預定113年上半年度	澎13號線(湖西至青螺社區)	照案通過 請召開管線協調會	台電公司確認範圍(112-52)有無重複
★3	澎湖縣政府	澎湖縣馬公市機三北側8米計畫道路開闢工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	國土管理署 南區工程署	W=8m, L=140m	預定113年	設計中	照案通過 請召開管線協調會	設計中
★4	澎湖縣政府	澎湖馬公市案山段8米計畫道路開闢計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	國土管理署 南區工程署	W=8m, L=120m	預定113年	設計中	照案通過 請召開管線協調會	設計中
5	澎湖縣政府	112年度花嶼村里道路改善工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		原112年下半年度 改113年上半年度	2個工區	照案通過 請召開管線協調會	
6	澎湖縣政府	吉貝村里道路改善工程(約略施作區域)	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	澎湖縣政府		原112年下半年度 改113年上半年度	約略施作區域	照案通過 請召開管線協調會	
7	澎湖縣政府	113年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	原訂114年執行改 至113年度	文光路及成功街雨水下水道箱涵頂板改善工程成功街-三多至文光、文光路-三多至陽明)、石滬廣場下方雨水下水道改善工程(箱涵重建工程,中山路至馬公港)	照案通過 請召開管線協調會	1.與台電嘉南供電確認 2.與中華電信公司確認,手孔於箱涵上


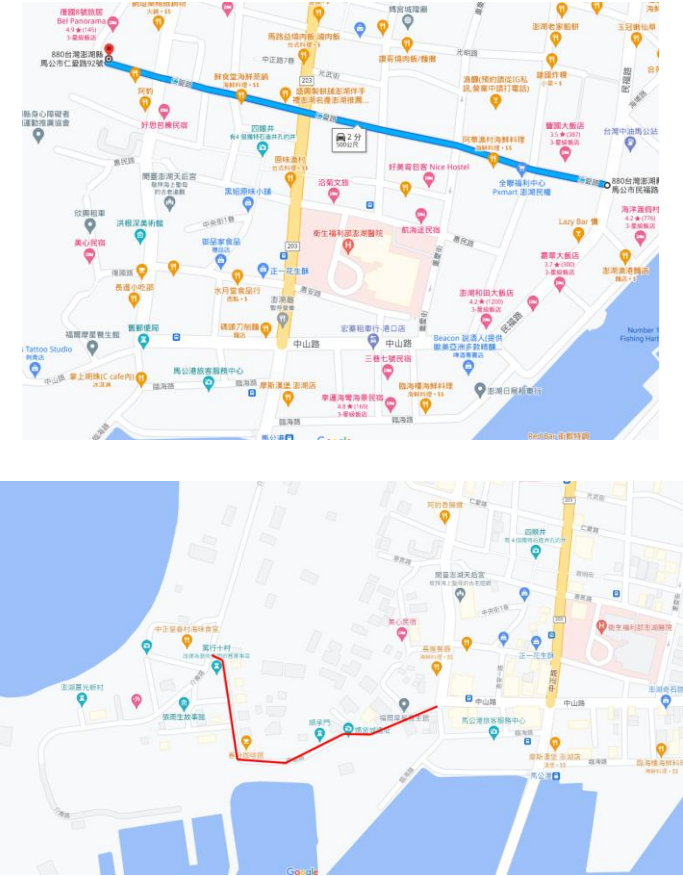
8	七美鄉公所	七美鄉平和村線路改善預埋管路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,600m	預定112年4月-12月 預計113年4月~10月	七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮風味餐旁 規劃設計中	照案通過	
9	馬公市公所	澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m、 L=1,200m	預計112年 預計113年	本案預計辦理馬公市敬業街及203號線台電公司周邊道路管線汰換，原列入112年改列入113年辦理。	照案通過	
10	馬公市公所	台灣中油馬公管線開挖檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	W=2 m, L= 20 m 計5處	預計112年中至112年底 預計113年中至113年底	檢查從馬漁站興港南街、民福路、臨海路至馬公碼頭等管線	照案通過 禁挖路段請過禁挖期再行施作	1.開挖點1：請與旅遊處取得同意 2.開挖點2、3：禁挖期至112/12/10，請過禁挖期再行申請 3.開挖點5：請與港務局取得同意
★11	公路局澎湖工務段/澎湖縣政府	澎205號線7K+7.5起~204號線0K至0K+3.6~201號線0K+2 紓理設管道改善線路工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 新世紀資通 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	新世紀資通	W=管溝寬度1m L=600m	預計113年6月~114年度	本案預計辦理澎205號線7K+7.5-澎204號線0K至0K+3.6-澎201號線0K+2處管線連接改善	照案通過 禁挖路段請過禁挖期再行施作	1.201縣道禁挖期至113/12/4，請過禁挖期再行申請 2.上系統申請取得路證方可開挖施作
12	澎湖縣政府	69kV澎湖~馬公紅白線M41人孔提升	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *1處	113年2月~113年12月 配合禁挖期改至113年度	人孔開孔點檢(海埔路上快樂渡假村南路口)	照案通過 過禁挖期施作	1.人手孔檢點後請辦理下地 2.禁挖期至112/12/10，請過禁挖期再行申請
114-1	公路局澎湖工務段	69KV澎湖~馬公紅白線M10~M12人孔提升點檢	<input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台電嘉南供電區營運處	W= 1.6 m L= 1.6 m *3處	113年2月~113年12月 配合禁挖期改至114年度	人孔開孔點檢(204縣道6K+903~204縣道6K+495)	照案通過	1.人手孔檢點後請辦理下地 2.禁挖期至113/12/4，請過禁挖期再行申請
2	澎湖縣政府	114年度雨水下水道改善工程	<input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局	澎湖縣政府	W=m L=300m	原定113年度改至114年度	同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程(同和路-中華至新生)	照案通過	1.中華電信須配合

★3	白沙鄉公所	澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6~1m、 L=14200m	預計114年底	汰換白沙鄉赤崁村管線	駁回 修正後再次提報	1. 部分路段公所112年度前瞻計畫已施作完成，屬三年禁挖 2. 請與公所協調確認可施作範圍
★4	白沙鄉公所	澎湖縣白沙鄉通樑村管線汰換工程	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所	w=管溝寬度 0.6m~1m、 L=8600m	預計114年底	汰換白沙鄉通樑村管線	駁回 修正後再次提報	1. 部分路段公所112年度前瞻計畫已施作完成，屬三年禁挖 2. 請與公所協調確認可施作範圍

112 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
<p>112-01</p> <p>201 縣道 7K+000-10K +103 路面改善及縣道擇要路面整修工程(時裡到風櫃)</p> <p>提案單位： 公路局 澎湖工務段</p>		
<p>112-03</p> <p>澎湖縣主要道路改善工程 203 縣道 26K+500~28K+000 路面改善(竹灣-大池)</p> <p>提案單位： 公路局 澎湖工務段</p>		


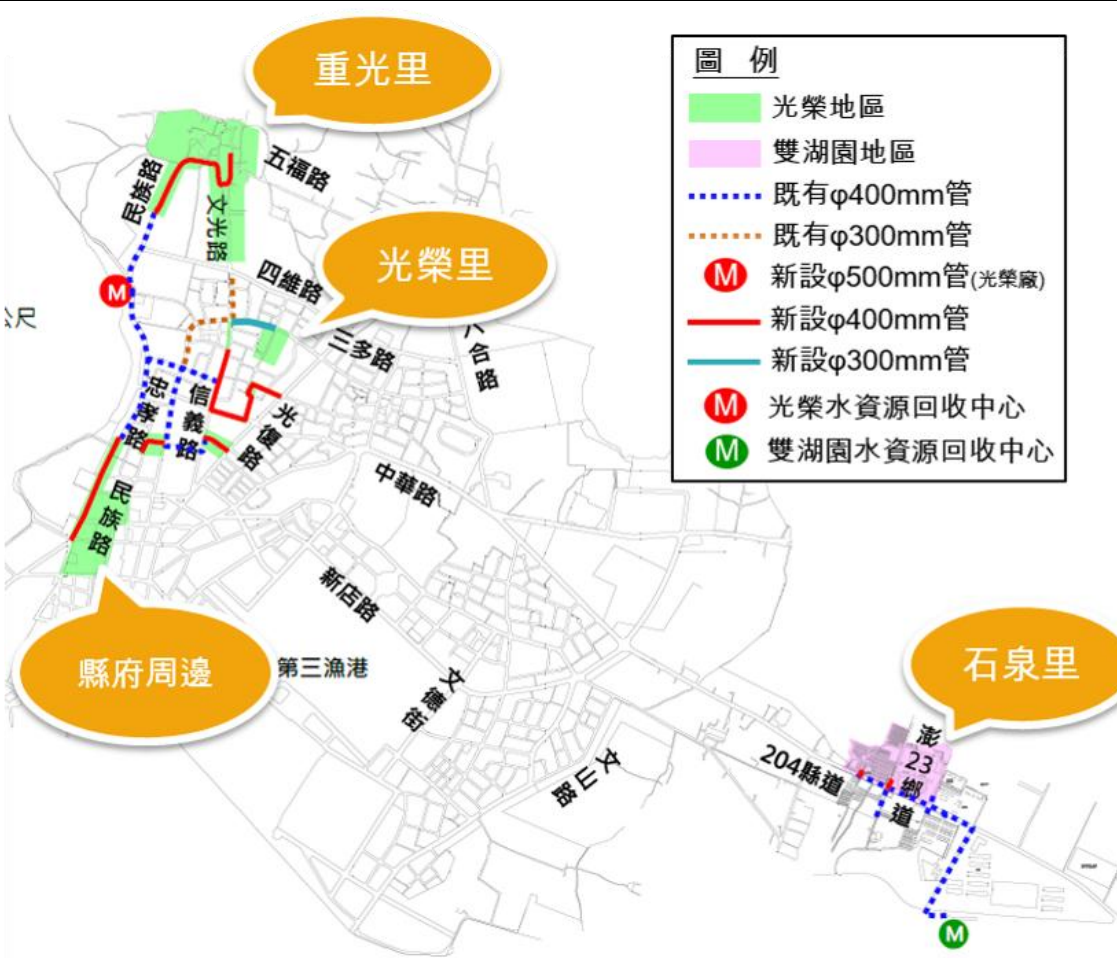
編號	位置	圖
<p>112-06</p> <p>馬公市民權路(民生路至惠民路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>		
<p>112-08</p> <p>馬公市中華路(樹德路至同和路)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>112-09</p> <p>馬公市新生路(民生路-北辰街)道路及人行道改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>		
<p>112-10</p> <p>112 年度市區道路改善工程</p> <p>提案單位：澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>112-11</p> <p>澎湖縣林投都市計畫區道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-12</p> <p>112 年度道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1- 西南(207-2號~563號) 約50+330+108+48.8m 2- 西南(木子家民宿→仁居民宿) 約13.3m 3- 西南(社區路口→里辦公室前) 約18.0m 4- 介壽路(青年活動中心前) 約34.8m 5- 興港北街(光正碼頭) 約87m 6- 文德路(經國路口) 約12.5m 7- 文德路(益船廠前) 約57m 8- 經國路 約40.9m 9- 萊山(活動中心前) 約30.0m 10- 大賢街(文學路→文德路口) 約27.3m 11- 菊島福園 約85.3m 12- 鐵線外環 約26.5m 	

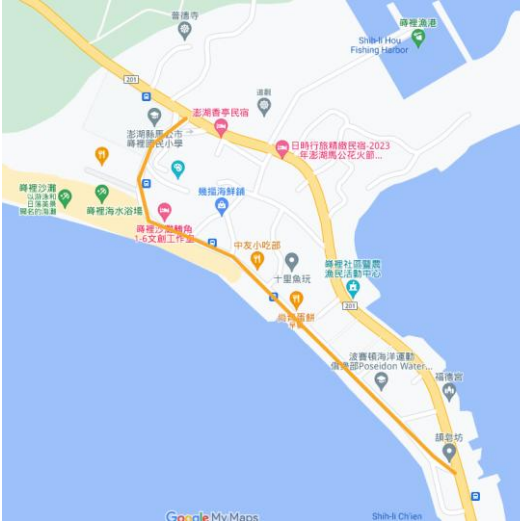


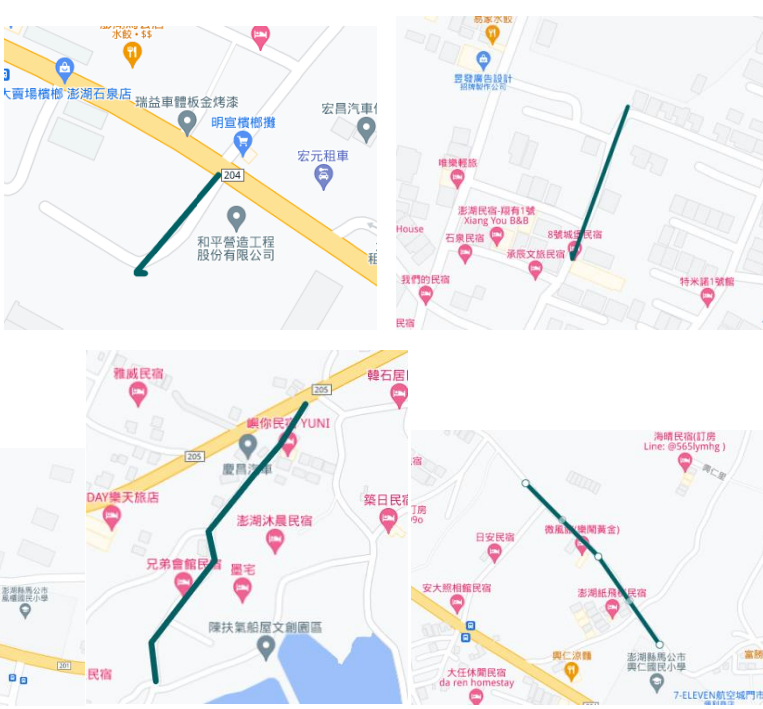
編號	位置	圖
<p>112-13</p> <p>風櫃蛇頭山 聯外道路建 置工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>★ 112-14</p> <p>鎖港都市計 畫國宅段市 區道路開闢 工程</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p>		

編號	位置	圖
<p>★ 112-16</p> <p>澎 21 線鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>★ 112-17</p> <p>112 年度村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>112-20</p> <p>112 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>112-21</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <div data-bbox="1023 1093 1417 1532" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>圖例</p> <ul style="list-style-type: none"> 光榮地區 雙湖園地區 既有φ400mm管 既有φ300mm管 M 新設φ500mm管(光榮廠) 新設φ400mm管 新設φ300mm管 M 光榮水資源回收中心 M 雙湖園水資源回收中心 </div>	

編號	位置	圖																																						
<p>112-22</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第三標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <table border="1" data-bbox="1141 716 1337 1144"> <thead> <tr> <th>路段名稱</th> <th>長度(M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>五福路 (澎 31)</td><td>211.4</td></tr> <tr><td>五福路 138 巷</td><td>321</td></tr> <tr><td>五福路 201 巷 8 弄</td><td>142.5</td></tr> <tr><td>五福路 61 巷</td><td>77.5</td></tr> <tr><td>五福路 78 巷</td><td>96</td></tr> <tr><td>三多路 288 巷</td><td>85</td></tr> <tr><td>三多路</td><td>113.5</td></tr> <tr><td>三多路 330 巷</td><td>93.5</td></tr> <tr><td>文光路 (澎 31)</td><td>47.09</td></tr> <tr><td>文光路 135 巷</td><td>75.5</td></tr> <tr><td>光榮街</td><td>3.98</td></tr> <tr><td>文光路第一橫巷</td><td>188.5</td></tr> <tr><td>開明路 (澎 30)</td><td>2.09</td></tr> <tr><td>忠孝路 77 巷</td><td>31</td></tr> <tr><td>信義路 9 巷</td><td>91</td></tr> <tr><td>明遠路</td><td>128</td></tr> <tr><td>信義路</td><td>90</td></tr> <tr><td>治平路 (203 縣道)</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>	路段名稱	長度(M)	五福路 (澎 31)	211.4	五福路 138 巷	321	五福路 201 巷 8 弄	142.5	五福路 61 巷	77.5	五福路 78 巷	96	三多路 288 巷	85	三多路	113.5	三多路 330 巷	93.5	文光路 (澎 31)	47.09	文光路 135 巷	75.5	光榮街	3.98	文光路第一橫巷	188.5	開明路 (澎 30)	2.09	忠孝路 77 巷	31	信義路 9 巷	91	明遠路	128	信義路	90	治平路 (203 縣道)	67	
路段名稱	長度(M)																																							
五福路 (澎 31)	211.4																																							
五福路 138 巷	321																																							
五福路 201 巷 8 弄	142.5																																							
五福路 61 巷	77.5																																							
五福路 78 巷	96																																							
三多路 288 巷	85																																							
三多路	113.5																																							
三多路 330 巷	93.5																																							
文光路 (澎 31)	47.09																																							
文光路 135 巷	75.5																																							
光榮街	3.98																																							
文光路第一橫巷	188.5																																							
開明路 (澎 30)	2.09																																							
忠孝路 77 巷	31																																							
信義路 9 巷	91																																							
明遠路	128																																							
信義路	90																																							
治平路 (203 縣道)	67																																							
<p>112-23</p> <p>馬公市光榮集污區內機關及學校污水下水道用戶接管新建工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>																																								

編號	位置圖
<p>112-24</p> <p>紅綠燈及監視系統</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>	

編號	位置	圖
<p>112-26</p> <p>112 年度馬公市各里道路改善工程 (第 1 標)</p> <p>提案單位：馬公市公所</p>		
<p>★</p> <p>112-27</p> <p>112 年度馬公市各里道路改善工程 (第 2 標)</p> <p>提案單位：馬公市公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>★ 112-28</p> <p>112 年度馬 公市各里道 路改善工程 (第 3 標)</p> <p>提案單位： 馬公市公所</p>		
<p>112-31</p> <p>(112)湖西 鄉農路改善 工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西 鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-32</p> <p>(112)湖西鄉道路挖掘路段改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>112-34</p> <p>(112)湖西鄉龍門村 119-11 號宅旁排水改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>★ 112-36</p> <p>(112)中油睦鄰專案-湖西鄉湖西村道路排水改善工程(湖西村41-15宅東至41-5宅前道路)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>★ 112-37</p> <p>湖西鄉道路改善工程第3標 (澎13號鄉道至白坑活動中心路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>★ 112-37</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 3 標 (青螺、白坑生命紀念館聯外道路)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>★ 112-37</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 3 標 (許家村 152 號宅至 203 縣道)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>★ 112-37</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 3 標 (沙港社區活動中心西側及北側道路)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>★ 112-37</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 3 標 (潭邊新段 1051-8 地號 (潭邊村 21-3 號 ~32-3 號))</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		



編號	位置	圖
<p>★ 112-38</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 4 標 (西溪村(西溪國小西側通學道路))</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>★ 112-38</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 4 標 (龍門戰車廁所至風力發電沿線)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

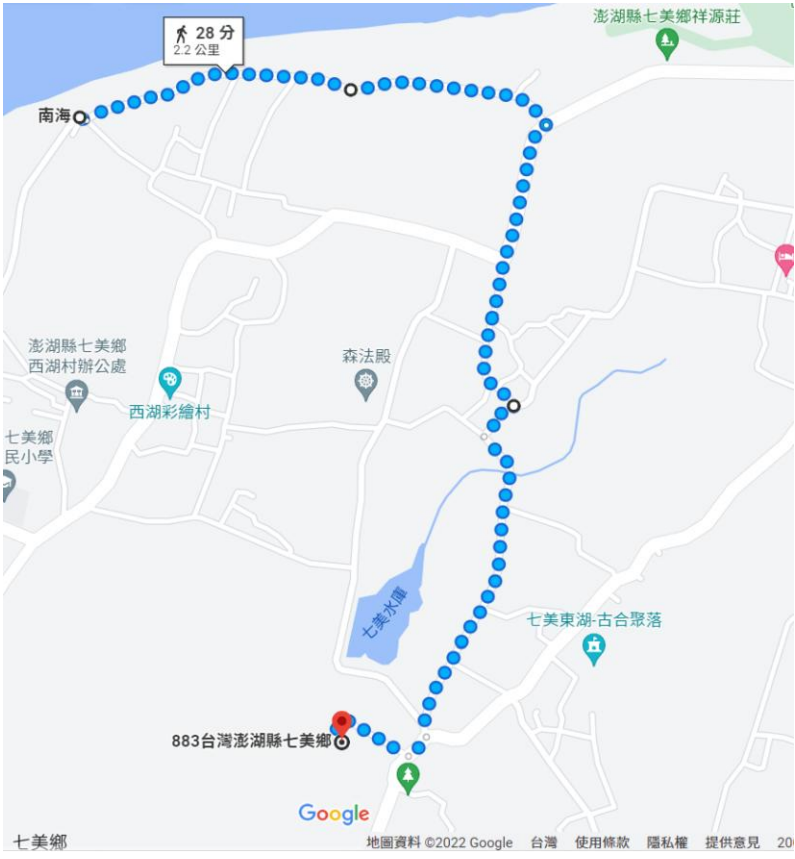
編號	位置	圖
<p>★ 112-38</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 4 標 (沙港國小西南側通學道路)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>★ 112-39</p> <p>湖西鄉許家村 AC 路面及排水改善工程</p> <p>(許家四季常照至許家飛彈部隊)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-47</p> <p>澎湖縣七美鄉生活道路及周遭人本環境改善計畫(一)期工程</p> <p>提案單位： 七美鄉公所</p>		
<p>112-49</p> <p>尖山~赤崁線 M42 人孔提升及降埋 (203 縣道 4K+953, 往安宅社區路口)</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-50</p> <p>69kV 澎湖~尖山紅白線 M1 及澎湖~馬公紅白線 M2 人孔提升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		
<p>112-51</p> <p>69kV 澎湖~紅白線 M36-M40 人孔提升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		

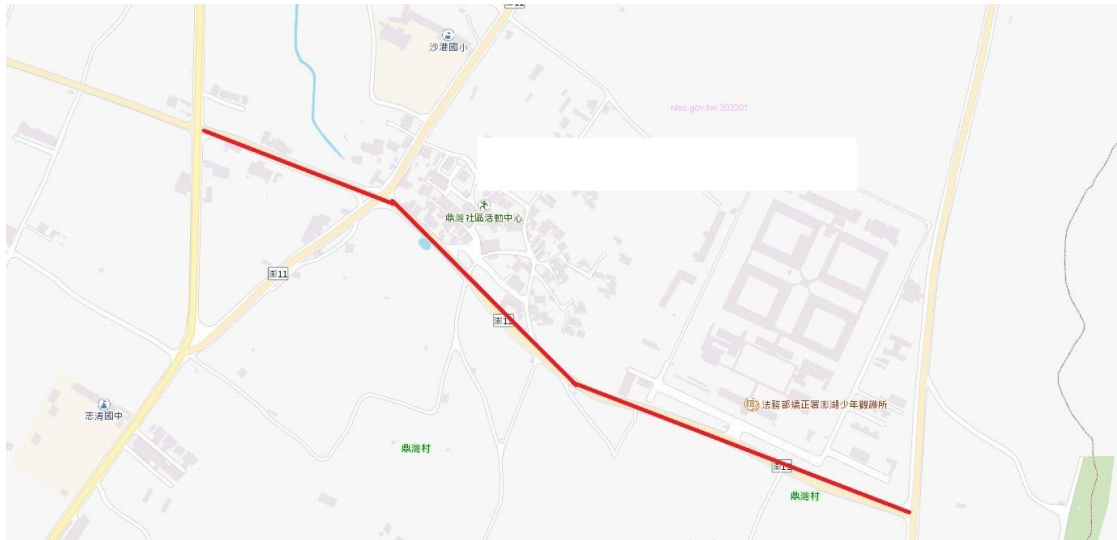


編號	位置	圖
<p>112-52</p> <p>白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>		
<p>112-53</p> <p>馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-54 烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>	 <p>△1.烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p>	
<p>112-55 馬公海淡廠送水管大城北盲管段連接工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司南區工程處</p>	 <p>東龍行天宮 澎湖NORA諾拉時尚美學-美睫嫁接&... 大城北 大城北牛肉麵 中式麵食·S Hoko Island 城北村</p> <p>逸軒居民宿 龍月靜好民宿 貝嫻輕旅二館 Zoo bnb-澎湖動物園民宿</p> <p>11分 900公尺</p> <p>Google</p>	

編號	位置	圖
<p>112-56</p> <p>七美嶼 900 噸海水淡化廠興建工暨委託代操作維護</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司南區工程處</p>		
<p>112-57</p> <p>吉貝嶼 600 噸海水淡化廠興建工暨委託代操作維護</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司南區工程處</p>		

編號	位置	圖
<p>112-58</p> <p>澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		
<p>112-59</p> <p>澎湖馬公市民族路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-60</p> <p>澎湖馬公市民權路等市區道路汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>澎湖馬公市民權路等市區道路汰換管線工程</p>	
<p>112-61</p> <p>澎湖馬公東衛、城北汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		

編 號	位 置	圖
<p>112-62</p> <p>澎湖湖西鄉 澎 12 號線汰 換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		
<p>112-63</p> <p>澎湖馬公市 文化路、文 康街汰換管 線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		

編號	位置	圖
<p>112-64</p> <p>澎湖馬公供水改善工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		
<p>112-65</p> <p>澎湖馬公市文明路 126 巷等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		



編號	位置	圖
<p>112-66</p> <p>澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>△3.澎湖馬公市六合路等汰換管線工程</p>	
<p>112-67</p> <p>澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>☆14澎湖馬公市烏坎海淡廠前送水管汰換工程</p>	

編 號	位 置	圖
<p>112-68</p> <p>澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>This map shows the project location in Maatsu, Penghu. A red line indicates the pipeline replacement area along the southern section of Newing Road. Landmarks include Pymart, Pier 3, Gogoro, and various local businesses. A red banner at the bottom right of the map reads: ☆15澎湖馬公市新營路南段管線汰換工程.</p>	
<p>112-69</p> <p>澎湖風櫃里增設 200 噸配水池工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	 <p>This map shows the project location in Fengguili, Penghu. A red line indicates the area for a new 200-ton water reservoir. The map shows the coastline, roads, and some local landmarks like the Windmill. A red banner at the bottom of the map reads: ☆16澎湖風櫃里增設200噸配水池工程.</p>	

編號	位置	圖
<p>112-70</p> <p>澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站</p> <p>提案單位： 中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心</p>		
<p>112-71</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線開挖檢查 (202 縣道國軍副食品段)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		

編號	位置	圖
<p>112-72</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		
<p>112-73</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查(明興驗車廠前開挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>		


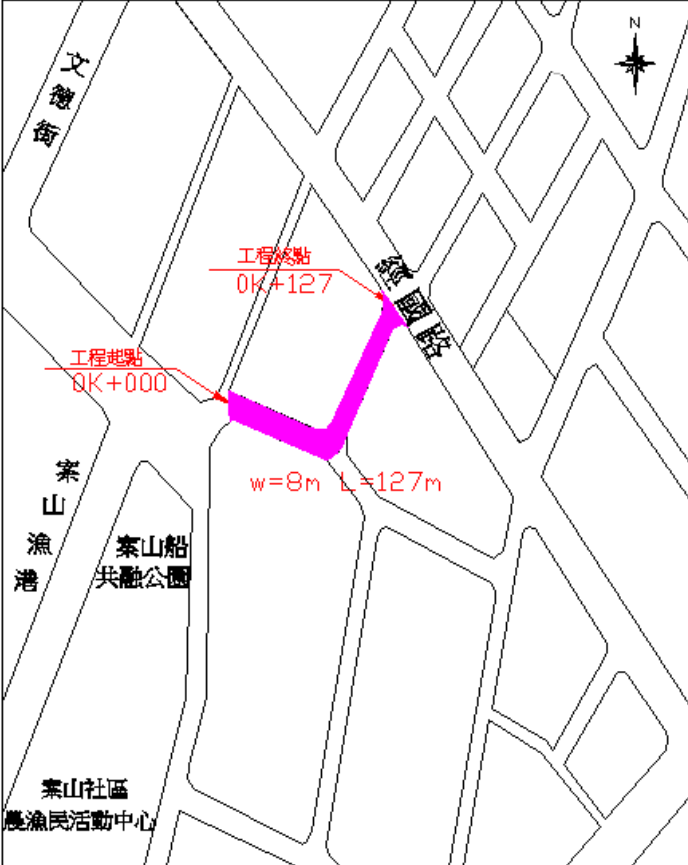
編 號	位 置	圖
<p>112-74</p> <p>台灣中油馬 公管線開挖 檢查(文東 加油站前開 挖)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎 湖營業處湖 西供油服務 中心</p>		
<p>112-77</p> <p>臺澎#4 長途 光纜陸纜管 道土木工程 (20 號道路 終點 70 公尺 及往白灣道 路登陸點人 孔管道)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>		

編 號	位 置	圖
<p>112-78</p> <p>澎金#4 長途光纜陸纜管道土木工程 (海底寶商店前至通樑北港聯外道路)</p> <p>提案單位： 中華電信</p>		
<p>★ 112-81</p> <p>澎湖縣政服務中心周邊道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編號	位置圖
<p>★ 112-82</p> <p>112 年度排水急需改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <p>The map shows Hoko Island with a blue circle highlighting a drainage improvement project location. Key landmarks include Chengde Reservoir (成功水庫) at the top, Taicheng North (大城北) in the center, and various local businesses like '大城北極殿' and '大城北牛肉麵'. The map also shows 'Hoko Island' (Hoko Islana) and '澎湖縣政府環境保護局' (Penghu County Government Environmental Protection Bureau) at the bottom left.</p>

113-115 年度道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>113-01</p> <p>「澎 20 線道路拓寬工程 (烏坎-隘門)」</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <p>This map shows the proposed road expansion for Route 20, highlighted in yellow. The route starts at Wukan (烏坎) and ends at Aimen (隘門). Key locations along the route include Penghu Airport (澎湖機場), Penghu Airport Parking (澎湖機場停車場), and Aimen Village (隘門村). A callout box indicates a distance of 2.2 kilometers and a travel time of 25 minutes.</p>
<p>113-02</p> <p>澎 13 線 0K+000~4K+200</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	 <p>This map shows the proposed road expansion for Route 13, highlighted in yellow. The route starts at Qingshe Station (青螺終點站) and ends at Nanyang (南陽). Key locations include Red Sand Bay (紅沙灣), White Sand Bay (白坑沙灣), and Nanyang (南陽). A callout box indicates a distance of 2 kilometers and a travel time of 27 minutes.</p>

編號	位置	圖
<p>★ 113-03</p> <p>澎湖縣馬公市機三北側 8 米計畫道路開闢工程</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p>		
<p>★ 113-04</p> <p>澎湖馬公市案山段 8 米計畫道路開闢計畫</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p>		



編 號	位 置	圖
<p>113-05</p> <p>112 年度花 嶼村里道路 改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>113-06</p> <p>吉貝村里道 路改善工程 (約略施作 區域)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		

編號	位置	圖
<p>113-07</p> <p>113 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>		
<p>113-08</p> <p>七美鄉平和村線路改善預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>		

編號	位置	圖
<p>113-09</p> <p>澎湖馬公市敬業街等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所</p>		
<p>113-10</p> <p>台灣中油馬公管線開挖檢查</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖 營業處湖 西供油服務 中心</p>		

編號	位置
<p>★ 113-11</p> <p>205 縣道 7K+7.5 起 ~204 線 0K 至 0K+3.6 ~201 線 0K+2 紮埋設管道 改善線路工 程</p> <p>提案單位： 新世紀資通</p>	
<p>113-12</p> <p>69kV 澎湖~ 馬公紅白線 M41 人孔提 升</p> <p>提案單位： 台電嘉南供 電區營運處</p>	

編 號	位 置
<p>114-01</p> <p>69KV 澎湖~馬公紅白線 M10~M12 人孔提升點檢</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>	
<p>114-02</p> <p>114 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府</p>	

編號	位置	圖
<p>★ 114-03</p> <p>澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		
<p>★ 114-04</p> <p>澎湖縣白沙鄉通樑村管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>	
