

澎湖縣 114 年度「路面管線工程協調小組」

第 1 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，辦理道路刨除加封工程時，請各管線單位務必在指定期程內配合預埋管線及檢討減量、人手孔蓋下地，並應確保挖掘範圍臨鋪品質，倘沉陷經查驗未符平坦度規定將進行裁罰。
- 二、各管線單位應於人手孔提升施工後，辦理調降下地作業，以維持現有道路平整性，除路面上之人手孔蓋除具有救災功能或特殊需求，經核准得免下地外，其餘人手孔蓋以下地至少十公分為原則，並建議於孔蓋上方加裝土工格網或其他妥適處理方式，以增加其摩擦力避免滑動。
- 三、未下地人手孔蓋及制水閥為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，並派員定期巡視，以維持道路平整確保人車通行安全，如發現缺失(含老舊無止滑效果)應立即改善，倘經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰，另本府針對孔蓋防滑訂定「澎湖縣地下管線人手孔蓋防滑標準」(人手孔蓋面積九百平方公分以上者，所有檢測點抗滑係數平均值應在五十 BPN 以上)，已於 114 年 2 月 21 日發布實施，請各單位配合辦理，新設孔蓋應依規定達到防滑係數標準，舊有孔蓋應確實辦理相關檢驗及報告，本府得隨時抽查，未符規定將強制汰換或要求下地。

貳、道路挖掘管理事宜

一、路證審核單位：

1. 本府工務處：縣道 201、202、205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
2. 公路局澎湖工務段：縣道 203、204。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

二、近來道路交通事故頻傳，多因交維措施不足及道路沉陷、坑洞導致，各路

權機關及管線單位請注意道路回填品質及交通安全維持措施，加強巡查，避免憾事再次發生。

參、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

- 一、如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位亦應依程序核發路證。
- 二、各管線單位應配合辦理施工打卡作業，確實於施工期間每日進退場完成打卡(附上進場交維照片、退場警示措施)。
- 三、有關道路緊急開挖或漏水搶修之案件，管線單位應於系統先行申請緊急案件，並於 Line 群組內上傳地點及照片作為依據，於道路挖掘完成後，依規定三日內辦理系統申請，路權單位亦應追蹤有無申請。

肆、道路修復費用支用情形

- 一、各鄉市公所 112-114 年度提報經縣府核定之工程，請盡速辦理，應辦期程如下表，如未按預定期程辦理將撤回經費或暫不核定新案。

| 縣府核定經費辦理，尚未完成之工程 | | | | |
|-------------------------|-------|------------|---------|-------------------------------|
| 工程名稱 | 單位 | 核定經費 | 經費使用情形 | |
| 112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第三標) | 馬公市公所 | 9,551,886 | 112年度預算 | 請於114年4月底前核銷結案 |
| 113年度馬公市道挖改善工程(第2標) | 馬公市公所 | 11,264,500 | 113年度預算 | 請於114年4月底前核銷結案 |
| 113年度馬公市道挖改善工程(第3標) | 馬公市公所 | 12,356,500 | 113年度預算 | 請於114年4月底前核銷結案 |
| 113年度七美鄉道路挖掘修復工程 | 七美鄉公所 | 6,000,000 | 113年度預算 | 請於114年4月底前核銷結案 |
| 望安鄉將軍村淨水場周邊道路鋪面改善工程 | 望安鄉公所 | 1,200,000 | 113年度預算 | 請於114年4月底前核銷結案 |
| 113年度馬公市五德里道挖改善工程 | 馬公市公所 | 3,208,000 | 114年度預算 | 預算已通過，可決標執行 請於114年8月底前核銷結案 |
| 113年度馬公市道挖改善工程(第1標) | 馬公市公所 | 5,272,000 | 114年度預算 | 預算已通過，可決標執行 請於114年8月底前核銷結案 |
| 113年度西嶼鄉道路挖掘改善工程 | 西嶼鄉公所 | 2,177,700 | 114年度預算 | 預算已通過，可決標執行 請於114年8月底前核銷結案 |
| 114年度道挖改善工程 | 白沙鄉公所 | 3,500,000 | 114年度預算 | 預算已通過，請於114年3月底前 提報詳細預算書圖 |
| 114年度道挖改善工程 | 湖西鄉公所 | 686,466 | 114年度預算 | 預算已通過，請於114年3月底前 提報詳細預算書圖 |

伍、其他配合事項：

- 一、本府於 114 年 2 月 4 日發布修正「澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準」部分條文，請各單位配合辦理。
- 二、觀光旺季(花火節於 4/28-7/29)，原則主要道路(公路)及市區應避免施作計畫型工程，請於 4 月 15 日前完成或延至 8 月施作。

陸、施工路段協調

- 一、113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表(附件 1)。
- 二、114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表(附件 2)。
- 三、道路及管線工程項目施工位置圖檔(附件 3)。

柒、臨時動議

無

捌、會議結論

- 一、本次會議共協調路面工程 114 年度 63 案(含新案 13 案)，115 年度 5 案，各案會議決議詳如彙整表，請各路權及管線單位遵照辦理。
工程範圍請參閱
<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1c01oplv9dwGch2uuj7Lrt-tbMUqJDb0&ll=24.023197351577167%2C120.104023&z=7>
- 二、本會議宗旨係協調各路權及管線單位預計施作之道路工程，使其相關單位能配合期程及相關作業，路權單位應當表率，確實提供資料，以利其他單位配合。
- 三、尚未提報道路使用費之單位，請儘速於 114 年 3 月 31 日前報府，請各單位審慎對照本縣公共管線系統圖資數量應與實際數量相符，倘有需更新圖資請提供資料本府轉匯系統，健全本縣系統圖資正確性。
- 四、請白沙鄉公所及湖西鄉公所盡速於 3 月底依據匡列經費提送詳細預算書圖報府審查核定，逾期將撤除提報案件。
- 五、本府預訂 114 年 4 月 29 日辦理圖資更新作業及實地操作教育訓練，請各單位務必派員參加，並自行或請測量廠商攜帶測量儀器進行測量精度檢核。

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|---------|----------------|------------------------------------|--|--------------|--|---|------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 113-1、2 | 公路局 澎湖工務段 | 縣道擇要路面修復工程 | 1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局~澎福古棗味) 2. 204縣道3K+800-4K+100(興仁~烏炭) 3. 204縣道7K+120-7K+690(隘門) | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局 | 1. W=16, L=750 2. W=15, L=300 3. W=12, L=570 | 預計114年上半年度 | 原預計113年下半年度 | 照案通過 請召開管線協調會 | 第3條新增 照案通過 請召開管線協調會 | 1. 中華電信人手孔下地 2. 自來水請檢討管線修漏問題 |
| 2 | 113-9 | 國土管理署 南區工程署 | 澎湖縣馬公市機三北側8米計畫道路開闢工程 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=8m, L=140m | 預計114年11月20日完工 | 114年1月16日開工 | 照案通過 | | |
| 3 | 113-10 | 國土管理署 南區工程署 | 澎湖馬公市案山段8米計畫道路開闢計畫 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=8m, L=120m | 預計114年11月20日完工 | 114年1月16日開工 | 照案通過 | | |
| 4 | 113-11 | 澎湖縣政府 土木科 | 澎13線鄉道改善工程 | 湖西至青螺社區(0K+000~2K+200) | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=8m, L=2200m | 預計114年上半年度 | 原預計113年下半年度 | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 5 | 113-19 | 澎湖縣政府 下水道科 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標 | 剩重光里 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input checked="" type="checkbox"/> 警察局 | W= m, L= 3012m | 施工中 預計114/4完工 | | 照案通過 | | |
| 6 | 113-20 | 澎湖縣政府 下水道科 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程-分支管網及用戶接管工程第三標 | 五福路、光榮街 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局 | | 施工中 預計115/4完工 | | 照案通過 | | |
| 7 | 113-22 | 澎湖縣政府 下水道科 | 113年度污水下水道道路挖掘修復工程 | 石泉社區(204縣道以北、澎23鄉道以西) | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 施工中 | | 照案通過 | | |
| 8 | 113-31 | 湖西鄉公所 | 太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程 | 1. 隘門村124-8宅東 2. 隘門村105~109號宅 3. 隘門村將軍廟隘門新段 1046地號附近 | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 1. W=3m, L=58m 2. W=2~5m, L=58m 3. W=17.5m, L=28.5m | 預計114年下半年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 9 | 113-39 | 臺灣電力股份有限公司澎湖區處 | 白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程 | 澎13號線部分~白坑社區 | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 0.6m, L=2,000m | 預計114年下半年度 | 1.原預計113年4月-10月 2.延至預訂114年4月-10月 | 照案通過 | 澎13線倘未能配合縣府期程(113-11)將撤案 | |
| 10 | 113-40 | 臺灣電力股份有限公司澎湖區處 | 七美鄉平和村線路改善預埋管路工程 | 七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮風味餐旁 | 七美鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m, L=1,600m | 預計114年下半年度 | 1.原預計113年4月-10月 2.延至預訂114年4月-10月 | 照案通過 | 1.公所同意本案施作 2.請公所納入115年度創鋪(基金專款專用) | |
| 11 | 113-41 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 馬公海淡廠至成功場管線連絡工程 | 由澎202號線(國軍副食品供應站門口)至成功淨水場路段 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1.5 m, L=1,300m | 114/2進場 預計114/3月底完工 114/5/20一車道創鋪 | | 照案通過 | 請依照預定期程 | 請加強交維安全措施 |
| 12 | 113-42 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程 澎湖湖西鄉澎12號線汰換管線工程 | 由澎202號線(東衛國軍副食品供應站門口)沿澎12號線至鼎灣轉203號線至赤坎白沙淨水場 澎12號線(鼎灣監獄-203號線路口) | 公路局 澎湖工務段/ 澎湖縣政府/ 湖西鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1.0m, L=14,000m | 114/2進場-115/2 施工中 | | 照案通過 | | 1.施工時請加強交維安全措施 2.併案113-2-4 |
| 13 | 113-43 | 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所 | 澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程 | 汰換平和村頂茄埕、下茄埕與九孔生態園區等區域管線汰換 | 七美鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m, L=5,600m | 因管材變更重新設計， 預計5月公告招標 | 原預計113年底辦理發包 | 照案通過 | 1.公所同意本案施作 2.請公所納入115年度創鋪(基金專款專用) | |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 | |
|----|---------|--------------------|---|--|-----------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------|--|-------------------|
| 14 | 113-50 | 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所 | 澎湖所配水管線遷改工程 | 1. 新店路及新生路路口 2. 案山北極殿前巷道 3. 鼎灣開帝殿前 4. 西嶼鄉赤馬村往內垵村203縣道下坡方向 | 公路局 澎湖工務段/ 馬市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=0.6~8m L=530m | 預計114年3月底進場 | 原預計113年12月~114年度 | 照案通過 | | 1. 新生路請過禁挖期施作，並於115/4前完成 2. 第3、4條請於114/4/20前完成或114/8月施作 | |
| 15 | 113-51 | 中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心 | 澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程 | 鎮港漁船站 | 馬市公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1 m L= 365 m | 已申請路權 預計114年3月底完工 | 鎮港漁船站發油管線汰換工程 | 照案通過 | | | |
| 16 | 113-52 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖驗證 | 興港南街&配合亞果碼頭飯店改管工程 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 130 m | 預計113年11月至114年4月底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 照案通過 | | 請於114/4/20前完成 | |
| 17 | 113-54 | 新世紀資通 | 澎205號線7K+7.5起~204號線0K至0K+3.6~201號線0K+2統埋設管道改善線路工程 | 剩澎201號線0K+2處管線連接改善 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 新世紀資通 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=管溝寬度1m L=600m | 預計113年6月~114年度 | | 照案通過 | | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 18 | 113-55 | 澎湖縣政府土木科 | 「澎20線道路拓寬工程(烏坎-隘門)」 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=m, L=1288m | 預計114年上半年度 | 已召開設計協調會 | 照案通過 | | | |
| 19 | 113-56 | 澎湖縣政府土木科 | 114年度鄉道改善工程 | 澎17線(204縣道尖山顯濟殿到昌億十字路口) | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年上半年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | | |
| 20 | 113-57 | 澎湖縣政府土木科 | 114年度村里道路改善工程-第二標 | 西溪村、沙港村、龍門村、南寮村、湖東村 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年下半年度 | 原預計114年上半年 | 照案通過 請召開管線協調會 | | | |
| 21 | 113-58 | 澎湖縣政府下水道科 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主幹管工程第一標 | 1. 同和路-新店路-文德路 2. 203縣道(文化局-華勇預拌廠前) | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 短管推進 L=3,700m | 預計114年~115年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | | |
| 22 | 113-59 | 澎湖縣政府下水道科 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1揚水站及壓力管工程 | 1. 國際廣場-體育園區道路-中華路口 2. 國際廣場-新生路-新村路 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 壓力管 L=1,440m | 預計114年~115年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | | |
| 23 | 113-60 | 澎湖縣政府下水道科 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標(Ca) | 新店路以北、中華路以南 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電、 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司、 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信、 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 短管推進 L=3,499m | 預計114年~116年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | | |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|---------|---------------|--------------------|---|--------|---|----------------------|---------|------------------|------------------|------|---------|
| 24 | 113-61 | 澎湖縣政府 下水道科 | 114年度雨水下水道改善工程 | 同和路-中華至新生 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電、 <input type="checkbox"/> 自來水公司、 <input type="checkbox"/> 中華電信、 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 <input type="checkbox"/> 警察局 | W=m L=300m | 預計114年度 | 同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程 | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 25 | 113-62 | 澎湖縣政府 建設處 | 馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程 | 預計辦理民福路接至海埔路管線連接新設 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=11m L=99.4m | 預計114年度 | 計畫道路開闢 | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 26 | 113-63 | 湖西鄉公所 | 湖西鄉道路改善工程第5標 | 1. 沙港天后宮前路段改善工程(總長400M、均寬10M)。 2. 沙港廣聖殿前路段改善工程(總長140M、均寬10M)。 3. 沙港中漁港至北極殿路段改善工程(總長350M、均寬8M)。 | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 長：890公尺 寬：9.3公尺 | 預計114年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 27 | 113-64 | 湖西鄉公所 | 湖西鄉道路改善工程第6標 | 1. 湖西幼兒園前路段改善工程(總長450M、均寬4.5M)。 2. 沙港國小至中西生命紀念館改善工程(總長590M、均寬6M)。 3. 南北寮漁港道路改善工程((總長230M、均寬6M)。 | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 長：1270公尺 寬：5.5公尺 | 預計114年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 28 | 113-65 | 湖西鄉公所 | 114年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程 | 宅路段道路水溝改善。 | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 長：約280公尺 寬：約4~8公尺 | 預計114年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | |
| 29 | 113-2-2 | 白沙鄉公所 | 小赤村管線挖掘道路鋪面改善工程 | | 白沙鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=m, L=330m | 預計114年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | | |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|----------|---------------|--------------------|---|------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|----------------------------------|--|
| 30 | 113-2-4 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖湖西鄉澎12號線汰換管線工程 | 澎12號線(鼎灣監獄-203號線路口) | 湖西鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m、 L=1,100m | 本案因烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程進場施工，本所將研議配合一併施工 | | | 撤案 | 併入113-42 |
| 31 | 113-2-5 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程 | | 公路局 澎湖工務段/ 白沙鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6~1m L=14200m | 設計中，預計114下半年度施作 | 汰換白沙鄉赤崁村管線 | 照案通過 部分路段公所112年度前瞻計畫已施作完成，屬三年禁挖，遇禁挖路段不施作 | 公所提供禁挖路段範圍請自來水檢討減作 | |
| 32 | 113-2-6 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣白沙鄉通樑村管線汰換工程 | | 公路局 澎湖工務段/ 白沙鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m~1m、 L=6500m | 設計中，預計114下半年度施作 | 汰換白沙鄉通樑村管線 | 請於縣府進場前完成，未施作請於三年禁挖期後再申請 | 撤案 | 自來水無法配合縣府期程，三年後再行申請 |
| 33 | 113-2-8 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣馬公市中華同和等路管線汰換工程 | 中華路(馬公高中對面)、同和路、光復路(治平路交查路口至民權路路口) 增加一處(三民福海埔) | 馬公市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m~1m、 L=2232m | 設計中，預計114年度發包 | | 路權單位無意見 請公所確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 34 | 113-2-9 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣馬公市三多朝陽等路管線汰換工程 | 增加兩處(六合及周邊) | 馬公市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m~1m、 L=5611m | 設計中，預計114年度發包 | | 路權單位無意見 請公所確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 請與縣府土木科確認是否與刨鋪路段重疊 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 35 | 113-2-10 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程 | 民生路、文化路、忠孝路、治平路等路段 | 馬公市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m~1m、 L=1839m | 設計中，預計114年度發包 | | 路權單位無意見 請公所確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 請與縣府土木科確認是否與刨鋪路段重疊 | 1. 文化路，撤案 2. 忠孝路、民生路、治平路，照案通過 | 1. 文化路縣府114/3/20進場 2. 忠孝路請於114年度完成，縣府預計115年刨鋪 3. 忠孝路、民生路及治平路工程於8月後施作 |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|----------|-------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|---|------|------------------------|
| 36 | 113-2-11 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣馬公市興仁里等供水延管工程(一) | 馬公市公所 | 馬公市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=0.6m~1m、 L=2600m | 施工中 預計7月竣工 | | 204縣道部分請於工務段進場前施作完畢 | | |
| 37 | 113-2-12 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油6吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證 | 馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎湖19號-湖西供油中心) | 公路局 澎湖工務段/ 馬公市公所/ 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 40 m | 預計114/4/15完成 | 針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕較嚴重處進行開挖檢查 | 請公所及工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | |
| 38 | 113-2-13 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段) | 澎湖21線及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線狀況 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1.5 m, L= 40 m | 預計114年初至114年底 | 確認其它管線是否有影響到中油管線 | 1. 請過禁挖期再行申請 2. 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 澎湖21線禁挖至116/6，不施作 |
| 39 | 113-2-14 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖-成功水庫東側小路 | | 湖西鄉公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 路權單位無意見請公所確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 40 | 113-2-15 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖-成功國小對面202縣道 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 路權單位無意見請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 41 | 113-2-16 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖-幸福民宿對面202縣道 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 路權單位無意見請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 42 | 113-2-17 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖-西溪社區招牌附近樹林 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 路權單位無意見請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |

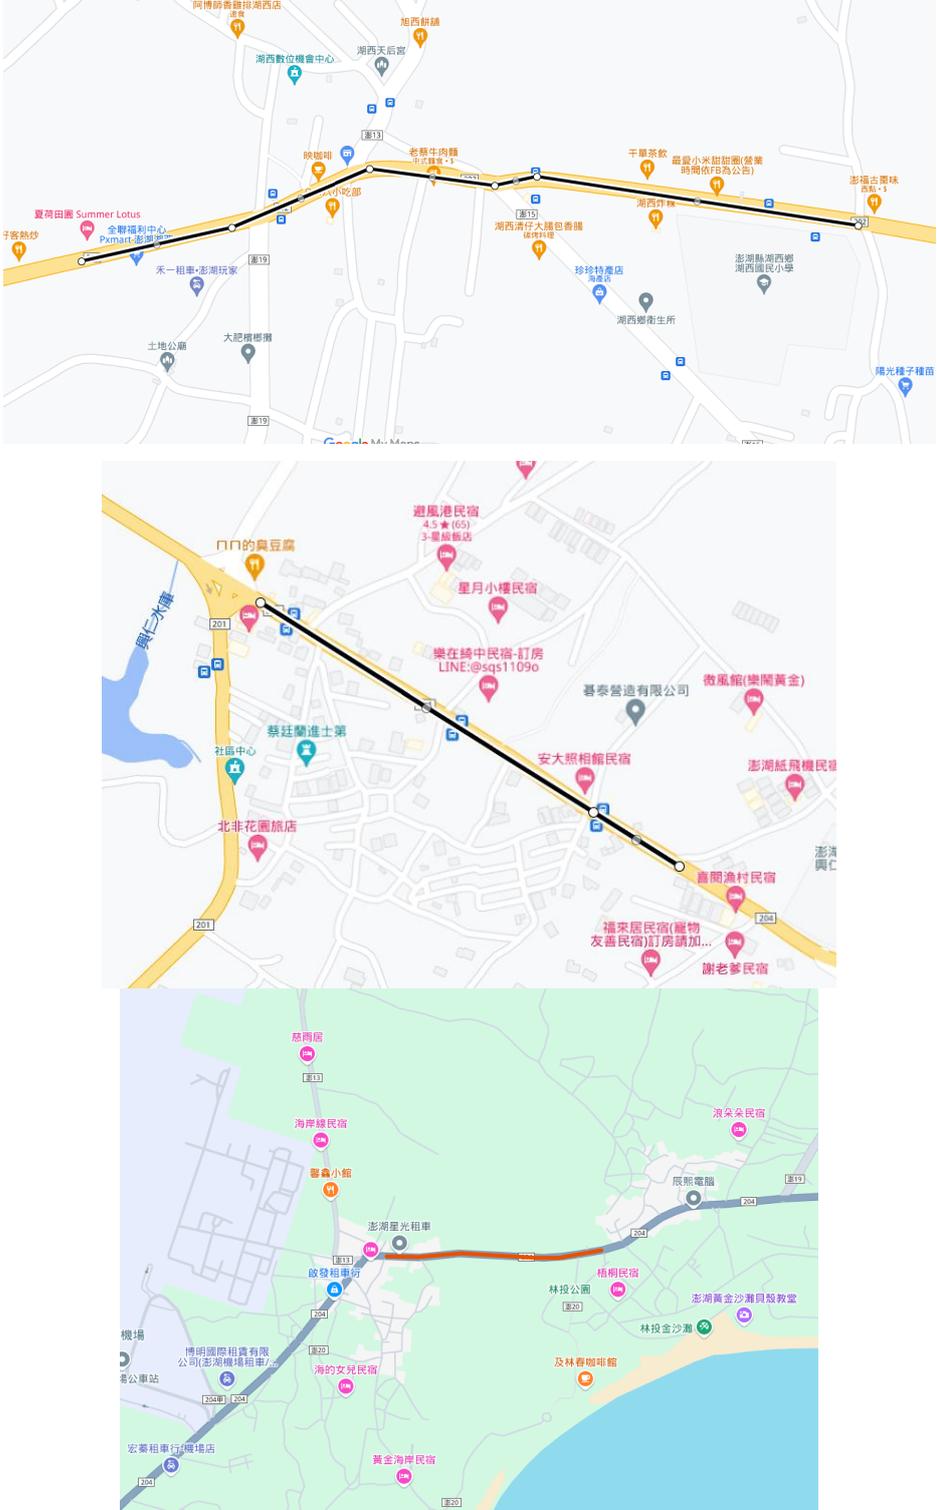
| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 113年度決議 | 本次決議 | 配合事項/備註 |
|----|----------|-------------------|-------------------------------|------|--------------|---|---------------|---------------|------------|--|------|------------------------|
| 43 | 113-2-18 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油8吋管線緊密電位開挖-202縣道與澎19鄉道交界處 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 請於工務段進場前完成 | 照案通過 | 須配合工務段113-2工程 |
| 44 | 113-2-19 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道2.5K處 | | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 45 | 113-2-20 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道3.35K處 | | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 46 | 113-2-21 | 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心 | 台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道3.64K處 | | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=4 m, L= 6 m | 預計114年初至114年底 | 管線緊密電位開挖驗證 | 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 照案通過 | 請於114/4/20前完成或114/8月施作 |
| 47 | 113-2-22 | 新世紀資通 | 馬中市水源路與北街口、新生路與北辰街口-2處理設管道 | | 馬中市公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1m L=32m | 預計114年6月中施工 | | 路權單位無意見請公所確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 48 | 113-2-23 | 新世紀資通 | 202線7K+170澎湖縣湖西鄉77-11號前埋設管道 | | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1m L=20m | 預計114年6月中施工 | | 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 49 | 113-2-24 | 新世紀資通 | 204線7K左右埋設管道 | | 公路局澎湖工務段 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1m L=18m | 預計114年6月中施工 | | 路權單位無意見 請工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 50 | 113-2-25 | 新世紀資通 | 馬中市鎮港里1483號前埋設管道 | | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 新世紀資通 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=1m L=20m | 預計114年6月中施工 | | 請過禁挖期再行申請 | 撤案 | 禁挖至115/12 |

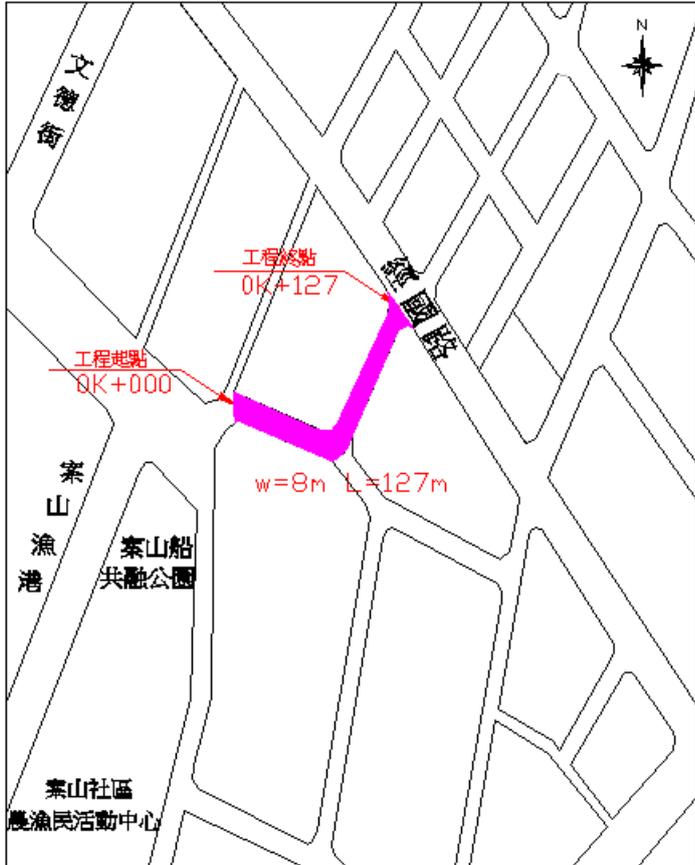
澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

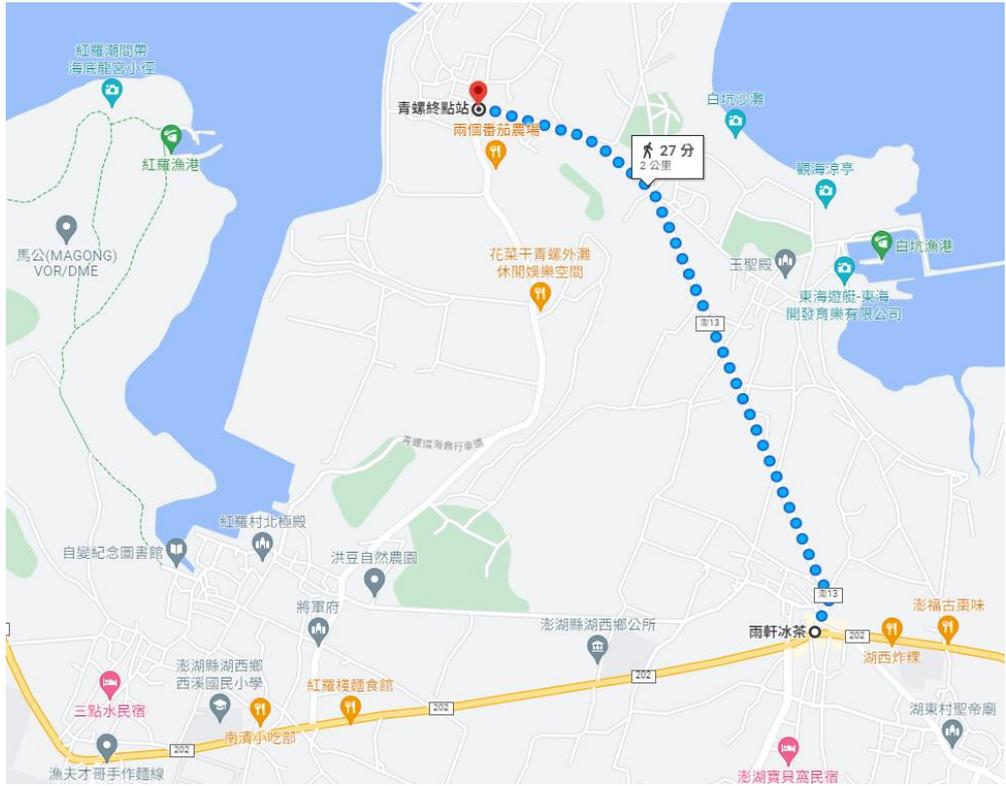
| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 本次決議 | 配合事項 |
|----|---------|---------------|-------------------------|---|--------|---|----------------------|---|-----------------------------------|------------------|--|
| 1 | ☆114-1 | 澎湖縣政府 土木科 | 澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程 | 中正、永安橋 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年7月進場 | | 照案通過 請召開管線協調會 | 設計階段會議請邀集自來水與會 |
| 2 | ☆114-2 | 澎湖縣政府 土木科 | 114年度市區道路改善工程 | 1. 新店北路 2. 新營路 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年4月中進場 | | 照案通過 | 警察局及中華電信須配合 |
| 3 | ☆114-3 | 澎湖縣政府 土木科 | 114年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約 | 1. 明遠路(信義路-光復路) 2. 新村路(馬公園小-光復路) 3. 忠孝路(民遠路-安一飯店-民族路) 4. 三多路(敬業街-陽明路) 5. 文光路(四維路-陽明路) 6. 陽明路(民族路-光復路) 7. 信義路(治平路-民遠路) 8. 文化路(樹德路-民生路) 9. 同和路(北辰街-海埔路) | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年上半年度 (9於3/20進場，四月底第一次派工1.2.3.8.10) | | 照案通過 | 1. 明遠路及信義路口警察局兩處架空請配合下地 2. 三多路下水道尚須降孔 |
| 4 | ☆114-4 | 澎湖縣政府 土木科 | 114年度鄉道改善工程 | 六合路(中華路-三多路) | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | L= 528 m W = 10 m | 預計114/3/19進場 | | 照案通過 | |
| 5 | ☆114-5 | 澎湖縣政府 土木科 | 七美鄉中和村衛生所前道路改善工程 | | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | L= 725 m W =m | 114/3/14開工 | AC改為PC | 照案通過 | |
| 6 | ☆114-6 | 澎湖縣政府 土木科 | 114年度村里道路改善工程 | 1. 鼎灣亭居 2. 沙港 3. 西溪 | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年上半年度 | 114.3.10開標 | 照案通過 請召開管線協調會 | |
| 7 | ☆114-7 | 澎湖縣政府 下水道科 | 澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程 | 1. 文光國小(三多路-自強街) 2. 中正國小(樹德路) | 澎湖縣政府 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 道路段連接管 L=192m | 樹德路4月中進場 | | 照案通過 | |
| 8 | ☆114-8 | 湖西鄉公所 | 114年度湖西鄉農路改善工程 | 1. 編號：農澎湖027，農澎馬013-(全長450M*路寬約4.0M) 2. 編號：農澎湖022 --(全長210M*路寬約6.0M) | 湖西鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | 長：約660公尺 寬：約4~6公尺 | 預計114年度 | | 照案通過 請召開管線協調會 | |
| 9 | ☆114-9 | 望安鄉公所 | 西安村人行環境暨路口改善工程 | 望安衛生所至西安村活動中心路段 | 望安鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W=5 m, L= 537 m | 預計114年至115年3月 | 1. 澎湖縣永續提升人行安全計畫 2. 預計3/30勞務開標 | 照案通過 請召開管線協調會 | |

| 項次 | 提報年度及編號 | 施工單位 | 工稱項目名稱概要 | 施工範圍 | 路權單位名稱 | 配合之管線單位 | 施工寬、長 | 施工期程 | 說明 | 本次決議 | 配合事項 |
|----|---------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------|----------------|--|---|
| 10 | ☆114-10 | 台電嘉南供電區營運處 | 69kV澎湖~馬公紅白線M25人孔提升及降埋 | 204縣道3K+241 | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1.6 m L= 1.6 m 1處 | 114年8月~115年12月 | 電纜更換 | 保留提案 | 未確認施工期程，延至下一次會議決議 |
| 11 | ☆114-11 | 台電嘉南供電區營運處 | 69kV澎湖~馬公紅白線M41人孔提升及降埋 | 海埔路上快樂渡假村南路口 | 馬公市公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1.6 m L= 1.6 m 1處 | 115年1月~115年12月 | 人孔開孔點檢 | 保留提案 | 1. 未確認施工期程，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成 |
| 12 | ☆114-12 | 台電嘉南供電區營運處 | 69kV澎湖~馬公紅白線M36~M40人孔提升及降埋 | 新店路 | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1.6 m L= 1.6 m 5處 | 115年1月~115年12月 | 人孔開孔點檢 | 保留提案 | 1. 未確認施工期程，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成 |
| 13 | ☆114-13 | 台電嘉南供電區營運處 | 69kV澎湖~馬公紅白線M10-M12人孔提升及降埋 | 204縣道6K+903~204縣道6K+495 | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1.6 m L= 1.6 m 3處 | 115年1月~115年12月 | 人孔開孔點檢 | 保留提案 | 1. 未確認施工期程，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成 |
| 14 | ☆114-14 | 台電嘉南供電區營運處 | 69kV澎湖~馬公紅白線M22-M23人孔提升及降埋 | 204縣道3K+959~204縣道3K+706 | 公路局 澎湖工務段 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | W= 1.6 m L= 1.6 m 2處 | 115年1月~115年12月 | 人孔開孔點檢 | 保留提案 | 1. 未確認施工期程，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成 |
| 15 | ☆114-15 | 澎湖縣政府公共車船管理處 | 電動公車充電樁管線開挖工程 | 澎湖縣馬公市民族路63號(澎湖公車舊調度中心) | 澎湖縣政府公共車船管理處 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年底 | 安裝電動公車充電樁電路管線。 | 撤案 | 確認無道路範圍 |
| 16 | ☆114-16 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 澎湖縣湖西鄉潭邊村供水改善工程 | | 湖西鄉公所 | <input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | w=管溝寬度0.6m~1m、 L=450m | 預計114年4月進場 | | 照案通過 | |
| 17 | ☆114-17 | 澎湖縣政府土木科 | 白沙鄉通梁社區道路安全及人行道空間建置計畫 | | 澎湖縣政府 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年3月進場 | | 照案通過 | |
| 18 | ☆114-18 | 澎湖縣政府警察局 | 監視系統裝設 | 1. 大賢、文學路口 2. 朝陽、林森路口 | 澎湖縣政府/ 馬公市公所 | <input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視 | | 預計114年度 | | 1. 大賢、文學路口遇禁挖範圍不能施作 2. 朝陽、林森路口，照案通過 | |

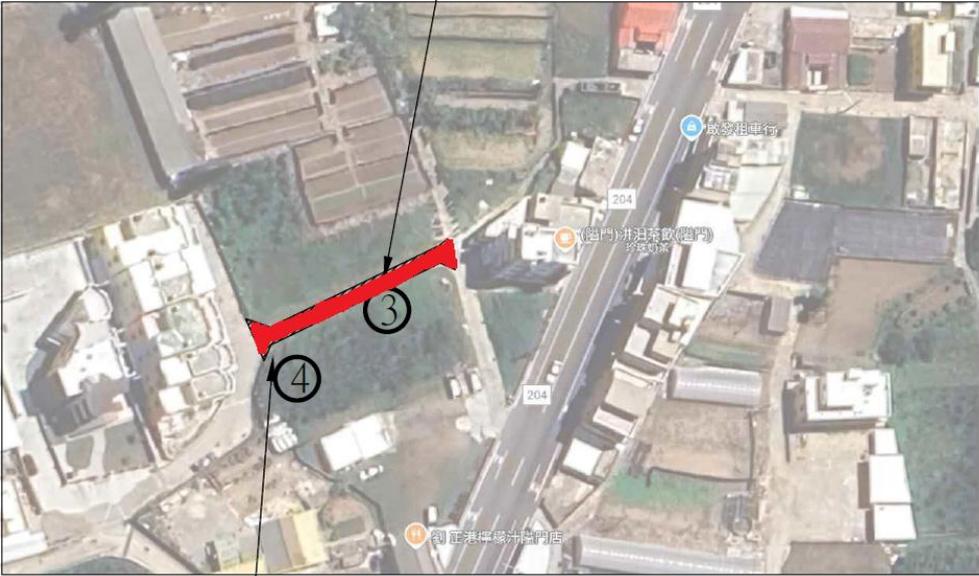
113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整位置圖

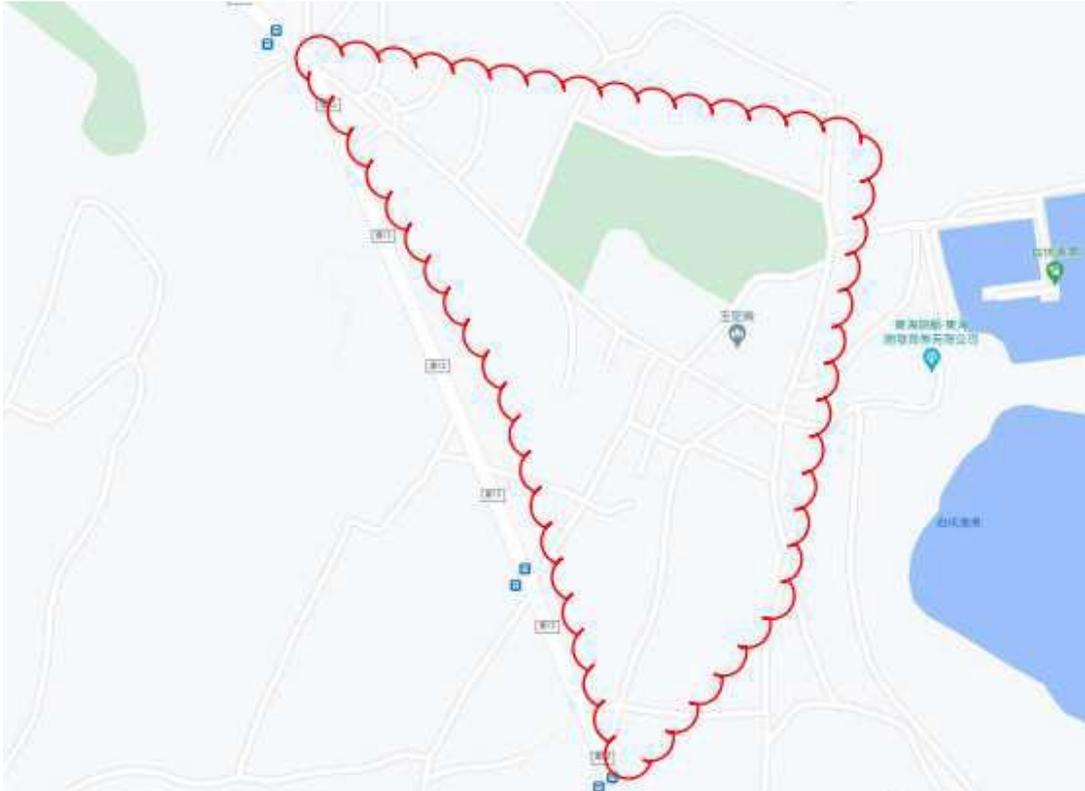
| 編號 | 位置 |
|---|---|
| <p>113-01、02</p> <p>202 縣道 7K+150-7K+900(澎湖郵局~澎湖古棗味)</p> <p>204 縣道 3K+800-4K+100(縣道擇要路面修復工程-興仁~烏崁)</p> <p>204 縣道 7K+120-7K+690(隘門)</p> <p>提案單位： 公路局 澎湖工務段</p> |  |

| | |
|--|--|
| <p>113-09</p> <p>澎湖縣馬公市機三北側 8 米計畫道路開闢工程</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p> |  |
| <p>113-10</p> <p>澎湖馬公市案山段 8 米計畫道路開闢計畫</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p> |  |

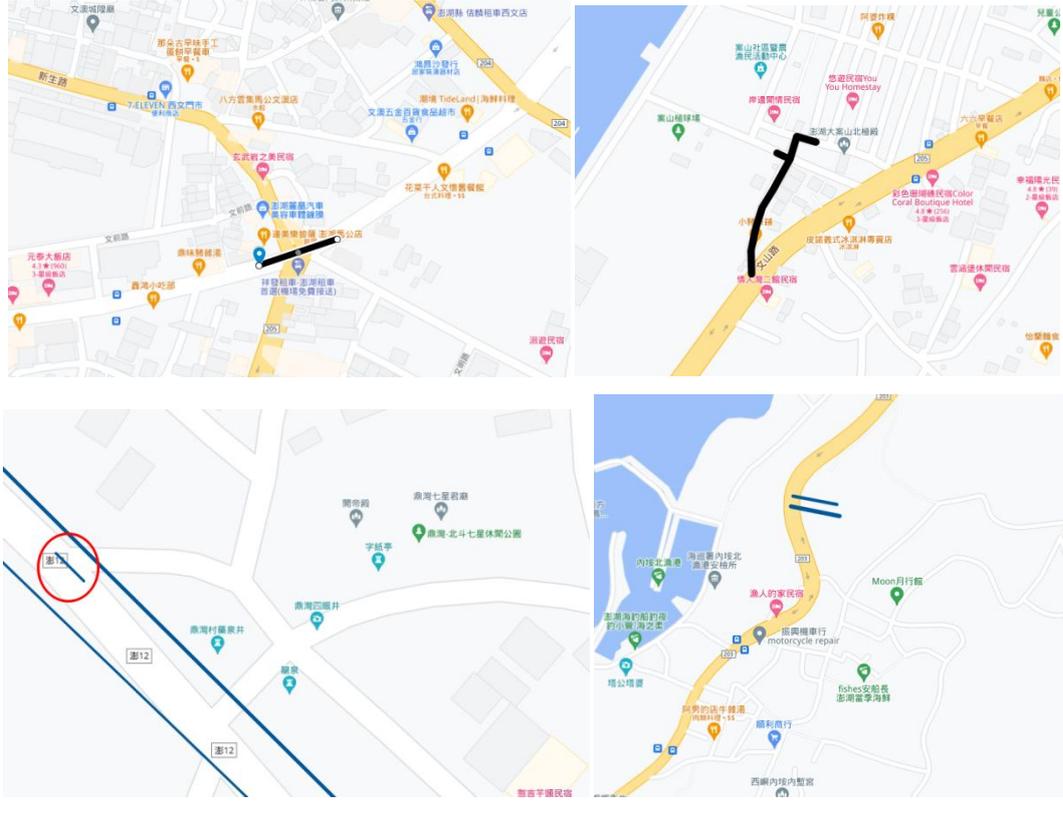
| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-11</p> <p>澎 13 線 0K+000~2K+200</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> |  | |
| <p>113-19</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> |  | |

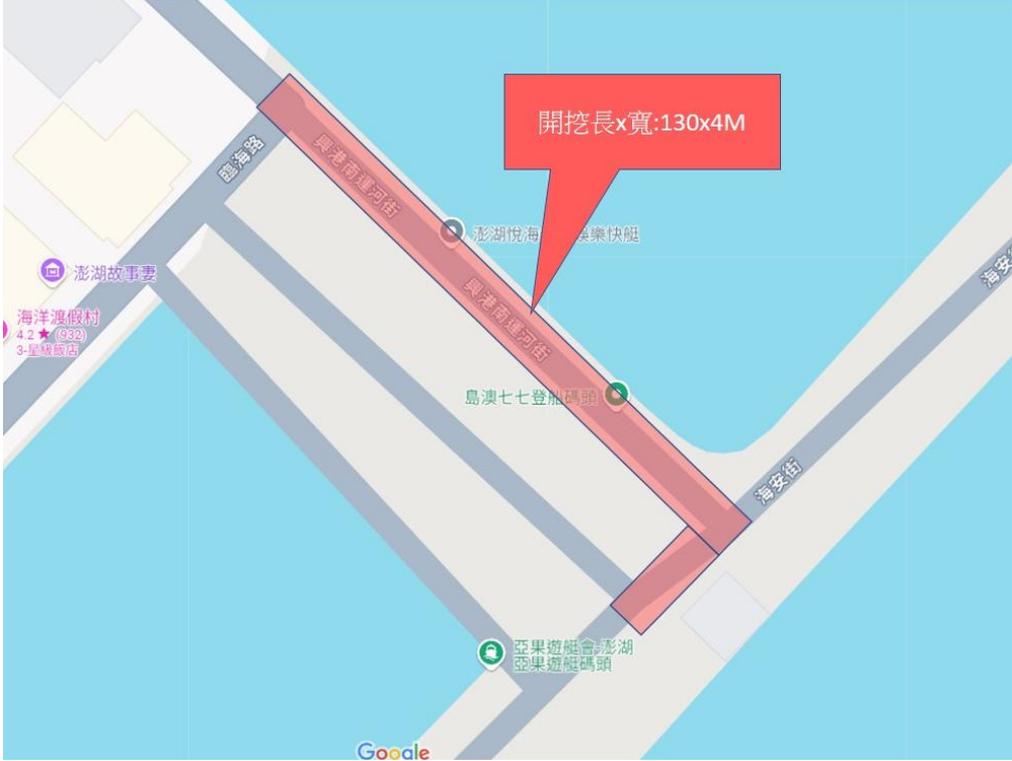
| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-20</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第三標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> |   | |
| <p>113-22</p> <p>113 年度污水下水道道路挖掘修復工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|---|----------------------------------|
| <p>113-31</p> <p>太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程</p> <p>提案單位： 湖西鄉公所</p> | <p>※No Scale</p> <p>新設道路及排水溝 長度58M(高程配合洩水施作)</p>  <p>右側新設路緣警示矮牆 (高度50cm、長度55m)</p> <p>既有PC鋪面切割打除重做</p>  <p>既有PC路面切割打除重做 長度15M</p> <p>既有PC路面切割打除重做 長度25M</p> <p>既有PC路面切割打除重做 長度10M</p> | <p>隘門村衛星空照圖</p> <p>※No Scale</p> |

| | 位 置 圖 |
|--|---|
| <p>113-39</p> <p>白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p> |  <p>The map shows a residential area with a red dashed line outlining the project boundary. Key features include a large green area (park or field) and a blue area (water body) to the right. Several buildings and utility poles are visible within the boundary.</p> |
| <p>113-40</p> <p>七美鄉平和村線路改善預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p> |  <p>The map shows a coastal area with several labeled locations: 潭子港 (Tanzi Port), 七美海鮮風味 (Shimei Seafood Flavor), 九孔養殖池 (Scallop Culture Pond), 垃圾掩埋場 (Landfill), 七美航空站 (Shimei Airport), and 平和村 (Pinghe Village). A red solid line indicates the project route connecting these areas.</p> |

| 編號 | 位置 |
|--|---|
| <p>113-41</p> <p>馬公海淡廠至成功場管線連絡工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p> |  <p>The map displays a coastal area with several key locations marked. A blue line indicates the proposed pipe route, starting from the Ma Gong Desalination Plant (馬公海淡廠) and extending towards the Cheng Gong Field (成功場). Landmarks include the Cheng Gong Reservoir (成功水庫), Cheng Gong Water Treatment Plant (成功水庫水壩), and various local businesses and residences such as 'Penshuo Sea Water Zhenglan Hostel' (澎湖海水正藍民宿) and 'Shangpin Hotel' (尚品會館民宿). The map also shows major roads like 202 and 201.</p> |
| <p>113-42</p> <p>烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p> |  <p>This map shows a different section of the island, focusing on the area around the Wukan Desalination Plant (烏坎海淡廠) and the Basha Water Treatment Plant (白沙淨水場). A blue line traces the proposed pipe route. Key locations include the Wukan Lagoon (烏坎湖), Basha Water Treatment Plant (白沙淨水場), and various scenic spots like 'White Sand Beach' (白沙灘) and 'East Stone Village Environmental Park' (東石村環保公園). The map also shows major roads like 202 and 204.</p> |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-43</p> <p>澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p> |  | |
| <p>113-50</p> <p>澎湖所配水管線遷改工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-51</p> <p>澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程-鎖港漁船站</p> <p>提案單位： 中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心</p> |  | |
| <p>113-52</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖驗證-興港南街&配合亞果碼頭飯店改管工程</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |

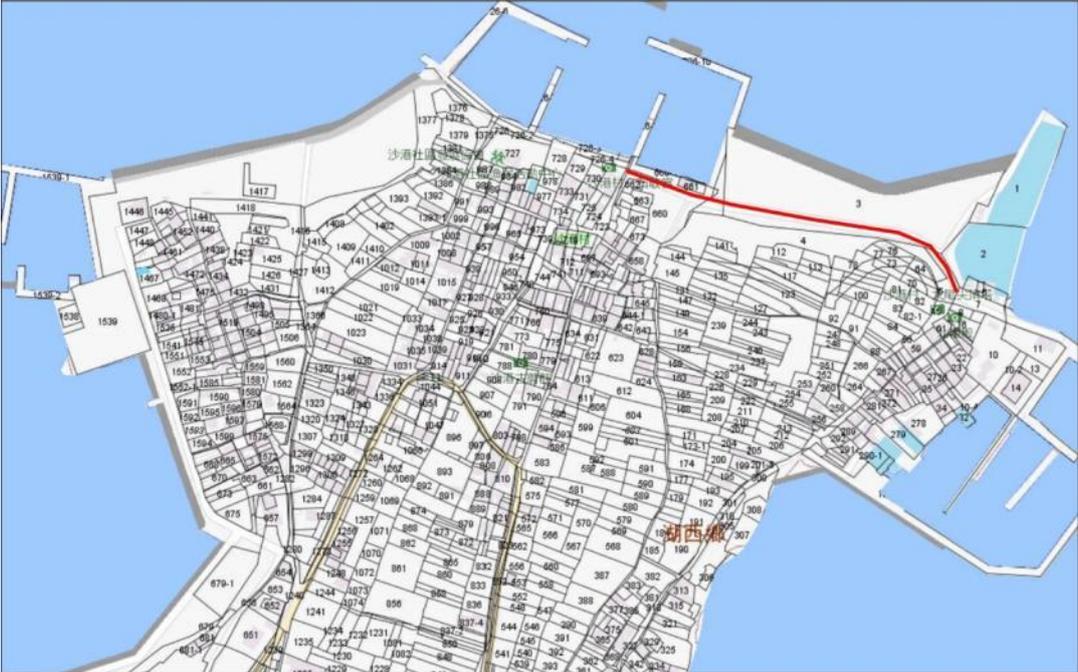
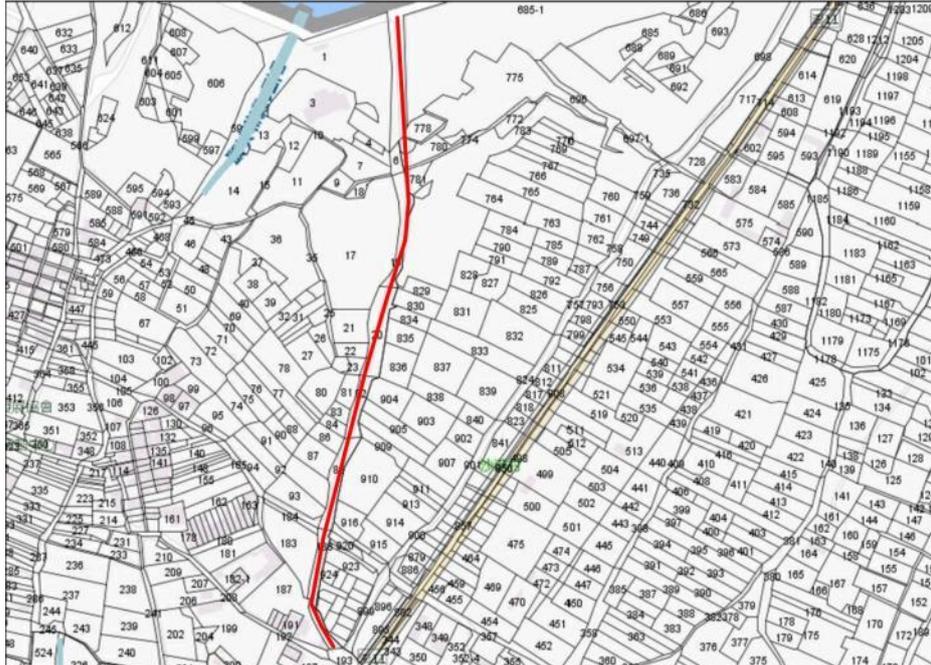
| | |
|--|--|
| <p>113-56</p> <p>114 年度鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> | |
| <p>113-57</p> <p>114 年度村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> | |



| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|----|---|
| <p>113-58</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主次幹管工程第一標 (藍色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> | | |
| <p>113-59</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1揚水站及壓力管工程(綠色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> | | |

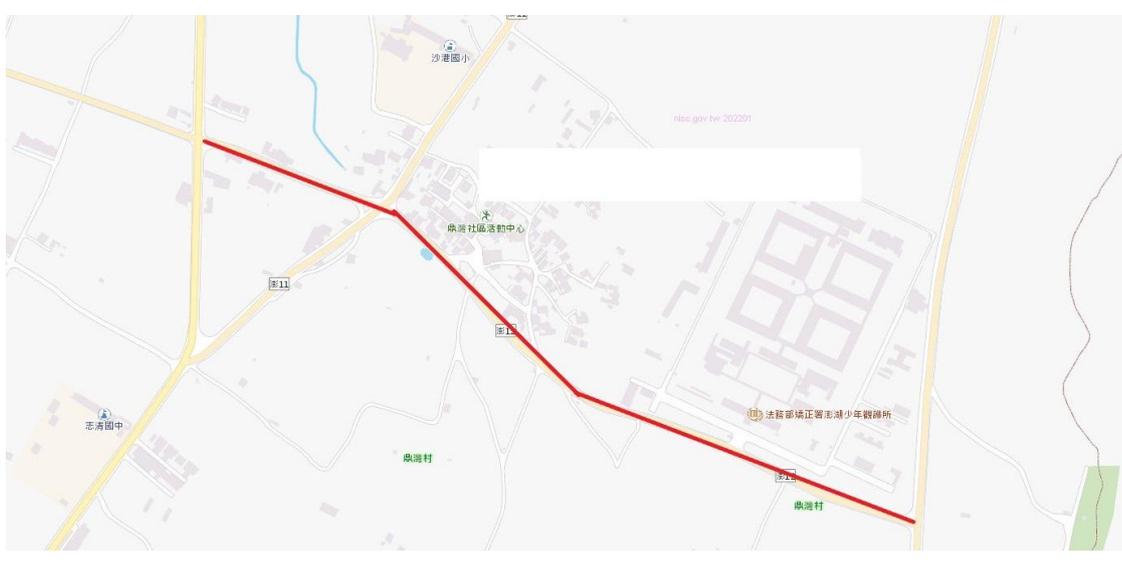
| 編號 | 位置 |
|--|----|
| <p>113-60</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標 (Ca)(紅色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> | |
| <p>113-61</p> <p>114 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> | |

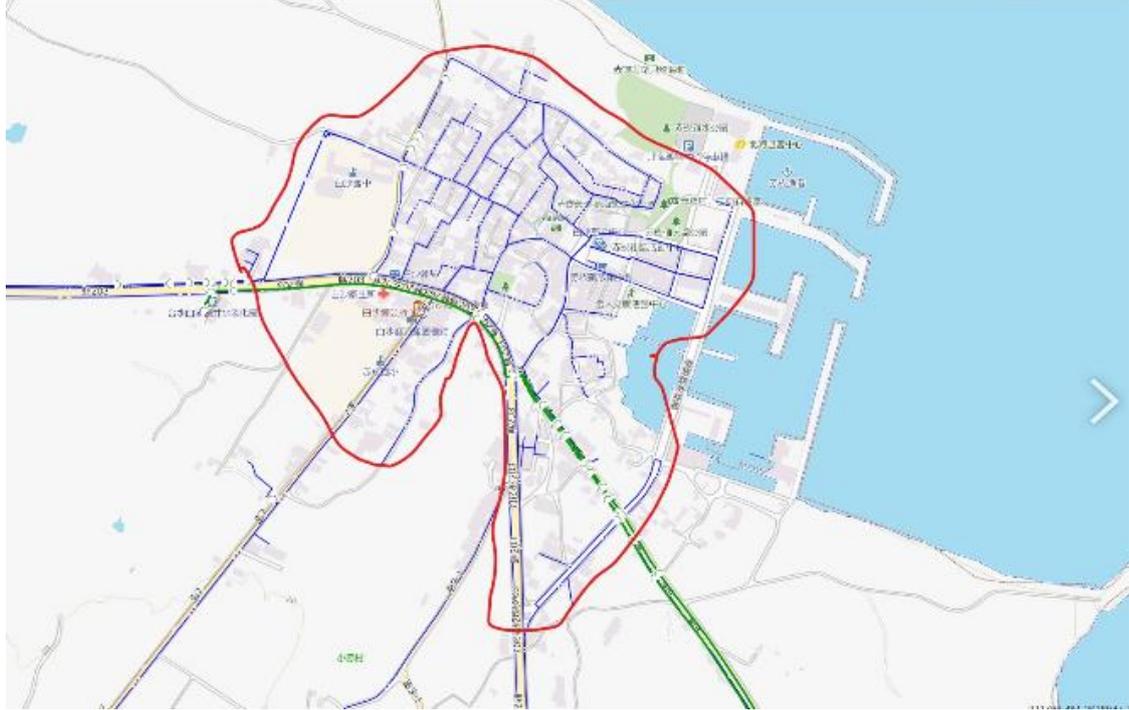
| 編 號 | 位 置 | 圖 |
|--|-----|---|
| <p>113-62</p> <p>馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府建設處</p> | | |
| <p>113-63</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 5 標 (沙港廣聖殿前路段改善工程)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p> | | |

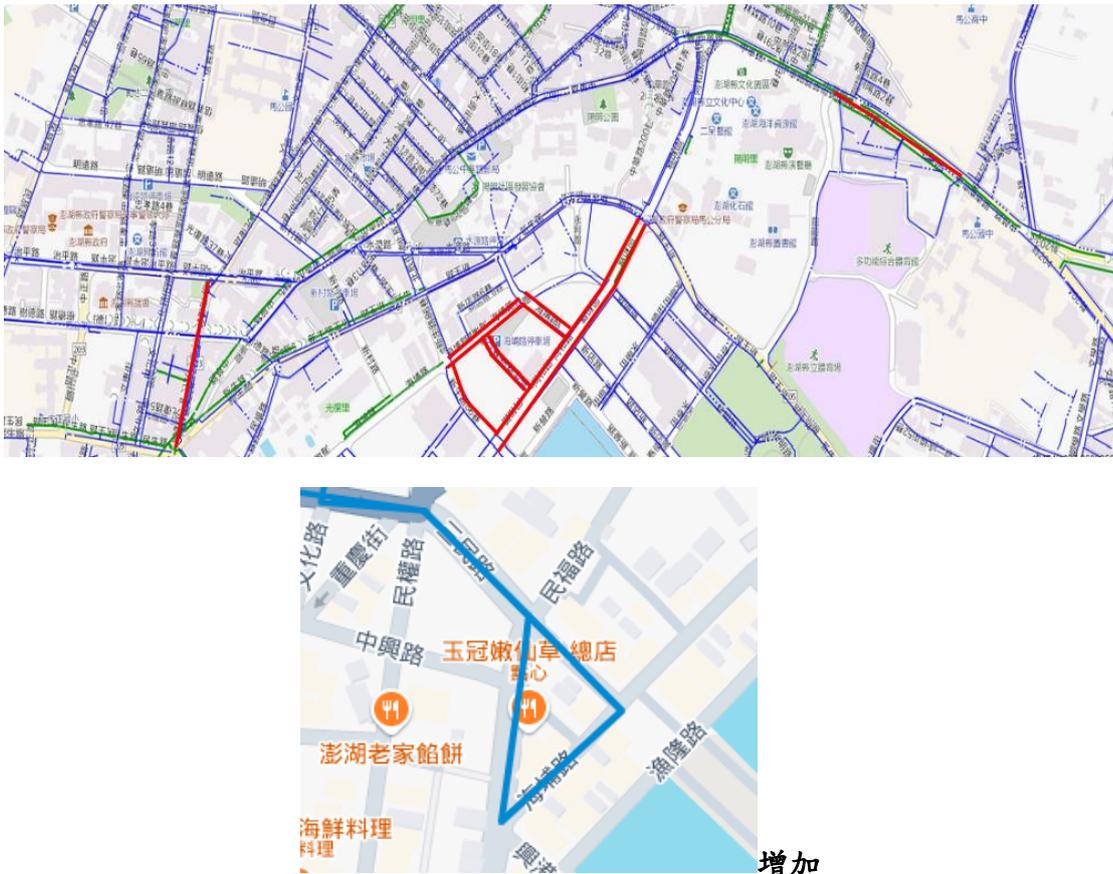
| 編 號 | 位 置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-63</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 5 標 (沙港中漁港至北極殿路段改善工程)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p> |  | |
| <p>113-64</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 6 標 (沙港國小至中西生命紀念館改善工程)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p> |  | |

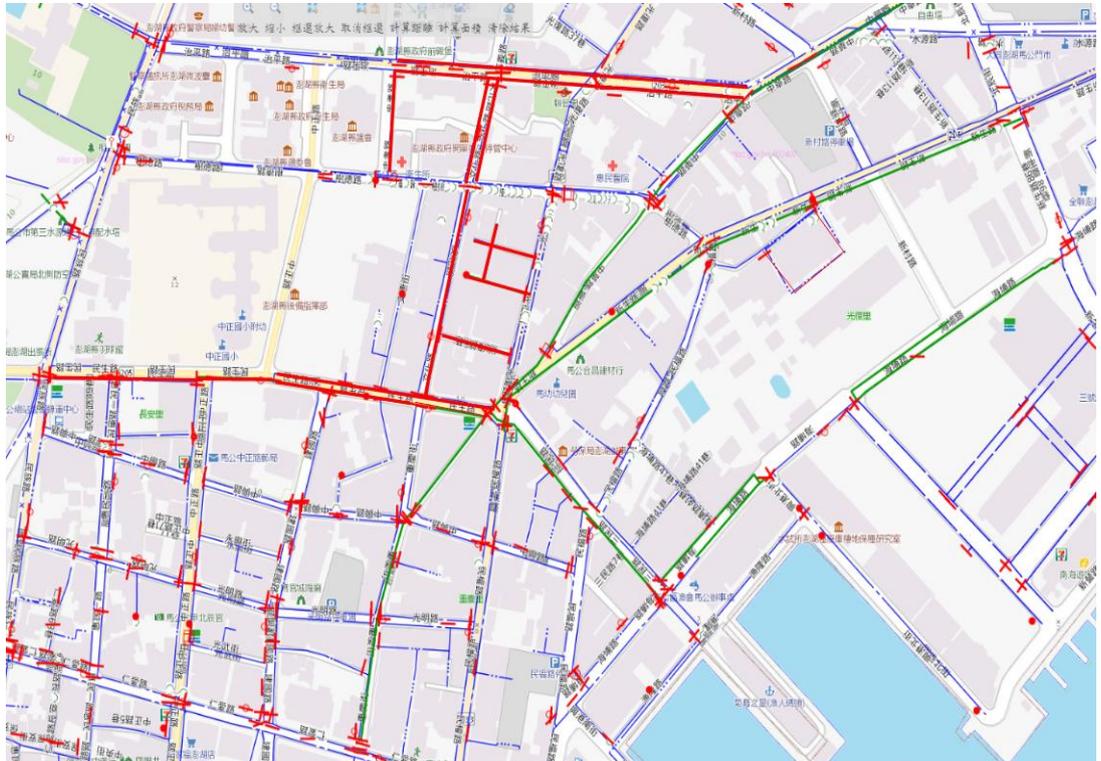
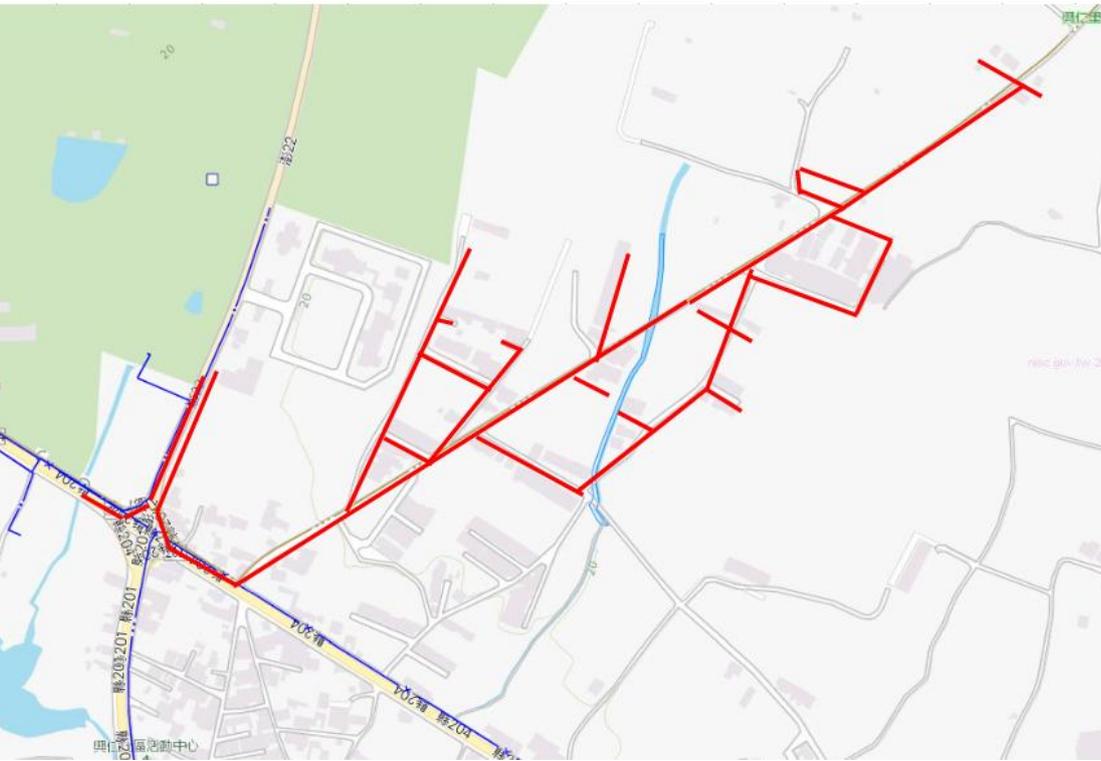
| 編 號 | 位 置 | 圖 |
|--|-----|---|
| <p>113-64</p> <p>湖西鄉道路改善工程第 6 標 (南北寮漁港道路改善工程)</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p> | | |
| <p>113-65</p> <p>114 年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程 潭邊村 85 號至 2-11 號宅路段</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p> | | |

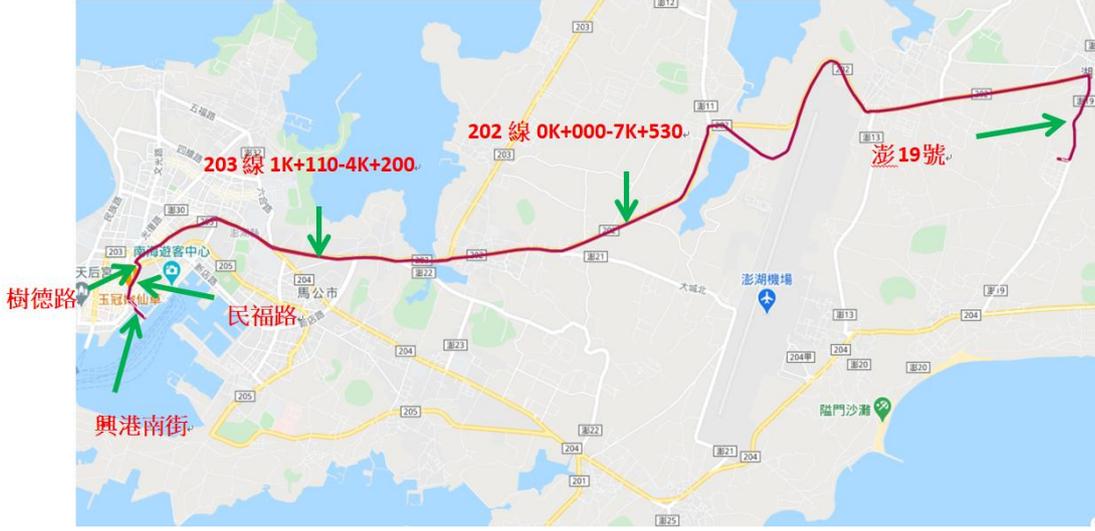
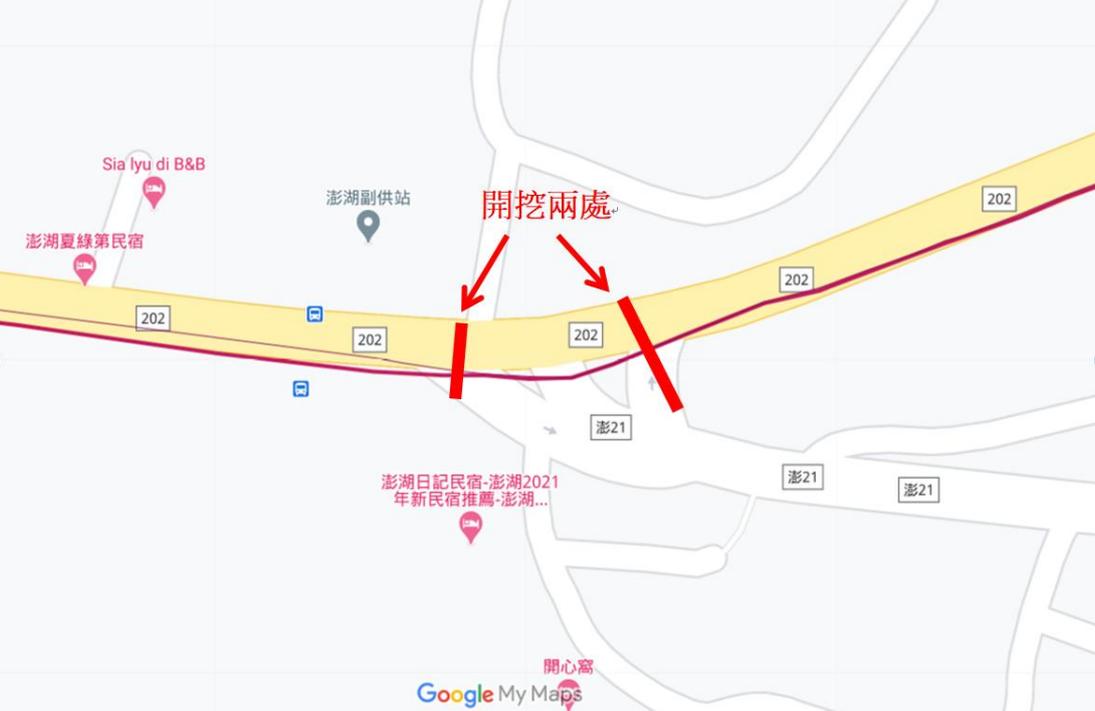
| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|----|---|
| <p>113-66</p> <p>澎湖縣馬公市五福路管遷工程</p> <p>提案單位： 自來水公司</p> | | |

| 編 號 | 位 置 | 圖 |
|---|--|---|
| <p>113-2-2</p> <p>小赤村管線 挖掘道路鋪 面改善工程</p> <p>提案單位： 白沙鄉公所</p> |  | |
| <p>113-2-4</p> <p>澎湖湖西鄉 澎 12 號線汰 換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營 運 所</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|--|---|
| <p>113-2-5</p> <p>澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p> |  | |
| <p>113-2-6</p> <p>澎湖縣白沙鄉通樑村管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p> |   <ul style="list-style-type: none"> A 危險路口改善 P 停車場改善 — 人行環境改善 C 交通寧靜區設置 — 在地居民道路鋪面改善 | |

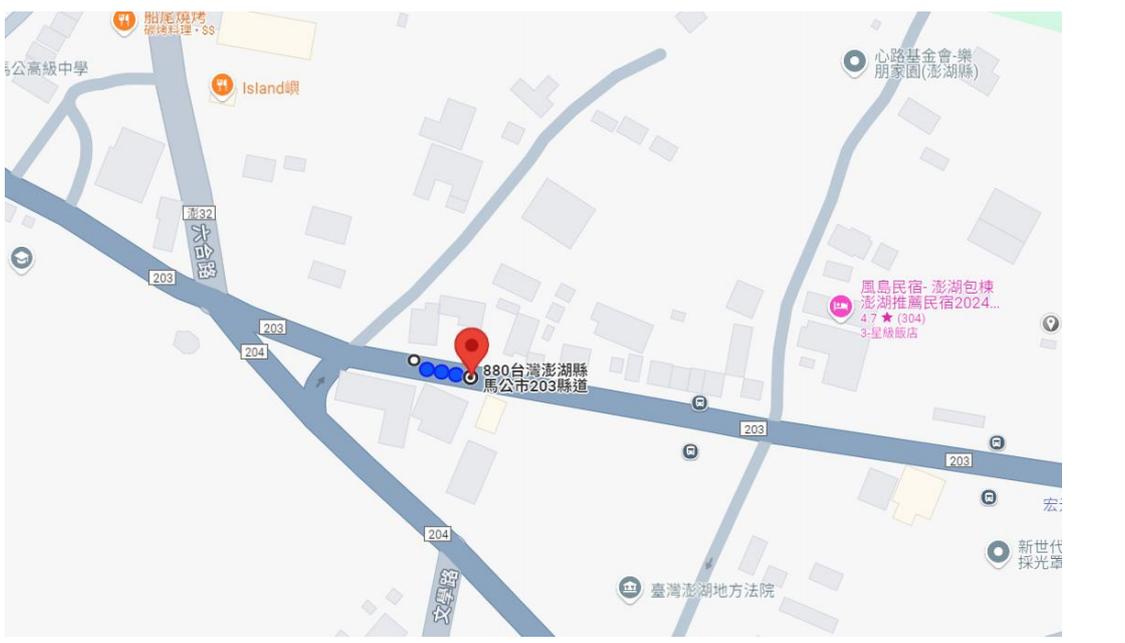
| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|--|---|
| <p>113-2-8</p> <p>澎湖縣馬公市中華同和路等汰換管線工程</p> <p>提案單位： 自來水公司</p> |  | |
| <p>113-2-9</p> <p>澎湖縣馬公市三多朝陽等路管線汰換工程(增加紅色範圍)</p> <p>提案單位： 自來水公司</p> |  | |

| 編號 | 位置 |
|--|--|
| <p>113-2-10</p> <p>澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程</p> <p>提案單位： 自來水公司</p> |  |
| <p>113-2-11</p> <p>澎湖縣馬公市興仁里無自來水延管工程一</p> <p>提案單位： 自來水公司</p> |  |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-2-12</p> <p>台灣中油 6 吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |
| <p>113-2-13</p> <p>台灣中油 6 吋及 8 吋管線開挖檢查 (202 縣道國軍副食品段)</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|----|---|
| <p>113-2-14</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖-成功水庫東側小路</p> <p>提案單位：台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> | | |
| <p>113-2-15</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖-成功國小對面 202 縣道</p> <p>提案單位：台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> | | |

| 編號 | 位置 |
|---|---------------------|
| <p>113-2-16</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖- 幸福民宿對面 202 縣道</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> | <p>開挖 6X4 長 X 寬</p> |
| <p>113-2-17</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖- 西溪社區招牌附近樹林</p> <p>提案單位： 營業處湖西供油服務中心</p> | <p>開挖 6X4 長 X 寬</p> |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>113-2-18</p> <p>台灣中油 8 吋管線緊密電位開挖 -202 縣道與澎 19 鄉道交界處</p> <p>提案單位：台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |
| <p>113-2-19</p> <p>台灣中油緊密電位開挖檢查-澎 203 縣道 2.5K 處</p> <p>提案單位：台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|--|---|
| <p>113-2-20</p> <p>台灣中油緊密電位開挖檢查-澎 203 縣道 3.35K 處</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |
| <p>113-2-21</p> <p>台灣中油緊密電位開挖檢查-澎 203 縣道 3.64K 處</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|----|---|
| <p>113-2-22</p> <p>馬公市水源路與北街口、新生路與北街口-2 處埋設管道</p> <p>提案單位：新世紀資通</p> | | |
| <p>113-2-23</p> <p>202 線 7K+170 澎湖縣湖西鄉 77-11 號前埋設管道</p> <p>提案單位：新世紀資通</p> | | |

| 編號 | 位置 |
|--|----------------------------|
| <p>113-2-24</p> <p>204 線 7K 左右埋設管道</p> <p>提案單位： 新世紀資通</p> | <p>204線7K左右-埋設管道預估-18M</p> |
| <p>113-2-25</p> <p>馬公市鎖港里 1483 號前埋設管道</p> <p>提案單位： 新世紀資通</p> | <p>馬公鎖港郵局前-埋設管道20M</p> |

114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

| 編號 | 位置 |
|---|---|
| <p>114-1</p> <p>澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> |  |

| | |
|---|--|
| <p>114-2</p> <p>114 年度市區道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> | |
|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 編 | 號 | 位 | 置 | 圖 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>114-4</p> <p>114 年度鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> | |
|---|--|

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|----|---|
| <p>114-5</p> <p>七美鄉中和村衛生所前道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> | | |

| | |
|---|---|
| <p>114-6</p> <p>114 年度村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> |  <p>The figure consists of three maps showing road improvement project locations in Penghu County. The top map shows a road segment between 'I庭民宿' and '打個吨海景民宿' (5.0★(103) 3-星級飯店). The middle map shows a road segment near '湖西鄉西溪北極殿', '雅柏居', '三點水民宿', and '西溪籃球場'. The bottom map shows a road segment near '澎湖縣湖西鄉沙港國民小學', '鼎灣文創園區 (活化舊營區)', and '鼎灣米糕總店 早餐'.</p> |
|---|---|

| 編號 | 位置 | 圖 |
|---|---|---|
| <p>114-7</p> <p>澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p> |  | |

114-8

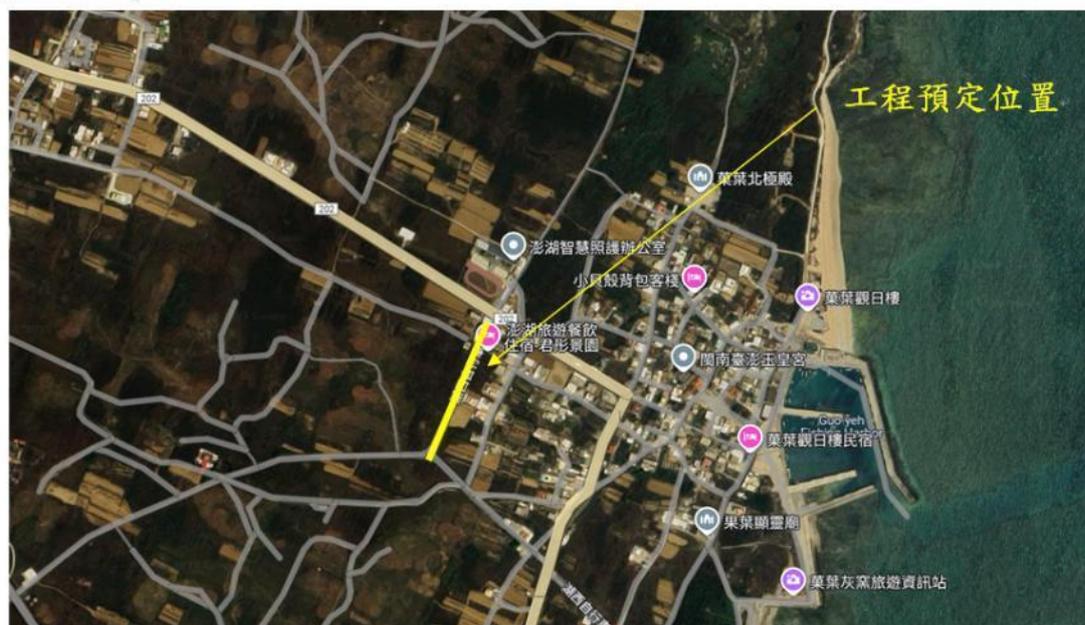
114 年度湖
西鄉農路改
善工程

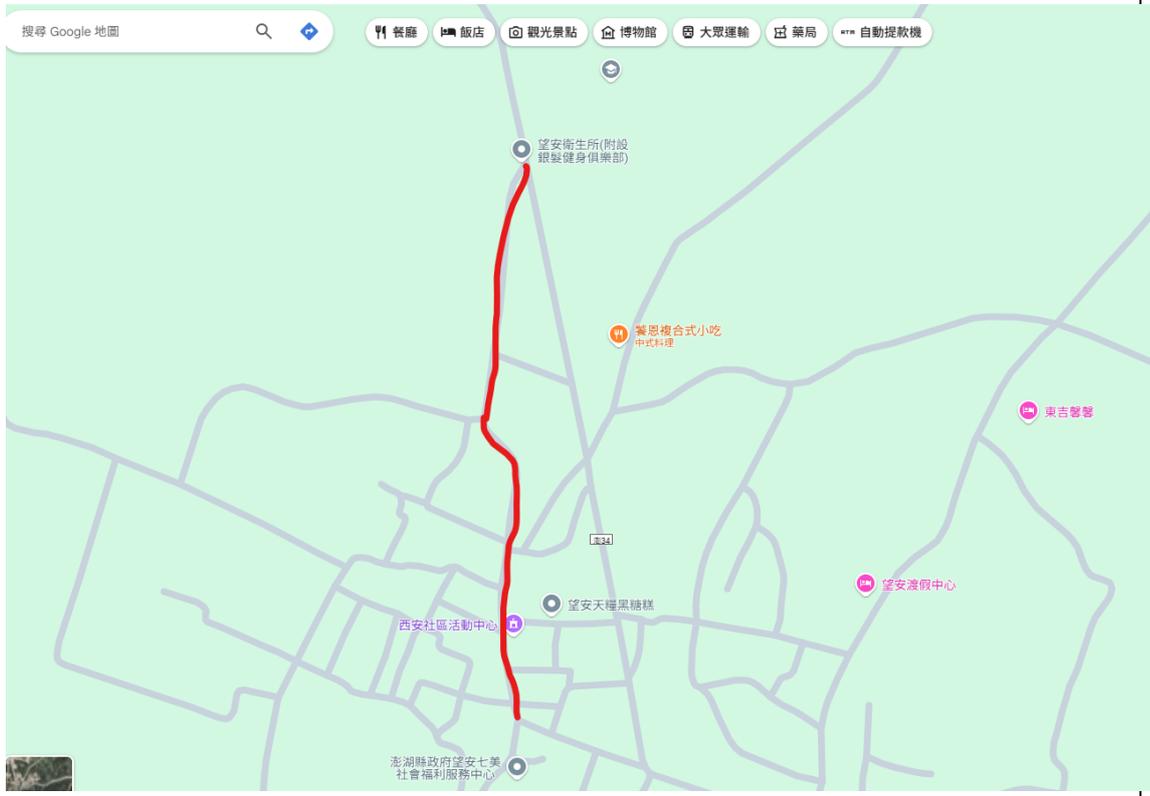
提案單位：
澎湖縣政府
湖西鄉公所

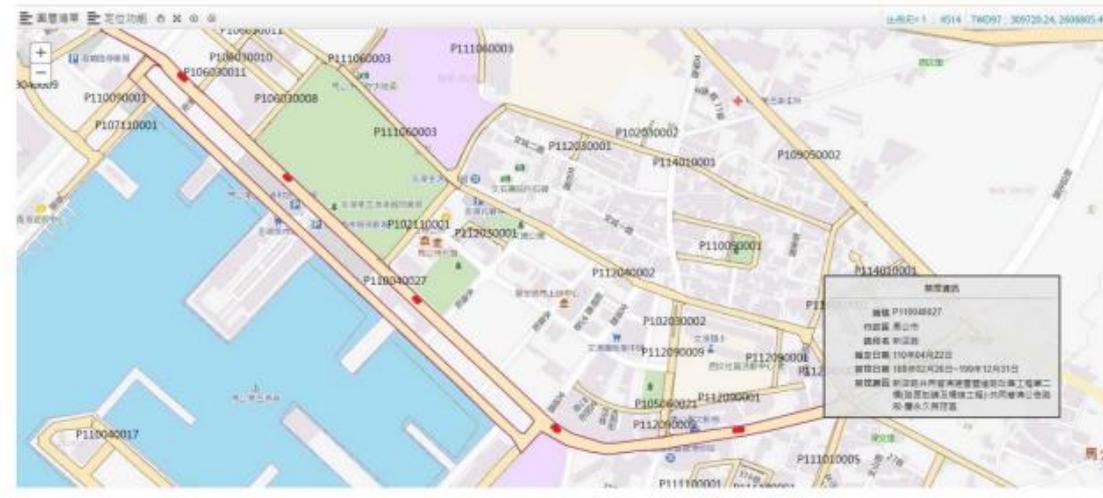
農澎湖 027，農澎馬 013



農澎湖 022



| 編號 | 位置 |
|---|--|
| <p>114-9</p> <p>西安村人行 環境暨路口 改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 望安鄉公所</p> |  |
| <p>114-10</p> <p>69kV 澎湖~ 馬公紅白線 M25 人孔提 升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供 電區營運處</p> |  |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>114-11</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M41 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p> |  | |
| <p>114-12</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M36~M40 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|--|---|
| <p>114-13</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M10-M12 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p> |  | |
| <p>114-14</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M22-M23 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p> |  | |

| 編號 | 位置 | 圖 |
|--|---|---|
| <p>114-15</p> <p>電動公車充電樁管線開挖工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 公共車船管理處</p> |  | |
| <p>114-16</p> <p>澎湖縣湖西鄉潭邊村供水改善工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處</p> |  | |

| 編號 | 位置圖 |
|---|--|
| <p>114-17</p> <p>白沙鄉通梁社區道路安全及人行道空間建置計畫</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p> |  |
| <p>114-18</p> <p>監視系統裝設</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p> |  |
