

澎湖縣 114 年度「路面管線工程協調小組」 第 2 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、推動道路平整方案

- 一、為提升本縣執行路平成效，辦理道路刨除加封工程時，請各管線單位務必在指定期程內配合預埋管線及檢討減量、人手孔蓋下地，並應確保挖掘範圍臨鋪品質，倘沉陷經查驗未符平坦度規定將進行裁罰。
- 二、各管線單位應於人手孔提升施工後，辦理調降下地作業，以維持現有道路平整性，除路面上之人手孔蓋除具有救災功能或特殊需求，經核准得免下地外，其餘人手孔蓋以下地至少十公分為原則，並建議於孔蓋上方加裝地工格網或其他妥適處理方式，以增加其摩擦力避免滑動。
- 三、未下地人手孔蓋及制水閥為各管線單位之財產，其於道路上使用即應盡維護及管理責任，並派員定期巡視，以維持道路平整確保人車通行安全，如發現缺失應立即改善，倘經本府查驗未符合平坦度規定將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」進行裁罰，另本府針對孔蓋防滑訂定「澎湖縣地下管線人手孔蓋防滑標準」(人手孔蓋面積九百平方公分以上者，所有檢測點抗滑係數平均值應在五十 BPN 以上)，新設孔蓋應依規定達到防滑係數標準，舊有孔蓋應確實辦理相關檢驗及報告，必要時應進行更換，本府得隨時抽查，未符規定將強制汰換或要求下地。

貳、道路挖掘管理事宜

一、路證審核單位：

1. 本府工務處：縣道 201、202、205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
 2. 公路局澎湖工務段：縣道 203、204。
 3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。
- 如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

參、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

一、如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位亦應依程序核發路證。

二、經審計單位抽查本府系統案件（以 113 年度案件為主）發現作業缺失，請各路權單位及管線單位，應謹慎填報及審查資料，避免類似情形再發生，以確保作業符合規範：

1. 查少數案件挖掘面積超過二十平方公尺，未依規定辦理資料上傳或上傳資料與實際不符，已請相關單位依規定完成修正與補充。
2. 未確實控管申請案件進度，造成繳費遲滯或案件滯留等情形，請各管線單位及路權單位嚴格控管辦理進度，務必依期完成相關作業。

肆、道路修復費用支用情形

一、各鄉市公所 113-114 年度提報經縣府核定之工程，請盡速辦理，應辦期程如下表，如未於預定期程內辦理完成將撤回經費於下一年度辦理。

縣府核定經費辦理，尚未完成之工程

工程名稱	單位	核定經費	經費使用情形	
113年度馬公市道挖改善工程(第3標)	馬公市公所	12,645,972	113年度預算保留	請於114年11月底前核銷結案
113年度七美鄉道路挖掘修復工程	七美鄉公所	6,000,000	113年度預算保留	請於114年11月底前核銷結案
望安鄉將軍村淨水場周邊道路鋪面改善工程	望安鄉公所	1,200,000	113年度預算保留	請於114年11月底前核銷結案
113年度馬公市五德里道挖改善工程	馬公市公所	3,208,000	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
「(114)五德威靈宮前道路改善工程」	馬公市公所	1,921,254	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
馬公市東文澳108-43號周邊道路改善工程	馬公市公所	2,355,000	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
113年度馬公市道挖改善工程(第1標)	馬公市公所	5,272,000	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
外垵村道路挖掘改善工程	西嶼鄉公所	1,911,573	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
114年度白沙鄉小赤村管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉公所	3,270,000	114年度預算	請於114年11月底前核銷結案
114湖西鄉村里道路挖掘改善工程	湖西鄉公所	9,420,000	114年度追加減	請於114年12月底前核銷結案
114年度馬公市道挖改善工程	馬公市公所	11,890,000	114年度追加減	請於114年12月底前核銷結案

二、各鄉市公所 115 年度可運用之道路管理基金路面修復費用如下表，請各公

所務必於 114 年 11 月前提送道路工程改善計畫報本府審核。依據提送順序匡列經費，如年度預算業已匡列完畢，將納入年度追加減預算辦理，請各公所依執行量能審慎評估後再行申請，以避免工程進度延宕，影響本府預算執行率。

	馬公市公所	湖西鄉公所	西嶼鄉公所	白沙鄉公所	七美鄉公所	望安鄉公所
總計	9,467,935	3,749,286	8,060,136	2,017,705	8,255,616	148,017

伍、其他配合事項：

- 一、本會議宗旨係協調各路權及管線單位預計施作之道路工程，使其相關單位能配合期程及相關作業，路權單位應當表率，確實提供資料，以利其他單位配合。
- 二、本府預訂 114 年 11 月份辦理公共管線系統操作教育訓練，請各單位派員參加(實際使用者及承辦人員務必參加)。

陸、施工路段協調

- 一、113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表(附件 1)。
- 二、114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表(附件 2)。
- 三、道路及管線工程項目施工位置圖檔(附件 3)。

柒、臨時動議

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
1	113-1、2	公路局 澎湖工務段	縣道擇要路面修復工程	1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局~澎福古棗味) 2. 204縣道3K+800-4K+100(興仁~烏坎) 3. 204縣道7K+120-7K+690(隘門)	公路局 澎湖工務段	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局	1. W=16，L=750 2. W=15，L=300 3. W=12，L=570	預計114年12月底	原預計113年下半年度	第3條新增 照案通過 請召開管線協調會	1. 中華電信人手孔下地 2. 自來水請檢討管線修漏問題	
2	113-9	國土管理署 南區工程署	澎湖縣馬公市機三北側8米計畫道路開闢工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=8m, L=140m	預計114年11月20日完工	114年1月16日開工	照案通過		
3	113-10	國土管理署 南區工程署	澎湖馬公市案山段8米計畫道路開闢計畫		澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=8m, L=120m	預計114年11月20日完工	114年1月16日開工	照案通過		
4	113-11	澎湖縣政府 土木科	澎13線鄉道改善工程	湖西至青螺社區(0K+000~2K+200)	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	W=8m, L=2200m	7月28日開工 目前施工中		照案通過 請召開管線協調會		新增2K-4K 案114-2-4
5	113-19	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標	剩重光里	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ☐澎湖有線電視 ■警察局	W= 8m, L= 3012m	目前正在辦理變更設計，停工中，現場皆已施作完成。	施工中 預計114/4完工	照案通過		解除列管
6	113-20	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程分支管網及用戶接管工程第二標	五福路、光榮街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ☐警察局		現場已施做完畢	施工中 預計115/4完工	照案通過		解除列管
7	113-22	澎湖縣政府 下水道科	113年度污水下水道路挖掘修復工程	石泉社區(204縣道以北、澎23鄉道以西)	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		竣工		照案通過		解除列管
8	113-31	湖西鄉公所	太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程	1. 隘門村124-8宅東 2. 隘門村105-109號宅 3. 隘門村將軍廟隘門新段 1046地號附近	湖西鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	1. W=3m，L=58m 2. W=2.5m，L=58m 3. W=17.5m，L=28.5m	竣工		照案通過 請召開管線協調會		解除列管

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
9	113-39	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	白坑村(社區)架空線路 地下化預埋管路工程	澎13號線部分~白坑社區	湖西鄉公所	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 0.6m, L=2,000m	規劃於今年底前完工	1. 原預計 113年4月-10月 2. 延至預訂 114年4月-10月	照案通過	澎13線倘未能配合 縣府期程(113-11) 將撤案	
10	113-40	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	七美鄉平和村線路改善 預埋管路工程	七美鄉平和村垃圾掩埋 場~潭子港~機場跑道南 側(九孔養殖池)及七美 海鮮風味餐旁	七美鄉公所	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m, L=1,600m	延至115年7月-12月	1. 原預計113年 4月-10月 2. 延至預訂114年 4月-10月	照案通過	1. 公所同意本案施 作 2. 請公所納入115 年度創鋪(基金專 款專用)	公所確認是否同 意延期
11	113-41	台灣自來水 公司第七區 管理處	馬公海淡廠至成功場管 線連絡工程	由澎202號線(國軍副食 品供應站門口)至成功淨 水場路段	澎湖縣政府	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=1.5m, L=1,300m	竣工		照案通過		解除列管
12	113-42	台灣自來水 公司第七區 管理處	烏坎海淡廠送白沙淨水 場清水管工程	由澎202號線(東衛國軍 副食品供應站門口)沿澎 12號線至鼎灣轉203號線 至赤坎白沙淨水場	公路局 澎湖工務段/ 澎湖縣政府 /湖西鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=1.0m, L=14,000m	施工中 預計年底完成管線埋設	114/2進場-115/2	照案通過		
13	113-43	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	澎湖湖七美鄉平和村汰 換管線工程	汰換平和村頂茄埕、下 茄埕與九孔生態園區等 區域管線汰換	七美鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m, L=5,600m	114年9月進場施工	因管材變更重新 設計，預計5月公 告招標	照案通過	1. 公所同意本案施 作 2. 請公所納入115 年度創鋪(基金專 款專用)	
14	113-50	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	澎湖所配水管線遷改工 程	1. 新店路及新生路路口 2. 案山北極殿前巷道 3. 鼎灣開帝殿前 4. 西嶼鄉赤馬村往內垵 村203縣道下坡方向	公路局 澎湖工務段/ 馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 新世紀資通 ☐ 澎湖有線電視	W=0.6~8m L=530m	1. 新生路過禁挖期施作 ，並於115/4前完成 3. 鼎灣已施工完畢 4. 內垵村203線處施工中		照案通過	2. 案山北極殿不同 意施工	

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
15	113-51	中油公司澎湖營業處馬公直銷服務中心	澎湖地區加油站地下儲槽暨油電管等更新工程	鎖港漁船站	馬公市公所	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=1 m L=365 m	竣工	已申請路權 預計114年3月底完工	照案通過		解除列管
16	113-52	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖驗證	興港南街&配合亞果碼頭飯店改管工程	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=4 m, L=130 m	竣工	預計113年11月至114年4月底	照案通過		解除列管
17	113-54	新世紀資通	澎205號線7K+7.5起~204號線0K至0K+3.6~201號線0K+2純埋設管道改善線路工程	剩澎201號線0K+2處管線連接改善	澎湖縣政府	台電 自來水公司 新世紀資通 澎湖有線電視	W=管溝寬度1m L=600m	取消施作	預計113年6月~114年度	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案
18	113-55	澎湖縣政府 土木科	「澎20線道路拓寬工程（烏炭-隘門）」		澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=m, L=1288m	預計11月發包	已召開設計協調會	照案通過		
19	113-56	澎湖縣政府土木科	114年度鄉道改善工程	澎17線(204縣道尖山顯濟殿到昌億十字路口)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		竣工	照案通過 請召開管線協調會			解除列管
20	113-57	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路改善工程-第二標	西溪村、沙港村、龍門村、南寮村、湖東村	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		預計年底完工	原預計114年上半年	照案通過 請召開管線協調會		
21	113-58	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主次幹管工程第一標	1. 同和路-新店路-文德路 2. 203縣道(文化局-華勇預拌廠前)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	短管推進 L=3, 700m	預計114年~116年度	原定114年~115年度	照案通過 請召開管線協調會		
22	113-59	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1揚水站及壓力管工程	1. 國際廣場-體育園區道路-中華路口 2. 國際廣場-新生路-新村路	澎湖縣政府	台電、 自來水公司、 中華電信、 澎湖有線電視	壓力管 L=1, 440m	預計115-116年度	原定114年~115年度	照案通過 請召開管線協調會		
23	113-60	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標(Ca)	新店路以北、中華路以南	澎湖縣政府	台電、 自來水公司、 中華電信、 澎湖有線電視	短管推進 L=3, 499m	預計116-118年度	原定114年~116年度	照案通過 請召開管線協調會		
24	113-61	澎湖縣政府 下水道科	114年度雨水下水道改善工程	同和路-中華至新生	澎湖縣政府	台電、 自來水公司、 中華電信、 澎湖有線電視 警察局	W=m L=300m	114/9/17開工， 已開過管線協調會	同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程	照案通過 請召開管線協調會		

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
25	113-62	澎湖縣政府 建設處	馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程	預計辦理民福路接至海埔路管線連接新設	澎湖縣政府	■台電 □自來水公司 ■中華電信 □澎湖有線電視	W=11m L=99.4m	114年9月8日申報開工 工期270日曆天	道路開闢工程後續擴充程序刻正簽辦中，未來將於道路工程施作路基前將通知中華電信及台電公司埋設管線。	照案通過 請召開管線協調會		
26	113-63	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第5標	1.沙港天后宮前路段改善工程(總長400M、均寬10M)。 2.沙港廣聖殿前路段改善工程(總長140M、均寬10M)。 3.沙港中漁港至北極殿路段改善工程(總長350M、均寬8M)。	湖西鄉公所	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：890公尺 寬：9.3公尺	竣工		照案通過 請召開管線協調會		解除列管
27	113-64	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第6標	1.湖西幼兒園前路段改善工程(總長450M、均寬4.5M)。 2.沙港國小至中西生命紀念館改善工程(總長590M、均寬6M)。 3.南北寮漁港道路改善工程((總長230M、均寬6M)。	湖西鄉公所	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：1270公尺 寬：5.5公尺	預計9月底完成		照案通過 請召開管線協調會		
28	113-65	湖西鄉公所	114年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程	1、尖山45-1號旁道路改善-(全長54.6M*路寬約7.5M) 2、龍門安良廟西側道路改善(不含溝面)-(全長175M*路寬約5M) 3、成功1-67號宅往202縣道路面改善(含溝面)-(全長210M*路寬約7M) 4、成功111~117號宅前道路改善-(全長74M*路寬約6M)	湖西鄉公所	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：約280+513.6公尺 寬：約4~8公尺	剛發包		照案通過 請召開管線協調會		
29	113-2-2	白沙鄉公所	小赤村管線挖掘道路鋪面改善工程		白沙鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	W=m, L=330m	114.8.18開工(60日曆天) 施工中		照案通過 請召開管線協調會		

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
30	113-2-4	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖湖西鄉澎12號線汰換管線工程	澎12號線(鼎灣監獄-203號線路口)	湖西鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m、 L=1,100m	本案因烏炭海淡廠送白沙淨水場清水管工程進場施工，本所將研議配合一併施工	經評估線場無法配合施工	撤案 併入113-42		撤案
31	113-2-5	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程		公路局 澎湖工務段/ 白沙鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6~1m L=14200m	預算書提報中，預計114年底發包		照案通過 部分路段公所112年度前瞻計畫已施作完成，屬三年禁挖，遇禁挖路段不施作	公所提供禁挖路段範圍請自來水檢討減作	
32	113-2-6	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣白沙鄉通樑村管線汰換工程		公路局 澎湖工務段/ 白沙鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=6500m	設計中，預計114下半年度施作	併白沙赤崁村汰換案一併提送預算預計114年底發包	撤案	自來水無法配合縣府期程，三年後再行申請	
33	113-2-8	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣馬公市中華同和等路管線汰換工程	中華路(馬公高中對面)、同和路、光復路(治平路交查路口至民權路路口) 增加一處(三民福海埔)	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=2232m	設計中，預計114年度發包	因本公司另案辦理馬公促參降露案，本案暫緩辦理	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案，請確認期程於後續會議提出
34	113-2-9	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣馬公市三多朝陽等路管線汰換工程	增加兩處(六合及周邊)	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=5611m	設計中，預計114年度發包	因本公司另案辦理馬公促參降露案，本案暫緩辦理	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案，請確認期程於後續會議提出
35	113-2-10	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程	民生路、文化路、忠孝路、治平路等路段	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=1839m	設計中，預計114年度發包	9月底進場施工	1.文化路，撤案 2.忠孝路、民生路、治平路，照案通過	1.文化路縣府114/3/20進場 2.忠孝路請於114年度完成 3.忠孝路、民生路及治平路工程於8月後施作	

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
36	113-2-11	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣馬公市興仁里等供水延管工程(一)	馬公市公所	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=2600m	施工中 預計7月竣工	竣工	204縣道部分請於工務段進場前施作完畢		解除列管
37	113-2-12	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油6吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎湖19號-湖西供油中心	公路局 澎湖工務段/ 馬公市公所/ 湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=5m, L= 14 m 3處	目前申請路權中 預計114年9月-12/31	針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕較嚴重處進行開挖檢查 預計114/4/15完成	照案通過	請公所及工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程	202兩處未禁挖 中華路1處禁挖至116/5
38	113-2-13	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油6吋及8吋管線開挖檢查(202縣道國軍副食品段)	澎湖21線及202縣道(國軍副食品)交接處橫切道路至202縣道國軍副食品段檢查2條長途管線狀況	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=1.5 m, L= 40 m	取消施作	確認其它管線是否有影響到中油管線	照案通過	澎湖21線禁挖至116/6，不施作	撤案
39	113-2-14	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖-成功水庫東側小路		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
40	113-2-15	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖-成功國小對面202縣道		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
41	113-2-16	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖-幸福民宿對面202縣道		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
42	113-2-17	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖-西溪社區招牌附近樹林		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	
43	113-2-18	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油8吋管線緊密電位開挖-202縣道與澎19鄉道交界處		澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	須配合工務段113-2工程	撤案
44	113-2-19	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道2.5K處		公路局 澎湖工務段	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
45	113-2-20	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道3.35K處		公路局 澎湖工務段	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
46	113-2-21	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油緊密電位開挖檢查-澎203縣道3.64K處		公路局 澎湖工務段	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=4 m, L= 6 m	取消施作	管線緊密電位開挖驗證	照案通過	請於114/4/20前完成或114/8月施作	撤案
47	113-2-22	新世紀資通	馬公市水源路與北街口、新生路與北辰街口-2處理設管道		馬公市公所	台電 自來水公司 新世紀資通 澎湖有線電視	W=1m L=32m	取消施作	預計114年6月中施工	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案
48	113-2-23	新世紀資通	202線7K+170澎湖縣湖西鄉77-11號前埋設管道		澎湖縣政府	台電 自來水公司 新世紀資通 澎湖有線電視	W=1m L=20m	取消施作	預計114年6月中施工	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案
49	113-2-24	新世紀資通	204線7K左右埋設管道		公路局澎湖 工務段	台電 自來水公司 新世紀資通 澎湖有線電視	W=1m L=18m	取消施作	預計114年6月中施工	保留提案	未確認施工期程，延至下一次會議決議	撤案
50	113-2-25	新世紀資通	馬公市鎖港里1483號前埋設管道		澎湖縣政府	台電 自來水公司 新世紀資通 澎湖有線電視	W=1m L=20m	取消施作	預計114年6月中施工	請過禁挖期再行申請	禁挖至115/12	撤案

澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表												
項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	第1次決議	配合事項	
1	114-1	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程	中正、永安橋	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		預計114年11月進場		照案通過 請召開管線協調會	已開設計階段會議 邀集各單位與會	
2	114-2	澎湖縣政府 土木科	114年度市區道路改善工程	1. 新店北路 2. 新營路	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		竣工		照案通過	警察局及中華電信須配合	解除列管
3	114-3	澎湖縣政府 土木科	114年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	1. 明遠路(信義路-光復路) 2. 新村路(馬公國小-光復路) 3. 忠孝路(民遠路-安一飯店-民族路) 4. 三多路(敬業街-陽明路) 5. 文光路(四維路-陽明路) 6. 陽明路(民族路-光復路) 8. 信義路(治平路-民遠路) 9. 文化路(樹德路-民生路) 10. 同和路(北辰街-海埔路)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		6-移至115年度 10-移至116年度 預計11月第3次派工(同和路及其他路段管挖路基改善)	9於3/20進場，四月底第一次派工 1. 2. 3. 8. 10，9月第二次派工完成	照案通過	1. 明遠路及信義路口警察局兩處架空請配合下地 2. 三多路下水道尚須降孔	
4	114-4	澎湖縣政府 土木科	114年度鄉道改善工程	六合路(中華路-三多路)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	L=528 m W=10 m	竣工		照案通過		解除列管
5	114-5	澎湖縣政府 土木科	七美鄉中和村衛生所前道路改善工程		澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	L=725 m W=9m	竣工	AC改為PC	照案通過		解除列管
6	114-6	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路改善工程	1.鼎灣亭居 2.沙港 3.西溪	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		竣工	114. 3. 10開標	照案通過 請召開管線協調會		解除列管
7	114-7	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程	1.文光國小(三多路-自強街) 2.中正國小(樹德路)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	道路段連接管 L=192m	竣工		照案通過		解除列管
8	114-8	湖西鄉公所	114年度湖西鄉農路改善工程	1. 編號：農澎湖027，農澎馬013-(全長450M*路寬約4.0M) 2. 編號：農澎湖022 --(全長210M*路寬約6.0M)	湖西鄉公所	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	長：約660+100公尺 寬：約4-6公尺	預計114/12/31前完成	1. 編號：農澎湖027，農澎馬013-追加部分：(全長100M*路寬約6M)	照案通過 請召開管線協調會		
9	114-9	望安鄉公所	西安村人行環境暨路口改善工程	望安衛生所至西安村活動中心路段	望安鄉公所	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W=5 m, L= 537 m	預計114年至115年3月	1. 澎湖縣永續提升人行安全計畫 2. 預計3/30勞務開標	照案通過 請召開管線協調會		
10	114-10	台電嘉南供電區營運處	60kV澎湖-馬公紅白線M25人孔提升及降埋	204縣道3K+241	公路局 澎湖工務段	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W=1.6 m L=1.6 m 1處	取消施作	114年8月-115年12月	保留提案	未確認施工工期，延至下一次會議決議	解除列管

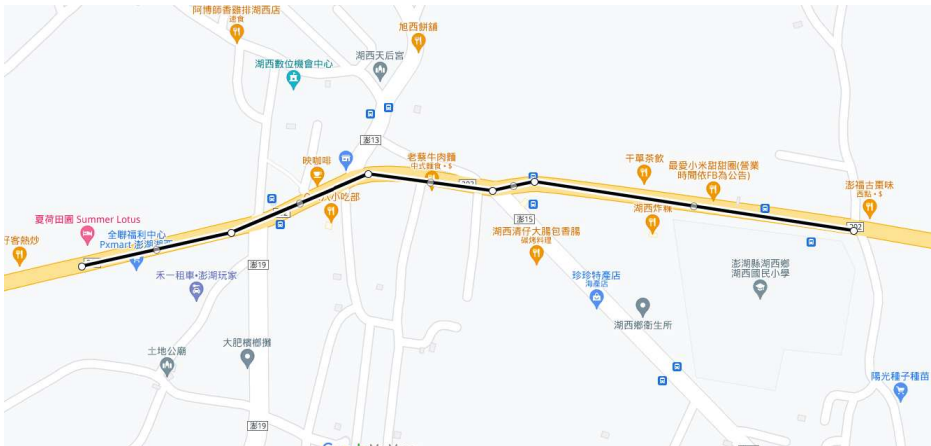
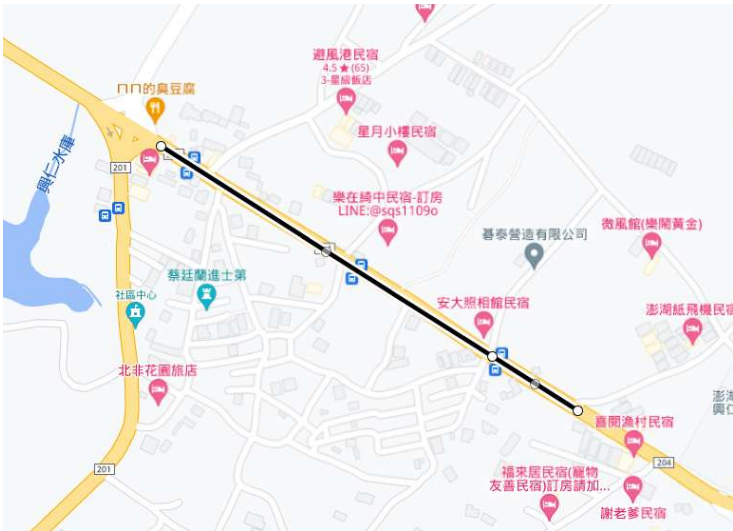
項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	第1次決議	配合事項	
11	114-11	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M41人孔提升及降埋	海埔路上快樂渡假村南路口	馬公市公所	■台電 □自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 1處	114年11月~114年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1. 未確認施工工期，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成	
12	114-12	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M36~M40人孔提升及降埋	新店路	澎湖縣政府	■台電 □自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 5處	114年11月~114年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1. 未確認施工工期，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成	
13	114-13	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M10~M12人孔提升及降埋	204縣道6K+903~204縣道6K+495	公路局 澎湖工務段	■台電 □自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 3處	114年11月~114年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1. 未確認施工工期，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成	
14	114-14	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M22~M23人孔提升及降埋	204縣道3K+959~204縣道3K+706	公路局 澎湖工務段	■台電 □自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 2處	114年11月~114年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1. 未確認施工工期，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成	
16	114-16	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣湖西鄉潭邊村供水改善工程		湖西鄉公所	□台電 ■自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	管溝寬度0.6m~1m L=450m	竣工	預計114年4月進場	照案通過		解除列管
17	114-17	澎湖縣政府 土木科	白沙鄉通梁社區道路安全及人行道空間建置計畫		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計114/10/8完工		照案通過		
18	114-18	澎湖縣政府 警察局	監視系統裝設	1. 大賢、文學路口 2. 朝陽、林森路口	澎湖縣政府/ 馬公市公所	■台電 □自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視		1. 過禁挖施作 2. 施作完畢		照案通過	1. 大賢、文學路口遇禁挖範圍不能施作 2. 朝陽、林森路口，照案通過	
19	☆114-2-1	國土管理署 南區工程署	澎湖馬公市西文里社會住宅計畫道路開闢工程	文學路、文城三路	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 □澎湖有線電視	W= 8 m L= 155 m	預計115.01~115.09				
20	☆114-2-2	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程	樹德路(中華路-民族路)-440M 忠孝路-72M 中正路-72M 治平路-52M	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■後備指揮部		預計114年11月進場	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。			
21	☆114-2-3	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程	中山路-50M 民福路-180M 仁愛路-85M 治平路-52M	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115下半年度	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。			
22	☆114-2-4	澎湖縣政府 土木科	澎13號2K-4K路面改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計114年11月進場	發包中			

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	第1次決議	配合事項	
23	☆114-2-5	澎湖縣政府 土木科	115年度鄉道改善工程	文光路及重光社區	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計115年3月進場				
24	☆114-2-6	澎湖縣政府 土木科	115年度鄉道改善工程第二標	五福路(文光路至全家)	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計115年6月進場				
25	☆114-2-7	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計114年10月30日進場	發包中			
26	☆114-2-8	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路急需改善工程（第二標）		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計114年11月進場	新設水溝			
27	☆114-2-9	澎湖縣政府 土木科	114年度望安鄉將軍及東吉村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計114年11月30日進場	預計發包			
28	☆114-2-10	澎湖縣政府 土木科	114年度桶盤村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		預計115下半年度	道路加封，管線要配合			
29	☆114-2-11	澎湖縣政府 土木科	114年度鳥嶼村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計115上半年度	書圖簽中			

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	第1次決議	配合事項	
30	☆114-2-12	澎湖縣政府 土木科	115年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	📍 1-1.陽明路(民族路-光復路) 📍 1-2.文光路84巷(文光路-光復路) 📍 3-1.文光東一橫巷 📍 3-2文光路126巷(文光路-貿商... 📍 4-1.三多路370巷(文光路-光復... 📍 4-2.文光路135巷(文光路-光復... 📍 4-3.文光路101巷 📍 5-1.自立路(忠孝路-信義路) 📍 5-2.信義路(明遠路-陽明路) 📍 5-3.忠孝路77巷(勵志二村-民... 📍 6-1.貿商街(光榮公園-光榮街) 📍 6-2.光榮街(貿商街-三多路) 📍 6-3.朝陽路(貿商街-光復路) 📍 6-4.光榮公園北側道路 📍 7.樂群街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115上半年度	配合下水道科工程 辦理刨鋪			
31	☆114-2-13	澎湖縣政府 土木科	116年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	📍 1-1.文光全聯前道路 📍 1-2.三多公園南側道路 📍 1-3.三多公園東側道路 📍 1-4.文光倉庫前道路 📍 2-1.文光路168巷-東西向 📍 2-2.文光路162巷 📍 2-3.文光路168巷-南北向 📍 2-4.三多路390巷 📍 3-1.自強街 📍 3-2.成功街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計116上半年度	配合下水道科工程 辦理刨鋪			
32	☆114-2-14	工務處下水道科	115年度雨水下水道改善工程	西文工業區及鎖港	澎湖縣政府/ 馬公市公所	☐ 台灣固網 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	長69m、寬1.5m	預計115年1月~114年12月	下水道箱函改善			
33	☆114-2-15	工務處下水道科	澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程(114年度後續擴充)	自立路、信義路、文光路、澎湖23鄉道部分路段	澎湖縣政府/ 馬公市公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	道路連接管 L=286m	預計114年底進場	污水用戶接管			
34	☆114-2-16	西嶼鄉公所	外垵村道路挖掘改善工程	1. 外垵村29-1號至外垵7-11前巷道。	西嶼鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	w=管溝寬度 0.4m~0.6m、 L=348.1m	預計115年度	尚未發包			
35	☆114-2-17	西嶼鄉公所	西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程	1. 竹灣大義宮旁澎2段大斜坡、南甲福德廟旁道路。 2. 橫礁意象旁往橫礁漁港道路。	西嶼鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年度	尚未發包			
36	☆114-2-18	西嶼鄉公所	114年鄉道及村里道路養護工程(開口契約)	1. 內垵國小旁道路2. 合界7-11旁交叉入口3. 大池外站涼亭旁小路4. 池東福德宮旁小路5. 大池明興花枝丸旁路6. 竹灣星月灣對面交叉道路	西嶼鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		114年2月~114年12月				

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	第1次決議	配合事項	
37	☆114-2-19	澎湖縣後備指揮部	中正營區污水下水道銜接工程	樹德路	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信	壓力管 W= 2m L= 30m	114/8/22-114/11/4	污水人孔編號PB4515		函文114/10/30完工	
38	☆114-2-20	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M1-M2人孔提升及降埋	204縣道8K+911~9K+171	公路局澎湖工務段	■台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.8 m L= 1.8 m 2處	114年11月~114年12月	人孔開孔點檢			
39	☆114-2-21	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	114年度人孔直路接頭檢測計畫 (孔蓋調升檢測)	海埔路、新生路、新店路等部分鄰近路段	澎湖縣政府	■台電、 ☐ 自來水公司、 ☐ 中華電信、 ☐ 澎湖有線電視	孔蓋調升40處	預計 114年10-12月				新生路禁挖至114/12 大賢街禁挖至116/12
40	☆114-2-22	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	興炭段桿線下地工程	興仁社區加水站以北	馬公市公所	■台電、 ☐ 自來水公司、 ☐ 中華電信、 ☐ 澎湖有線電視		預計 114年10-12月				公所確認有無刨鋪或預計刨鋪
41	☆114-2-23	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	115年度饋線改善工程	縣道205線及周邊區域	澎湖縣政府 馬公市公所	■台電、 ☐ 自來水公司、 ☐ 中華電信、 ☐ 澎湖有線電視	孔蓋調升28處	預計 115年01-06月				完工後請下地，如不下地請評估減量留重要孔蓋
42	☆114-2-24	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村汰換管線工程	西嶼鄉竹篙灣村	工務段/西嶼鄉公所	☐ 台電 ■自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=8921m	預計115年度				203縣道禁挖至115/3 大義宮旁(澎2)公所計畫刨鋪
43	☆114-2-25	台灣固網股份有限公司	馬公市四維路、後窟潭管道埋設工程	四維路、敬業街、後窟潭	澎湖縣政府/ 馬公市公所	■台灣固網 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	長38m. 寬0.6m	預計114年9月~114年12月	光纜佈放			四維(進共管)、敬業禁挖至116/5月底 後窟潭縣府預計115年上半年度進場

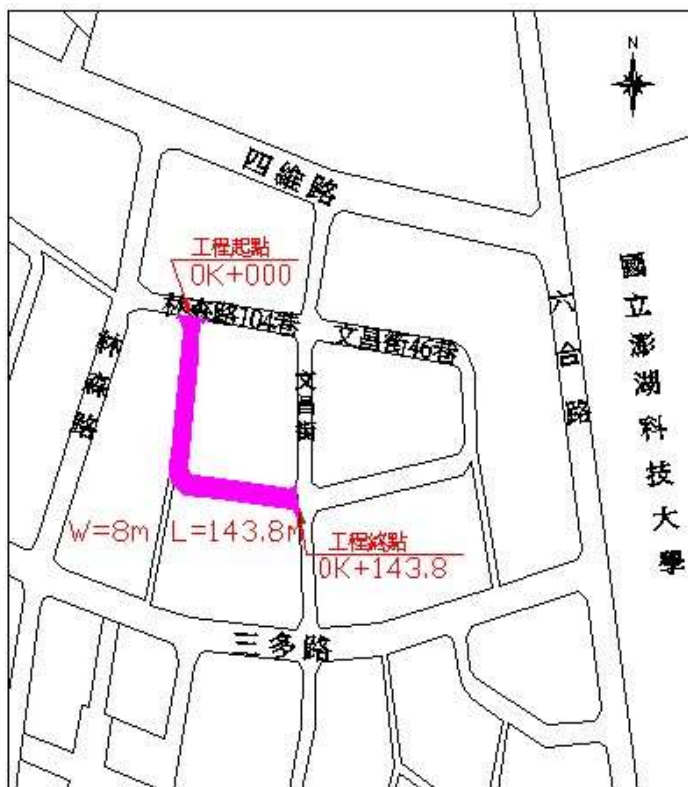
113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
113-01、02	202 縣道 7K+150-7K+900(澎湖郵局~澎湖古棗味) 204 縣道 3K+800-4K+100(縣道擇要路面修復工程-興仁~烏坎) 204 縣道 7K+120-7K+690(隘門) 提案單位： 公路局 澎湖工務段	  

113-09

澎湖縣馬公市機三北側 8 米計畫道路開闢工程

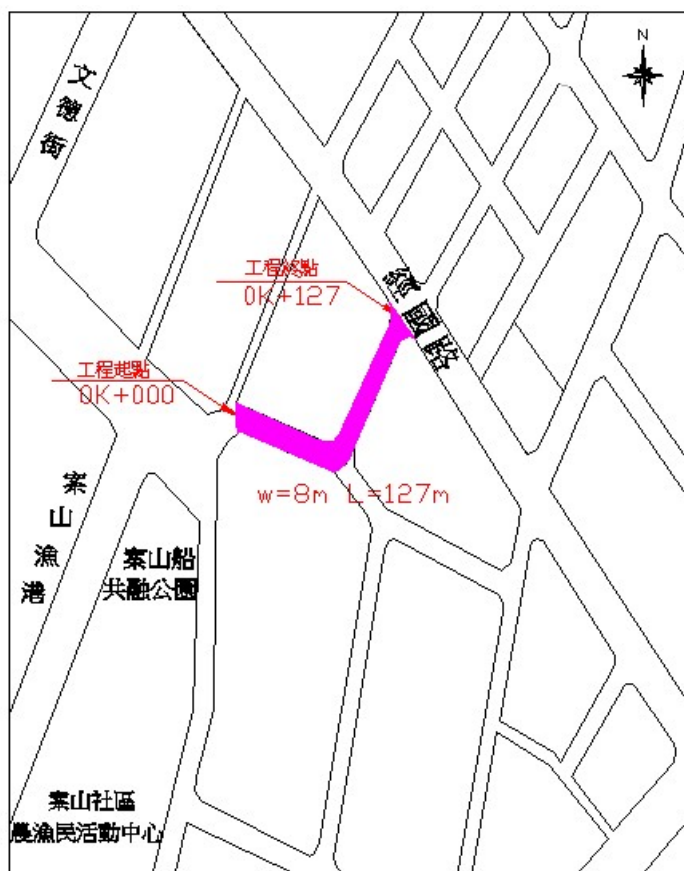
提案單位：
國土管理署
南區工程署

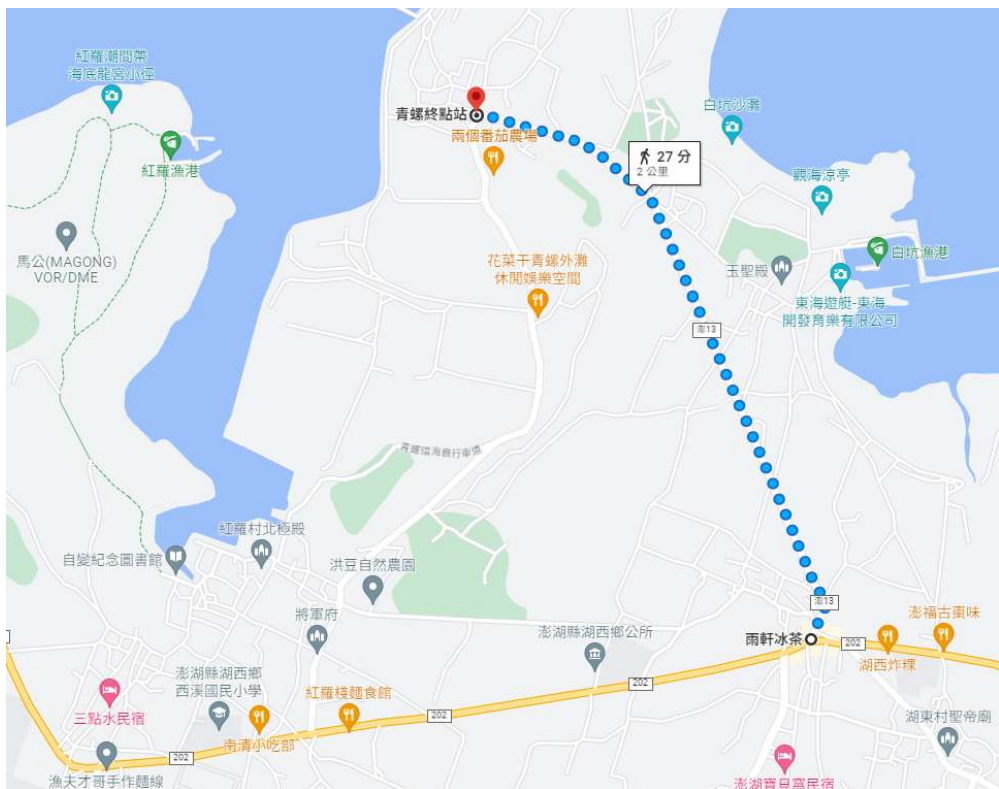
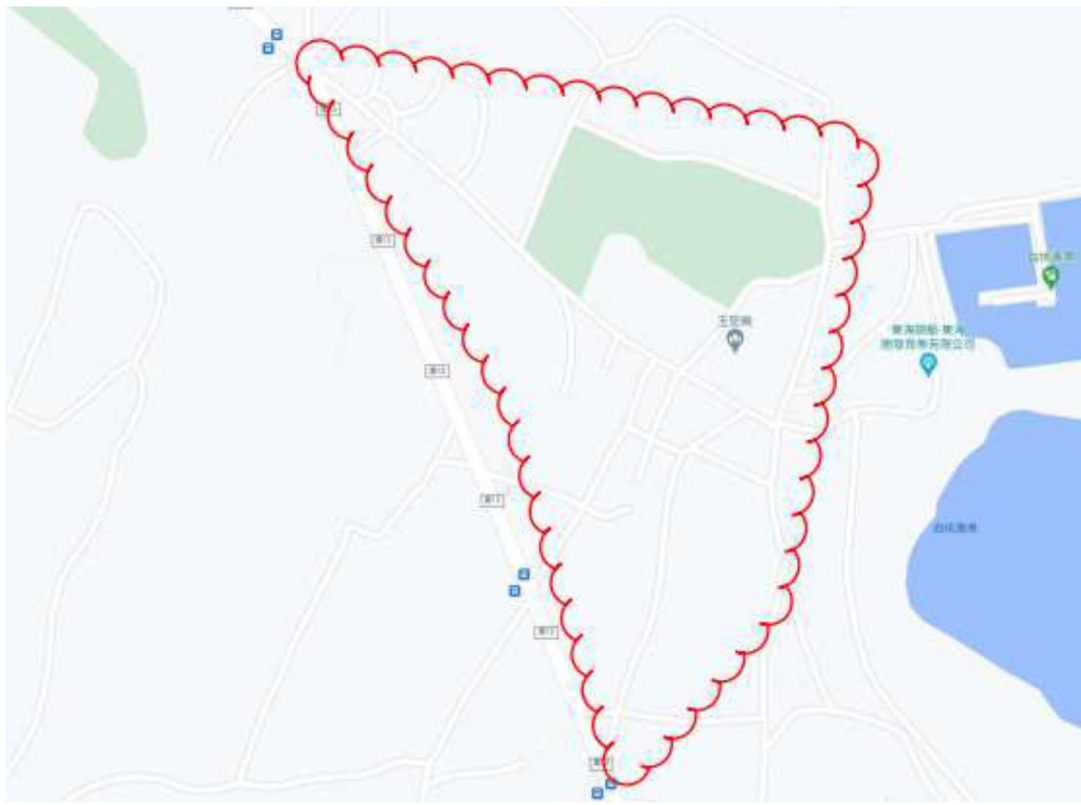


113-10

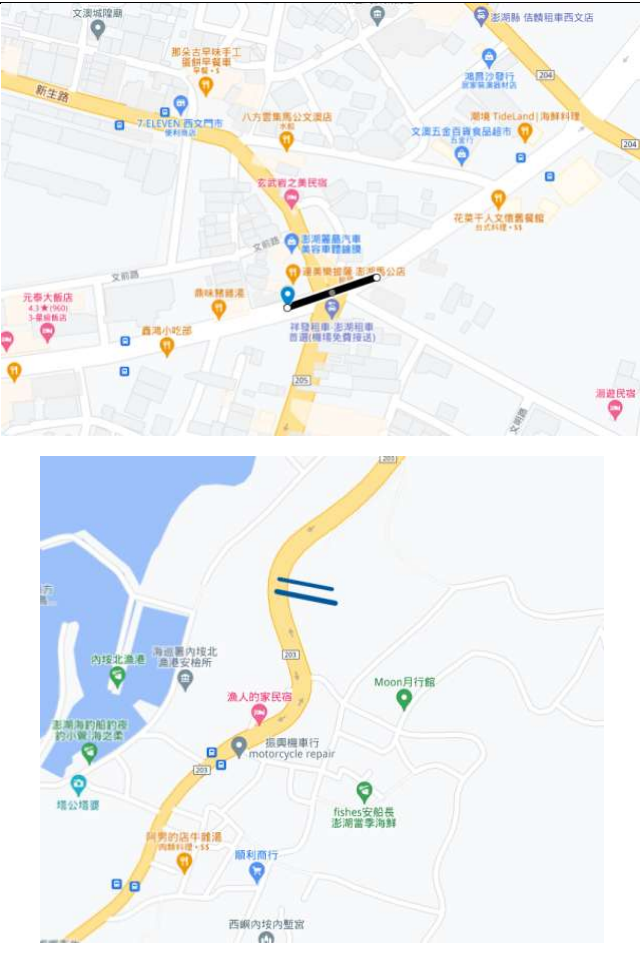
澎湖馬公市案山段 8 米計畫道路開闢計畫

提案單位：
國土管理署
南區工程署



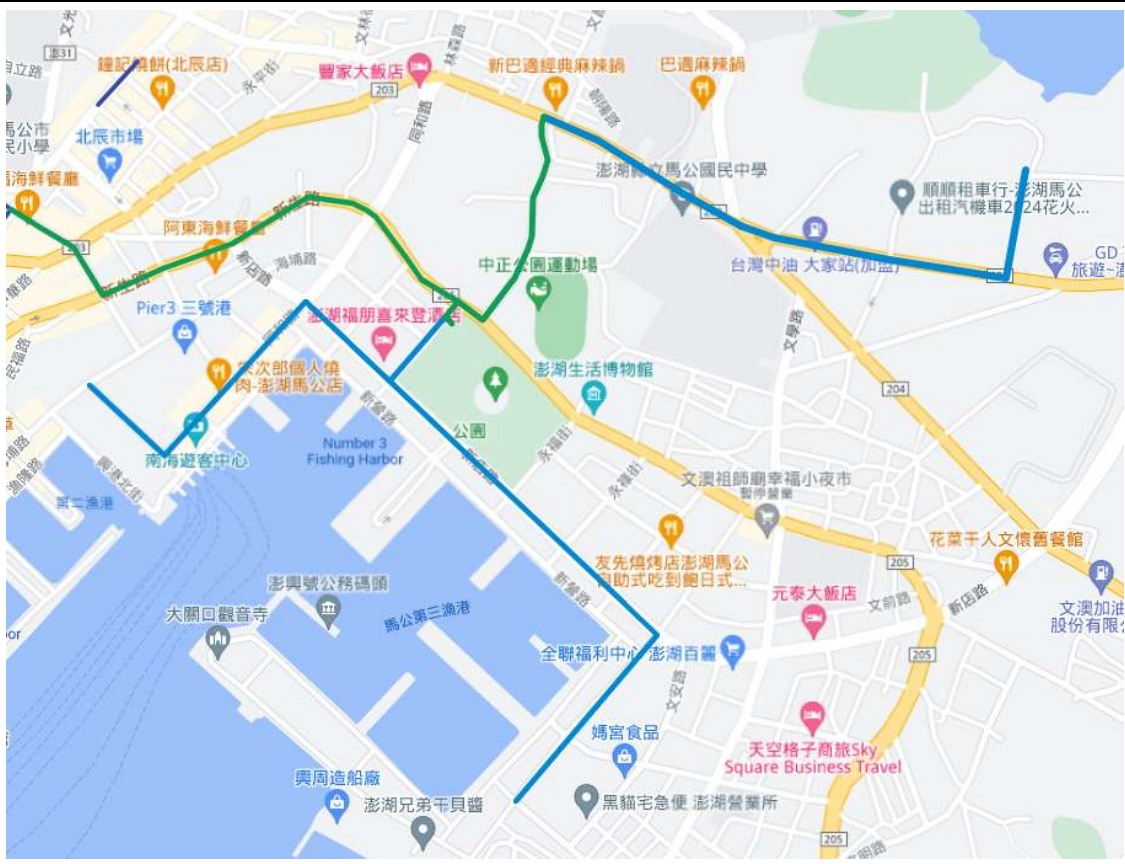
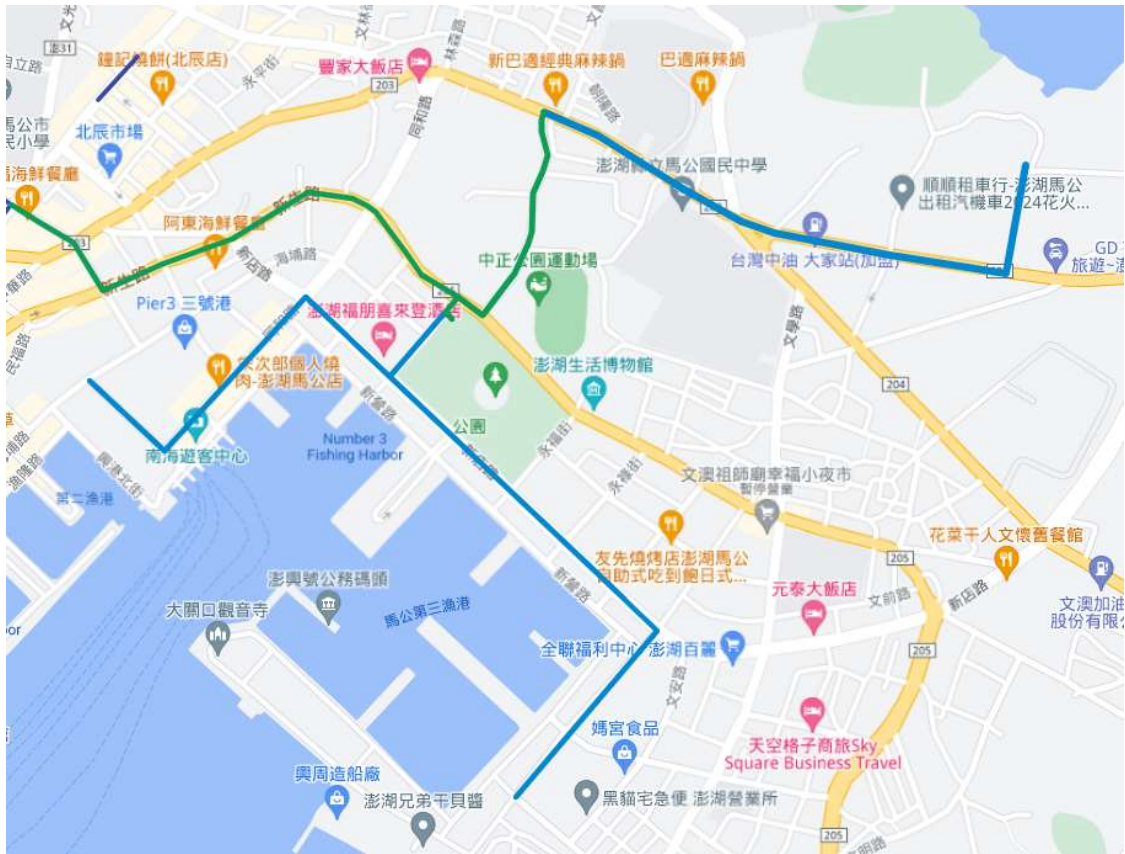
編 號	位 置	圖
113-11 澎 13 線 0K+000~2K+ 200 提案單位： 澎湖縣政府 土 木 科		
113-39 白坑村(社 區)架空線 路地下化預 埋管路工程 提案單位： 臺灣電力股 份有限公司 澎 湖 區 處		

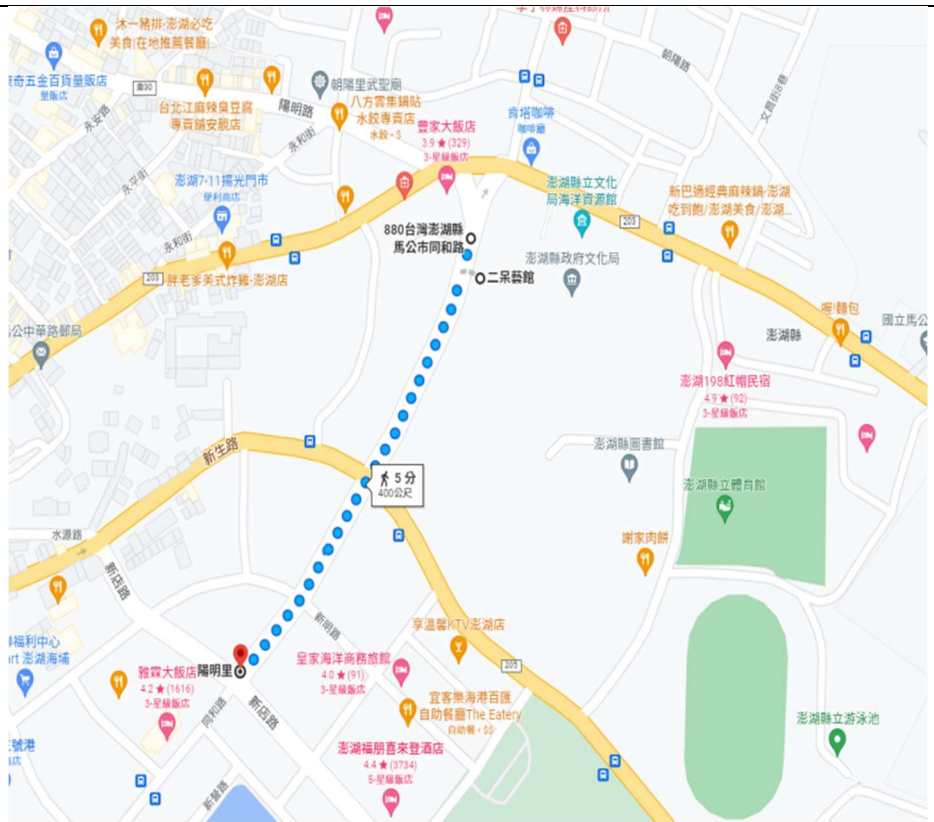
	位 置 圖
113-40 七美鄉平和村線路改善預埋管路工程 提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處	
113-42 烏坎海淡廠送白沙淨水場清水管工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處	

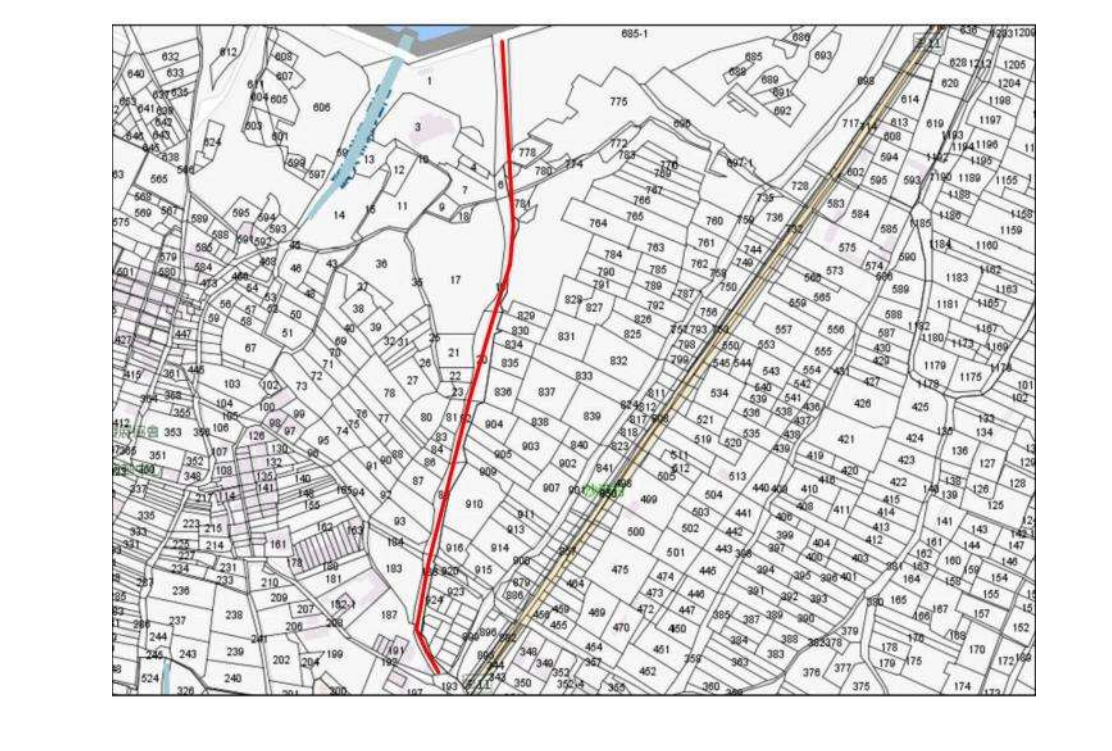
編號	位置	圖
113-43 澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所		
113-50 澎湖所配水管線遷改工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處		

編號	位置	圖
113-55 「澎 20 線道路拓寬工程（烏坎-隘門）」 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	A map showing the proposed widening of Penghu 20th Road from Wukan to Aimeng. The road is highlighted in yellow. Various landmarks and businesses are marked with icons and labels, including '澎湖機場停車場', '澎湖免稅商店', 'Urda 悠達驅動電動共享車', '博明國際租賃有限公司', '宏泰租車行-機場店', '金耐斯小客車租賃有限公司(機場站)', '立達營造', '澎湖縣流浪動物收容中心', '烏坎洪幸任古宅', '阿霜小吃部', '啟發租車行', '劉正港檸檬汁隘門店', '海的女兒民宿', '澎湖金沙灘 臨海人', '隘門沙灘機車停車場', '隘門沙灘', '隘門潮間帶', '澎湖林投鳳凰殿', '林投公園', '及林春咖啡館(林投店)', and '忠靈祠'. A scale bar indicates 25 minutes walking distance (2.2 km).	
113-57 114 年度村里道路改善工程-第二標 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	An aerial map showing the proposed road improvement project in Huxi Township. The project area is outlined in yellow. The map includes labels for '湖西鄉', '龍門社區活動中心', '龍門社區發展協會', '龍門社區公園', and '龍門社區發展協會'. A scale bar indicates 2077.87 m.	



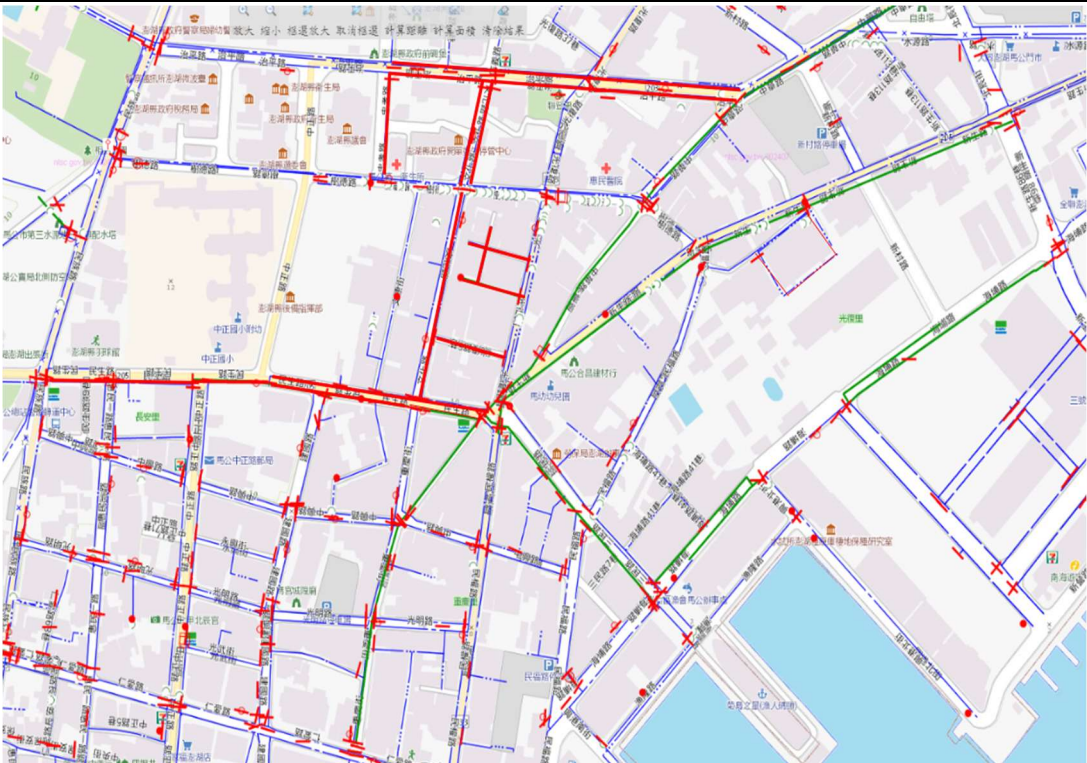
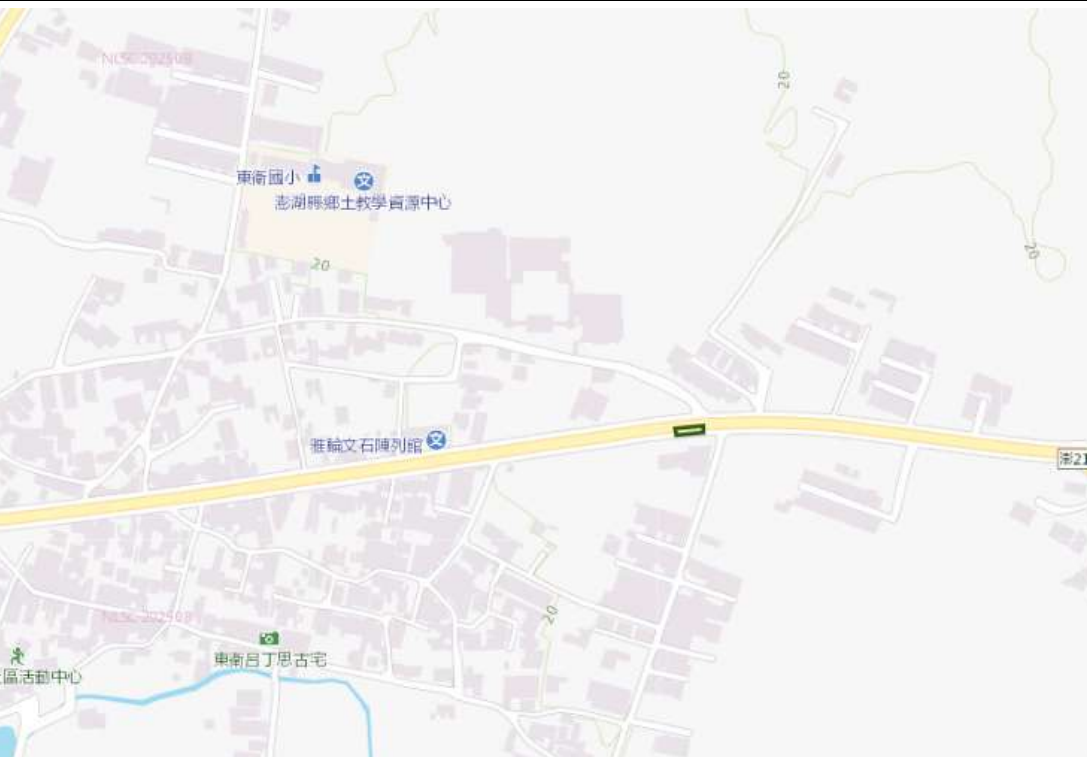
編號	位置	圖
113-58 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主次幹管工程第一標(藍色路段) 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		
113-59 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1 揚水站及壓力管工程(綠色路段) 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

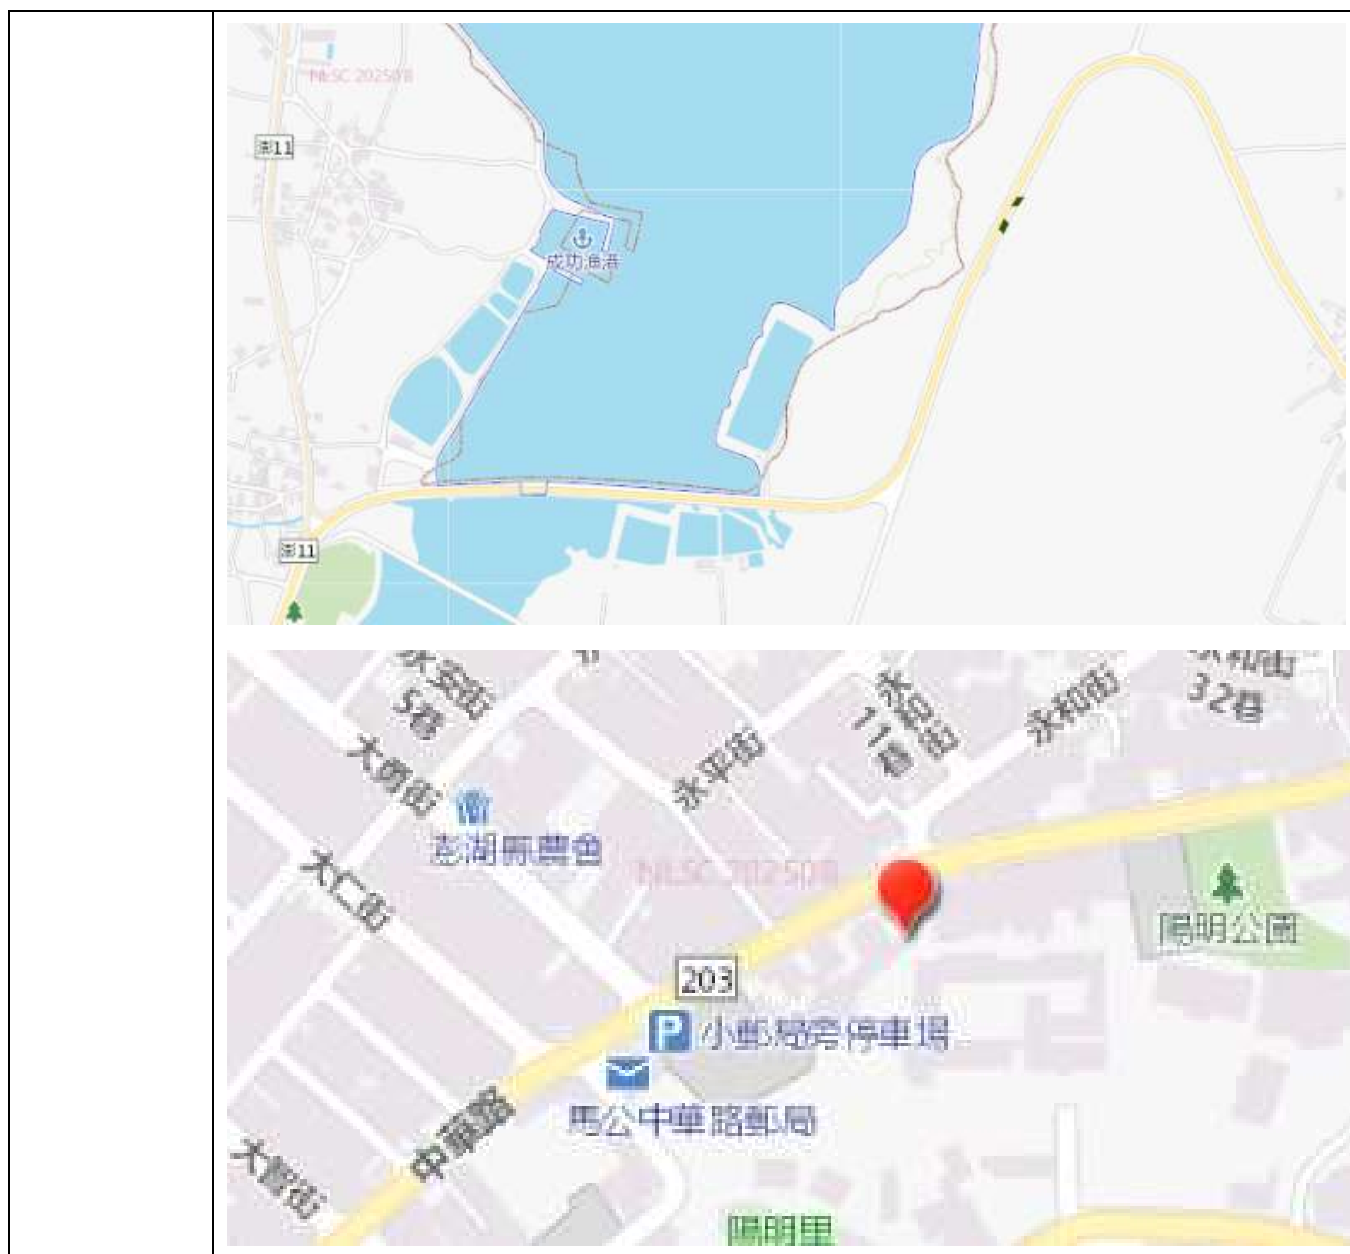
編號	位置	圖
113-60 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標 (Ca)(紅色路段) 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		
113-61 114 年度雨水下水道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

編號	位置	圖
113-62 馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程 提案單位： 澎湖縣政府建設處		
113-64 湖西鄉道路改善工程第 6 標 (沙港國小至中西生命紀念館改善工程) 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		

編號	位置	圖
113-64 湖西鄉道路改善工程第 6 標 (南北寮漁港道路改善工程) 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		
113-65 114 年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程 潭邊村 85 號至 2-11 號宅路段 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		

編 號	位 置	圖
113-2-2 小赤村管線挖掘道路鋪面改善工程 提案單位： 白沙鄉公所		
113-2-5 澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所		

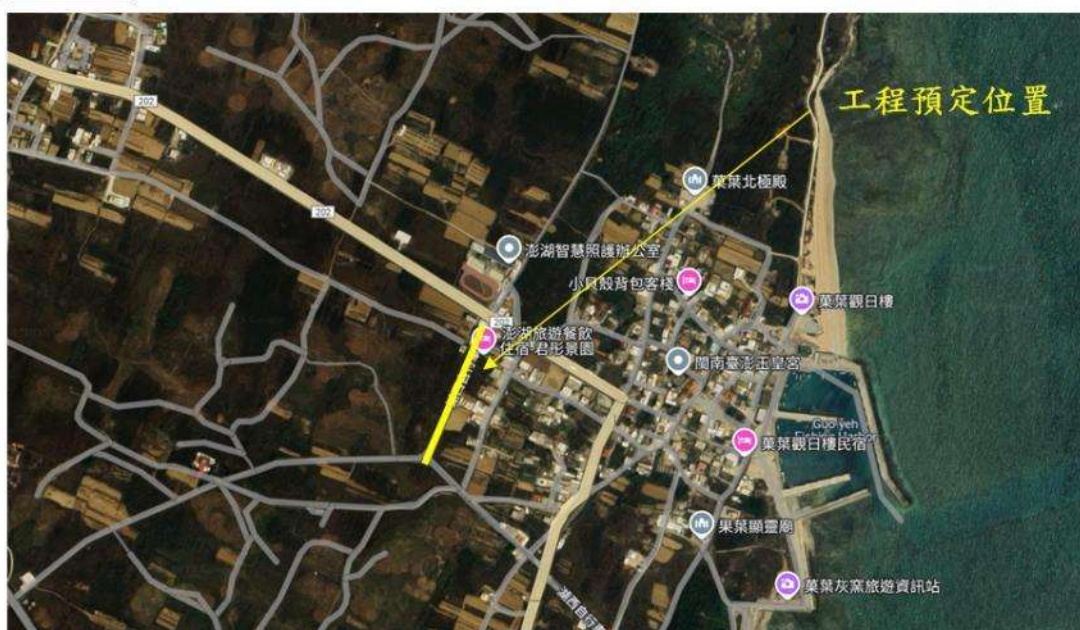
編號	位置圖
113-2-10 澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程 提案單位： 自來水公司	
113-2-12 台灣中油 6 吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證 提案單位： 台灣中油澎湖營業處 湖西供油服務中心	

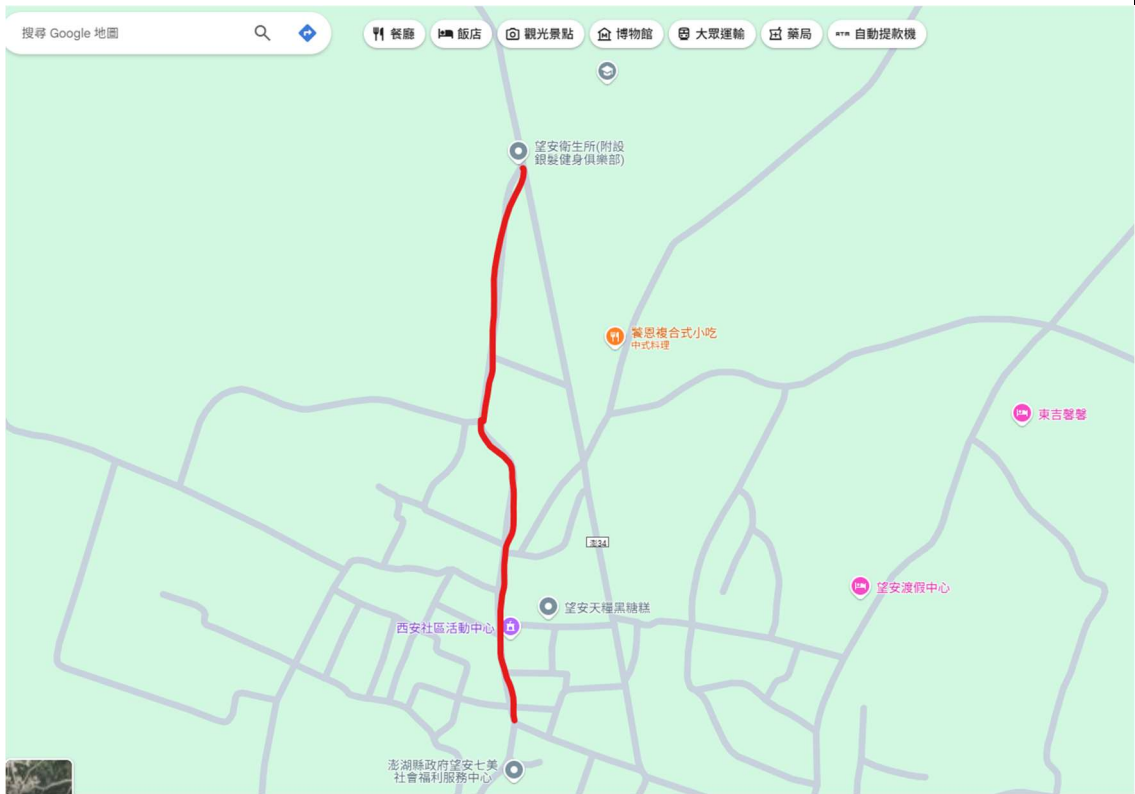


114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置	圖
114-1 澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-8 114 年度湖西鄉農路改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 湖西鄉公所		

農澎湖 022

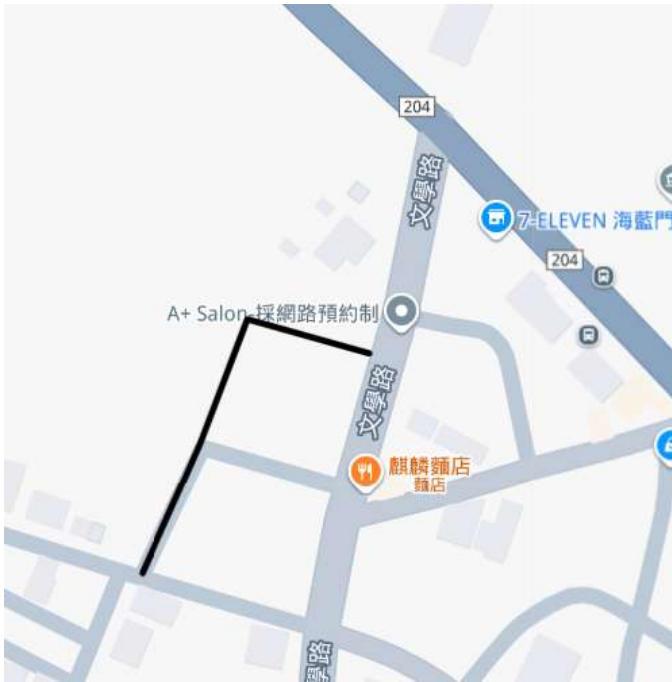


編號	位置圖
114-9 西安村人行 環境暨路口 改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 望安鄉公所	 The map shows a red line indicating the project location in Wang'an Township, Penghu County. The line runs vertically through the center of the map. Key landmarks and locations marked on the map include: - 望安衛生所(附設銀髮健身俱樂部) (Wang'an Health Center (with Silver Hair Fitness Club)) - 養恩複合式小吃 中式料理 (Yang'en Composite Snacks Chinese Cuisine) - 東吉醫器 (Dongji Medical Instruments) - 望安天樞黑糖糕 (Wang'an Tianmu Black Sugar Cakes) - 望安社區活動中心 (Wang'an Community Activity Center) - 澎湖縣政府望安七美社會福利服務中心 (Penghu County Government Wang'an Qimei Social Welfare Service Center) - 望安渡假中心 (Wang'an Vacation Center)

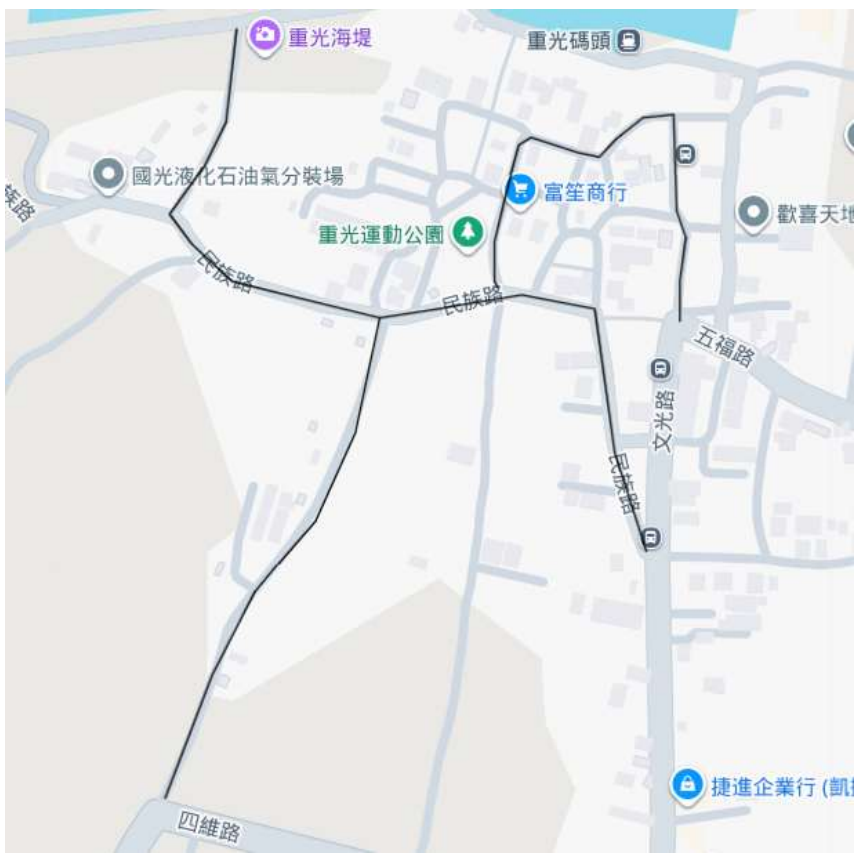
編號	位置
114-11 69kV 澎湖~馬公紅白線 M41 人孔提升及降埋 提案單位：台電嘉南供電區營運處	
114-12 69kV 澎湖~馬公紅白線 M36~M40 人孔提升及降埋 提案單位：台電嘉南供電區營運處	

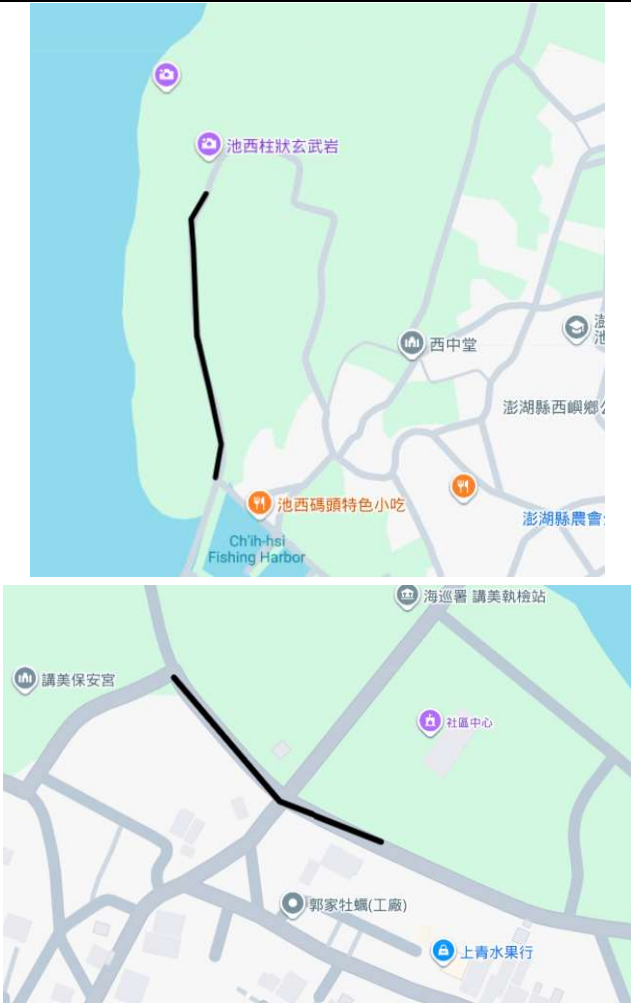
編號	位置	圖
114-13 69kV 澎湖~馬公紅白線 M10-M12 人孔提升及降埋 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 澎湖縣 編號 P11059004 行政區 澎湖縣 路別名稱 紅白線 預定年限 112年01月01日 實際年限 112年12月31日 辦理原因 二級昇降工程	
114-14 69kV 澎湖~馬公紅白線 M22-M23 人孔提升及降埋 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 編號 P11059004 行政區 馬公市 路別名稱 紅白線 預定年限 112年01月01日 實際年限 112年12月31日 辦理原因 二級昇降工程	

編號	位置	圖
114-17 白沙鄉通梁社區道路安全及人行道空間建置計畫 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-18 監視系統裝設 提案單位： 澎湖縣政府 警察局		

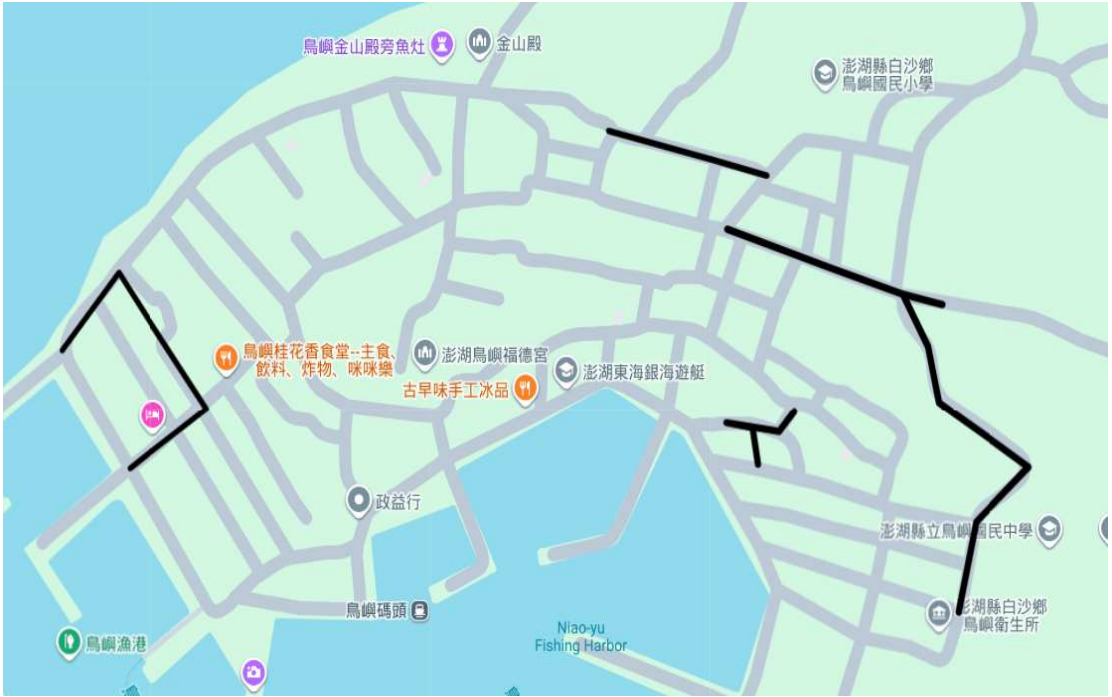
編 號	位 置	圖
114-2-1 澎湖馬公市 西文里社會 住宅計畫道 路開闢工程 提案單位： 國土管理署 南區工程署		
114-2-2 澎湖縣馬公 市區樹德路 及議會周邊 人行空間改 善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

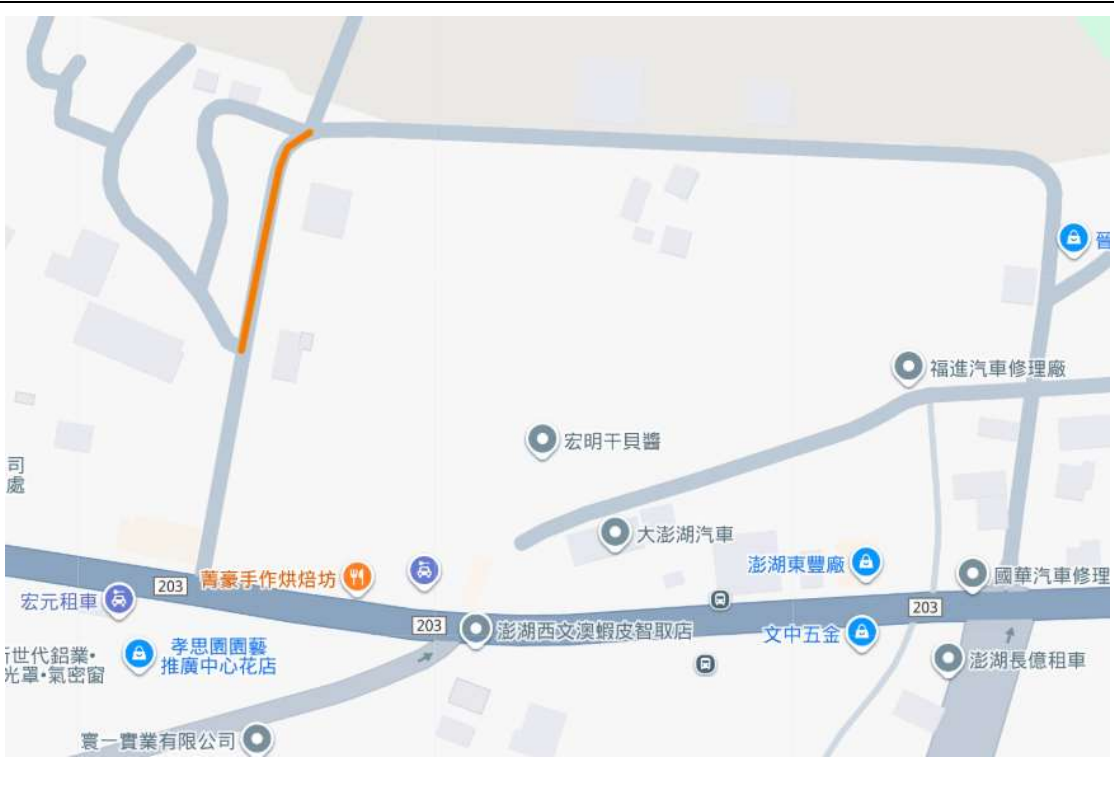
編號	位置圖
114-2-3 澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	
114-2-4 澎 13 號 2K-4K 路面改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	

編 號	位 置	圖
114-2-5 115 年度鄉道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-6 115 年度鄉道改善工程 第二標 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編 號	位 置	圖
114-2-7 114 年度村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-8 114 年度村里道路急需改善工程 (第二標) 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編 號	位 置	圖
114-2-9 114 年度望安鄉將軍及東吉村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-10 114 年度桶盤村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編號	位置	圖
114-2-11 114 年度鳥嶼村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-12 115 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編號	位置	圖
114-2-13 116 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-14 115 年度雨水下水道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

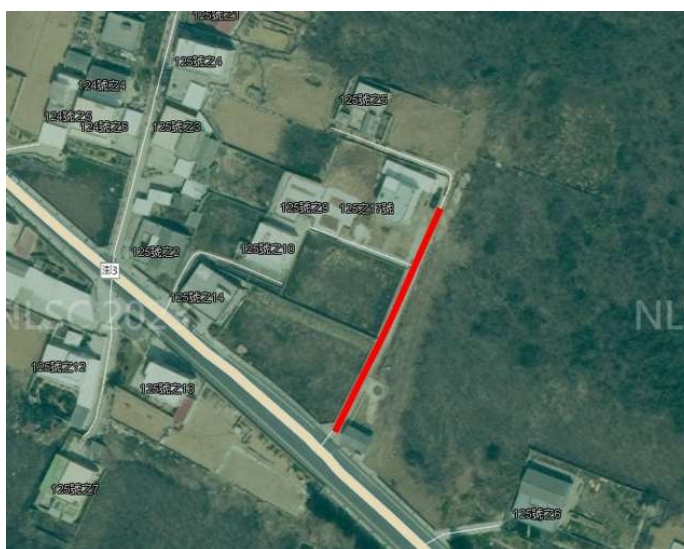
編號	位置	圖										
114-2-15 澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程(114年度後續擴充) 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	 											
114-2-16 外垵村道路挖掘改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所	 A段工程概要說明: 1.水溝新設污水管長合計共118m。 2.新設陰井每5m設置1組;共計23組。 3.既有PC鋪面打除,重新鋪設共250.5m²。 4.新設鋪面厚度為15cm。  B段工程概要說明: 1.水溝新設污水管長合計共49.7m。 2.新設陰井每5m設置1組;預計9組。 3.既有PC鋪面打除,重新鋪設共86.5m²。 4.新設鋪面厚度為15cm。  C段工程概要說明: 1.水溝新設污水管長合計共118.8m。 2.新設陰井每5m設置1組;預計23組。 3.既有PC鋪面打除,重新鋪設共278.4m²。 4.新設鋪面厚度為15cm。  D段工程概要說明: 1.水溝新設污水管長合計共61.6m。 2.新設陰井每5m設置1組;預計12組。 3.既有PC鋪面打除,重新鋪設共115.6m²。 4.新設鋪面厚度為15cm。 施工平面圖 WTS **承辦商於施工前,應確實丈量配合現場尺寸,高程及位置施作(±3%誤差範圍)** <table><tr><td>澎湖縣西嶼鄉公所</td><td>工程名稱</td><td>外垵村道路挖掘改善工程</td><td>圖序</td><td>03</td></tr><tr><td></td><td>圖名</td><td>施工平面圖、工程概要說明</td><td>圖號</td><td>3-1</td></tr></table>	澎湖縣西嶼鄉公所	工程名稱	外垵村道路挖掘改善工程	圖序	03		圖名	施工平面圖、工程概要說明	圖號	3-1	
澎湖縣西嶼鄉公所	工程名稱	外垵村道路挖掘改善工程	圖序	03								
	圖名	施工平面圖、工程概要說明	圖號	3-1								

編號	位置	圖
114-2-17 西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程 提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所		
114-2-18 114 年鄉道及村里道路養護工程（開口契約） 提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所	內垵國小旁道路 	

合界 7-11 旁交叉路口



大池外站涼亭旁小路



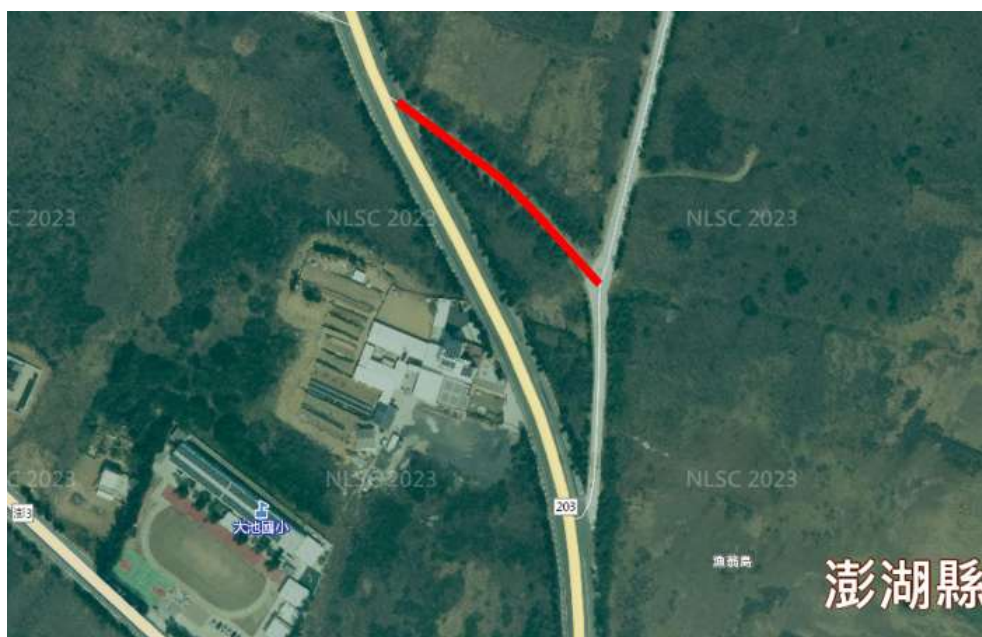
小池角福德宮旁小路



大池品興花枝丸旁



竹灣星月灣對面交叉道路



編號	位置圖
114-2-19 中正營區污水下水道銜接工程 提案單位： 澎湖縣後備指揮部	
114-2-20 69kV 澎湖~馬公紅白線 M1-M2 人孔提升及降埋 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	

編號	位置	圖
114-2-21 114 年度人孔直路接頭檢測計畫 提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處		
114-2-22 興崁段桿線下地工程 提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處		

編號	位置	圖
114-2-23 115 年度饋線改善工程 提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	 115 年度饋線改善工程 ● 改善用戶用電可靠度 ● 減少饋線路徑迂迴降低線路損失 ● 調升高壓人孔 28 處	
114-2-24 澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處		

編號	位置	圖
114-2-25 馬公市四維路、後窟潭管道埋設工程 提案單位： 台灣固網股份有限公司		
