

澎湖縣 115 年度「路面管線工程協調小組」 第 2 次協調會議議題與宣導配合事項

壹、道路挖掘管理事宜

一、路證審核單位：

1. 本府工務處：縣道 201、202、204、205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
2. 公路局澎湖工務段：縣道 203。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。

如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

二、辦理道路挖掘之單位，如有挖損其他單位管線情形，應即時通知相關單位辦理現場會勘及後續處理，不得隱匿或延誤通報。

三、申請道路挖掘單位，應督促廠商確實依規定辦理，施挖道路時應知會當地警察機關。

四、施工範圍之交通維持措施及警示作業注意事項，請各單位妥善控管：

- (一)如需逆向通行，務必派員於現場引導指揮，並應於轉彎處前適當設置三角錐等警示設施，以提醒用路人注意，避免過彎後發生碰撞。
- (二)如因車道狹小致車輛無法通行，應於路口適當位置設置改道指引標誌，並於每日施工退場前巡視道路通行狀況，必要時應鋪設鐵板供車輛通行，以確保施工期間道路維持安全及順暢通行。

五、臨時路權(使用道路，但無挖掘事實)與道路挖掘許可證屬不同申請事項，請各單位釐清後依規申請。於道路範圍內進行挖掘或施工，均應向路權單位申請許可，經核准後始得施作。

貳、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

一、如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位

亦應依程序核發路證。

二、因應國土署政策要求圖資正確性，自 115 年 8 月 1 日起申請之案件，申報完工所需圖資及相關資料均應完整填報於系統；經通知仍無法補正者，將依「澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例」規定辦理裁罰。

三、本府預訂 115 年 11 月份辦理公共管線系統功能操作教育訓練，請各單位務必派員參加(實際使用者及承辦人員務必參加)。

參、道路修復費用支用情形

一、各鄉市公所 113-115 年度提報經縣府核定之工程，尚未辦理完成者，請於今年度報府核銷結案。

工程名稱	單位	核定經費	經費科目
(114) 五德威靈宮前道路改善工程	馬公市公所	1,921,254	委辦費
115 年度白沙鄉管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉公所	2,050,000	獎補助費
外垵村道路挖掘改善工程	西嶼鄉公所	1,911,573	獎補助費
西嶼鄉道路鋪面改善工程	西嶼鄉公所	6,800,000	獎補助費
七美鄉道路鋪面改善工程	七美鄉公所	10,000,000	獎補助費
115 年度馬公市道挖改善工程(第三標)	馬公市公所	2,545,000	獎補助費
115 年度馬公市道挖改善工程(第 1 標)	馬公市公所	6,622,200	獎補助費
115 年度馬公市道挖改善工程(第 2 標)	馬公市公所	8,403,400	獎補助費

二、各鄉市公所提報之 116 年度經費施作工程，請儘速於本年度內檢具預算書圖及相關資料報府辦理核定。

單位	核定經費	經費科目
馬公市公所	6,000,000	獎補助費
湖西鄉公所	9,000,000	獎補助費
白沙鄉公所	16,000,000	獎補助費
七美鄉公所	10,000,000	獎補助費

肆、其他配合事項：

一、本會議宗旨係協調各路權及管線單位預計施作之道路工程，使其相關單位能配合期程及相關作業，路權單位應當表率，確實提供資料，以利其他單位配合。

二、為配合各項活動及考試期間之交通與環境需求，請各相關單位於該期間內配合辦理道路禁挖措施，停止挖掘道路及含道路範圍內各項施工行為。

時間	活動名稱	主辦單位	禁挖範圍
115/10/17	115 學年度各項考試	財團法人大學入學考試中心基金	澎科大周圍
115/11/1	2026 菊島澎湖跨海馬拉松	澎管處	活動路線
115/11/22-29	115 年地方公職人員選舉	中央選舉委員會	全縣
115/12/12	115 學年度各項考試	財團法人大學入學考試中心基金會	澎科大周圍
116/1/22-24	115 學年度各項考試	財團法人大學入學考試中心基金	澎科大周圍
116/4/11	2027IRONMAN Penghu 國際鐵人三項賽	澎湖縣政府教育處	活動路線
116/4/24-25	116 學年度統一入學測驗	財團法人技專校院入學測驗中心基金會	待定
116/7/10-11	115 學年度各項考試	財團法人大學入學考試中心基金	澎科大周圍

三、於危險管線（如中油、高壓電）路段施工前，請各單位務必通知所屬管線單位辦理會勘確認管線位置，以避免誤挖。

伍、施工路段協調

一、113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表(附件 1)。

二、113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目施工位置圖檔(附件 2)。

三、各單位施工位置路段彙整於

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1b6jY8zBt5aQxPShKfjhYuJd4KxJo_Qw&usp=sharing

陸、臨時動議

一、白沙鄉公所：近期自來水公司於赤崁及通樑地區辦理管線汰換工程，現場

部分管線埋設深度疑有不足情形，請自來水公司督促施工廠商確實依規定辦理，並加強埋設深度查核。後續本所道路刨鋪施工倘因管線埋深不足致發生挖損情形，相關責任及衍生費用將由自來水公司負責。

二、馬公市公所：88 麵店旁道路預計於 116 年下半年度辦理改善工程，請各相關單位預先評估管線預埋需求，儘早規劃辦理，並於工程施作前配合完成。

柒、會議決議

一、有關本次會議討論事項、宣導事項及臨時動議中兩公所所提意見，請各相關單位配合辦理。

二、本次會議共協調路面工程計 31 案(115 年度第 1 次會議保留提案 3 案，本次新增 28 案)，各案會議決議詳如彙整表，請各路權及管線單位遵照預計期程辦理，本次未提報及未與會說明之計畫型案件不予受理核准，請於下一次會議提出審議。

三、考量觀光旺季期間部分道路挖掘案件延後施工，後續恐有案件集中施作情形，請各單位於施工前加強協調，提前辦理施工公告，並完善交通維持及安全措施，以減少對交通及民眾通行之影響，共同維護用路人安全。

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度 及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名 稱	配合之管 線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議及配合 事項	114年度第2次決議及 配合事項	115年度第1次決議及配合 事項
1	~~113-11~~	澎湖縣政府 土木科	澎13線鄉道改善工程	湖西至青螺社區(0K+000-2K+200)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=8m、 L=2200m	~~7月28日開工~~ ~~目前施工中~~ 預計115年7月份完工	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		
2	113-39	臺灣電力股 份有限公司 澎湖區處	白坑村(社區)架空線路 地下化預埋管路工程	澎13號線部分~白坑社區	湖西鄉公所	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W= 0.6m, L=2,000m	施工中 預訂115年11月-116年 1月完工	1.原預計 113年4月-10月 2.延至預訂 114年4月-10月	照案通過 1.後續澎13線倘未能配合 縣府期程(113-11)將撤案		
▲3	113-40	臺灣電力股 份有限公司 澎湖區處	七美鄉平和村線路改善 預埋管路工程	七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機 場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮 風味餐旁	七美鄉公所	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	w=0.6m, L=1,600m	施工中 預計115年10月~115年 12月完工	已部分完工，本案修 正之施工範圍如工程 位置圖。	照案通過 1.公所同意本案施作 2.請公所納入115年度創鋪 (基金專款專用)	公所同意延期	1.公所同意延期施作 2.請公所於完工後納入116 年度創鋪(基金專款專用)
▲4	~~113-43~~	台灣自來水 公司第七區 管理處澎湖 營運所	澎湖湖七美鄉平和村汰 換管線工程	汰換平和村頂茄埕、下茄埕與九孔生 態園區等區域管線汰換	七美鄉公所	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	w=0.6m、 ~~L=5,600m~~	~~進場施工中預計115年 5月完工~~	已完工解除列管	照案通過 1.公所同意本案施作 2.請公所納入115年度創鋪 (基金專款專用)		
5	113-55	澎湖縣政府 土木科	「澎20線道路拓寬工程 (烏坎-隘門)」		澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	W=m, L=1869m	施工中 115/9水溝及共管進場	已召開設計協調會	照案通過		
6	113-58	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下 水道系統第二期工程-主 次幹管工程第一標	1.同和路-新店路-文德路 2.203縣道(文化局-華勇預拌廠前)	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視	短管推進 L=3,700m	114年6月2日開工	原定114年~115年度	照案通過 請召開管線協調會		
7	~~113-59~~	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下 水道系統第二期工程-P1 揚水站及壓力管工程	~~1.國際廣場-體育園區道路-中華路口~~ ~~2.國際廣場-新生路-新村路~~	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	壓力管 ~~L=1,440m~~	~~預計116下半年度~~	改至115年度提報資 料	照案通過 請召開管線協調會		
8	~~113-60~~	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下 水道系統第二期工程-分 支管網及用戶接管工程 第一標(Ca)	~~新店路以北、中華路以南~~	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	短管推進 L=3,499m	~~預計117年初~~	改至115年度提報資 料	照案通過 請召開管線協調會		
9	113-61	澎湖縣政府 下水道科	114年度雨水下水道改善 工程	同和路-中華至新生	澎湖縣政府	台電、 自來水公司、 中華電信、 澎湖有線電視 警察局	W=m L=300m	114/9/17開工，目前 停工，115/9月復工， 預計116/2完工	同和路雨水下水道箱 涵頂板改善工程	照案通過 請召開管線協調會		
10	113-62	澎湖縣政府 建設處	馬公市台電舊電廠內計 畫道路開闢工程	預計辦理民福路接至海埔路管線連接 新設	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W=11m L=99.4m	114年9月8日申報開工 工期270日曆天 目前建置停車場，後 續施作道路部分，預 計115/10完工	道路開闢工程後續擴 充程序刻正簽辦中， 未來將於道路工程施 作路基前將通知中華 電信及台電公司埋設 管線。	照案通過 請召開管線協調會		
11	113-2-5	台灣自來水 公司第七區 管理處	澎湖縣白沙鄉赤崁村/通 樑村管線汰換工程		公路局 澎湖工務段 /白沙鄉公 所	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	w=0.6~1m L=14200m	115/5進場		照案通過 部分路段公所112年度前瞻 計畫已施作完成，屬三年 禁挖，遇禁挖路段不施作	1.113-2-6通樑村併 案。 2.請與公所協調施工 範圍及回填方式	通樑村縣府已施作完成部 分屬三年禁挖，遇禁挖路 段不施作
12	113-2-10	台灣自來水 公司第七區 管理處	澎湖縣馬公市民生治平 路等管線汰換工程	民生路、文化路、忠孝路、治平路等 路段	馬公市公所 /澎湖縣政 府/公路局 澎湖工務段	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=1839m	目前剩民生路，民族 路至中正路3月底完成 ，中正路至光復路口 (雙側)115/9開始施作		1.文化路，撤案 2.忠孝路、民生路、治平 路，照案通過		1.施作前一禮拜請發布訊 息 2.請自來水公司於115年底 前完成，請管理機關納入 116年度改善工程，並於4 月底前完成

澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議及配合事項	114年度第2次決議及配合事項	115年度第1次決議及配合事項
1	114-1	澎湖縣政府土木科	澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程	中正、永安橋	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視		預計115/11中開工	9/24評選	照案通過 請召開管線協調會		
2	114-9	望安鄉公所	西安村人行環境暨路口改善工程	望安衛生所至西安村活動中心路段	望安鄉公所	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W=5 m, L= 537 m	預計115/4完工	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		
3	114-11	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖-馬公紅白線M41人孔提升及降埋	海埔路上快樂渡假村南路口	馬公市公所	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 1處	114年11月-114年12月 115年2月-115年12月	撤案，無道路開挖	保留提案 1. 未確認施工期程，延至下一次會議決議 2. 請於114年底發包，115/4前施作完成	照案通過	請於115年9月進場施作
4	114-18	澎湖縣政府警察局	監視系統裝設	1. 大賢、文學路口 2. 朝陽、林森路口	縣政府/馬公市	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視		1. 預計115年度下半年度 2. 施作完畢	已完工解除列管	1. 大賢、文學路口過禁挖範圍不能施作 2. 朝陽、林森路口，照案通過		
5	114-2-1	國土管理署南區工程署	澎湖馬公市西文里社會住宅計畫道路開闢工程	文學路、文城三路	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視	W= 8 m L= 155 m	115/7/27開工，預計116/4/22完工			保留提案 請於設計階段邀集管線單位協調配合（三大管線務必配合）	照案通過 1. 請主辦單位召開施工前管線協調會 2. 因是開闢道路，請三大管線確實評估及配合預埋管(台電：會配合預埋、台水：目前無計畫，再與主辦單位討論、中華電信：納共管、汙水：無計畫)
6	114-2-2	澎湖縣政府土木科	澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程	樹德路(中華路-民族路)-440M 忠孝路-72M 中正路-72M 治平路-52M	澎湖縣政府	台電 自來水 中華電信 澎湖有線電視 後備指揮部		預計115/11底完工	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。	照案通過 請召開管線協調會		
7	114-2-3	澎湖縣政府土木科	澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程	中山路-50M 民福路-180M 仁愛路-85M	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視		設計中，預計115下半年度	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。	照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合		
8	114-2-5	澎湖縣政府土木科	115年度鄉道改善工程	文光路及重光社區	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視		預計115年4月進場	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		
9	114-2-6	澎湖縣政府土木科	116年度鄉道改善工程	五福路(文光路至全家)	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視		預計116年進場	改至115年度提報案件管制	照案通過 請召開管線協調會		下水道、自來水工程請儘速配合
10	114-2-7	澎湖縣政府土木科	114年度村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視			已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		
11	114-2-8	澎湖縣政府土木科	114年度村里道路急需改善工程（第二標）	講美、池西	澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視			已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		
12	114-2-9	澎湖縣政府土木科	114年度望安鄉將軍及東古村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	台電 自來水公司 中華電信 澎湖有線電視		預計115年4月進場	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會		

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工工期	說明	114年度第1次決議及配合事項	114年度第2次決議及配合事項	115年度第1次決議及配合事項
13	114-2-10	澎湖縣政府土木科	114年度桶盤村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		細部設計中 預計115下半年度	改至115年度提報案件管制		照案通過 請召開管線協調會	
14	114-2-11	澎湖縣政府土木科	114年度烏嶼村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		115/1開工 預計115/12完工			照案通過 請召開管線協調會	
15	114-2-12	澎湖縣政府土木科	115年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約(後續擴充)	文光路101、135、370巷	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計115/11/20進場			照案通過 請召開管線協調會	
16	114-2-13	澎湖縣政府土木科	116年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	📍 1-1.文光全聯前道路 📍 1-2.三多公園南側道路 📍 1-3.三多公園東側道路 📍 1-4.文光倉庫前道路 📍 2-1.文光路168巷-東西向 📍 2-2.文光路162巷 📍 2-3.文光路168巷-南北向 📍 2-4.三多路390巷 📍 3-1.自強街 📍 3-2.成功街	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計116上半年度	配合下水道科工程辦理刨鋪		照案通過 請召開管線協調會	
17	114-2-14	澎湖縣政府下水道科	115年度兩水下水道改善工程	西文工業區及鎖港	澎湖縣政府/馬公市公所	☐ 台灣固網 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	長69m→寬1.5m	預計115年1月~115年12月	拆案，改至115年度提報案件管制		照案通過	
18	114-2-15	澎湖縣政府下水道科	澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程(114年度後續擴充)	自立路、信義路、文光路、澎23鄉道部分路段	澎湖縣政府/馬公市公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	道路連接管 L=286m	預計114年底進場	已完工解除列管		照案通過	
19	114-2-16	西嶼鄉公所	外垵村道路挖掘改善工程	1.外垵村29-1號至外垵7-11前巷道。	西嶼鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	w=管溝寬度 0.4m~0.6m→L=348.1m	預計115下半年度	改至115年度提報案件管制		照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合	
▲20	114-2-17	西嶼鄉公所	西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程	1.竹灣大義宮旁澎2段大斜坡、南甲福德廟旁道路。 2.橫礁意象旁往橫礁漁港道路。	西嶼鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計115下半年度	設計完成，尚未發包		照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合	115-2-16自來水重複
21	114-2-20	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖-馬公紅白線M1(微創)-M2人孔提升及降埋	204縣道8K+911-9K+171	公路局澎湖王務段	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=1.6 m L=1.6 m 2處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	改至115年度提報案件管制		照案通過	請於115年9月進場施作
22	114-2-24	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村汰換管線工程	西嶼鄉竹篙灣村	王務段/西嶼鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m→ L=8921m w=0.6m~1m→ L=6844m	流標準備退回修正中 預計115年度	203縣道禁挖至115/3大義宮旁(澎2)公所計畫刨鋪施工範圍重新修正再送圖簽核 改至115年度提報案件管制		照案通過(除禁挖路段，請與公所確認範圍)	

澎湖縣轄區內115年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	115年度第1次決議及配合事項	115年度第2次決議及配合事項
1	~~115-1~~	澎湖縣政府 土木科	縣道擇要路面修復工程	<del>1. 202縣道7K+150~7K+900(郵局~澎湖古棗味)</del> <del>2. 204縣道7K+120~7K+600(隘門)</del>	澎湖縣政府	~~■台電~~ ~~■自來水~~ ~~■中華電信~~ ~~■澎湖有線電視~~ ~~■警察局~~	~~1. W=16、L=750~~ ~~2. W=12、L=570~~		~~拆案至115-2-1~~	照案通過 請召開管線協調會	
2	115-2	澎湖縣政府 土木科	115年度縣道改善工程	203縣道 32K+500~34K+200 202縣道0K+000~0K+500	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		已發包，預計10月開工		照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合	請自來水及台電工程儘速配合期程內完成
3	~~115-3~~	澎湖縣政府 土木科	115年度市區改善工程	<del>1. 貿商街(光榮公園~光榮街)</del> <del>2. 光榮街(貿商街~三多路)</del> <del>3. 朝陽路(貿商街~光復路)</del> ~~4. 光榮公園北側道路~~ ~~5. 樂群街~~	澎湖縣政府	~~■台電~~ ~~■自來水~~ ~~■中華電信~~ ~~■澎湖有線電視~~		預計115/3/31開工	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會	
4	115-4	澎湖縣政府 土木科	115年度村里道路改善工程	前寮、烏坎、鎮港、重光	馬公市公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年12月完工	目前剩前寮工區，台電正辦理配合作業	照案通過 請召開管線協調會	
▲5	115-5	澎湖縣政府 土木科	115年度村里道路急需改善工程	南寮、西溪、白坑、 鐵線	湖西鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		設計中 預計115年10月底進場		照案通過 請召開管線協調會	
6	115-6	澎湖縣政府 土木科	桶盤村里道路改善工程	桶盤	馬公市公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		細部設計中 預計115下半年度	自來水管線淺埋，倘有挖損請通知馬公市公所	照案通過 請召開管線協調會	
7	~~115-7~~	澎湖縣政府 土木科	115年度縣道路面改善工程(第2標)	<del>202縣道0K+000~0K+450(雅輪文石館)</del>	澎湖縣政府	~~■台電~~ ~~■自來水~~ ~~■中華電信~~ ~~■澎湖有線電視~~		尚在設計中	併案至115-2	照案通過 請召開管線協調會	
8	115-8	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公市雨水下水道系統MB8幹線改善工程	馬公市石滬廣場	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長70M、寬4M	9/7剛決標 預計115年10月進場		照案通過 請召開管線協調會	
9	115-9	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區第二期光榮系統用戶接管工程第一標	馬公市五福路78巷(含周邊巷道)、61巷(含周邊巷道)、重光活動中心旁、四維路人行道(含周邊巷道)、自強街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		延至116/4.5月發包施作	原預計115年10月進場	照案通過 請召開管線協調會	
▲10	115-10	澎湖縣政府 下水道科	115年度排水改善工程	西嶼鄉外垵村里道路	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長60M、寬1M	預計115年10月底進場		請提供交通管制計畫，確認通行無影響再核准	照案通過 請召開管線協調會
11	115-11	澎湖縣政府 下水道科	光榮水資源回收中心廠外繞流管路改善工程	馬公市民族路	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長5M、寬1M	8/11開工，目前預計10月中旬會進場開挖。		照案通過 請召開管線協調會	
12	115-12	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程	1、湖西43-26號至43-18號道路改善 2、青螺19號至47-1號道路改善 3、成功1-43號至226號道路路面改善 4、潭邊2-11號至東明宮路口及至2-10號道路改善	澎湖縣湖西鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：約500公尺 寬：約3.5~7公尺	停工中-預計115/12結案	農變建請公所確認，積極協調預埋	照案通過 請召開管線協調會	
~~13~~	~~115-13~~	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉農路改善工程	~~1. 編號：農澎湖011~~	湖縣湖西鄉公所	~~■台電~~ ~~■自來水~~ ~~■中華電信~~ ~~■澎湖有線電視~~	~~長：約430公尺~~ ~~寬：約4公尺~~	<del>115年6月~12月</del>	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會	

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	115年度第1次決議及配合事項	115年度第2次決議及配合事項
14	115-14	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉農路改善工程	1. 編號：農澎湖018	湖縣湖西鄉公	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約500公尺 寬：約4公尺	預計115/5/31進場	已完工解除列管	照案通過 請召開管線協調會	
15	115-15	澎湖縣湖西鄉公所	太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程	1、城北村宅19號至21號水溝改善-（全長20M*寬約0.6M） 2. 編號：隘門村宅60-8號 路面改善：（全長35.5M*路寬約3~4M） 3. 編號：隘門村宅108號 路面改善：（全長138M*路寬約2~5M）	澎湖縣湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	1-長：約0.6公尺 寬：約5~7.5公尺 2、3-長：約173.5公尺 寬：約2~5公尺	施工中-預計115/10結案		照案通過 請召開管線協調會	
16	115-16	澎湖縣白沙鄉公所	115年度白沙鄉管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉中屯村	白沙鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約336.5公尺 寬：約3~5公尺	預計115年3月進場	已完工解除列管	照案通過	
▲17	115-17	海軍馬公通信隊	戰備設施工程	205縣道陸軍一支部口至菜園路口段	澎湖縣政府	陸軍一支部	長416.84公尺 寬0.6公尺	預計於115年10月底開工	已召開管線協調會，續於施作時避開相關管線單位管道	保留提案 1. 請先與管線單位辦理會勘確認設施位置 2. 請管理機關納入116年改善工程	照案通過
18	115-18	澎湖縣政府警察局	配合縣道改善工程道路刨鋪地下作業	縣道204線與鳳凰殿岔路口	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		預計115年2月施工	免收路修費	照案通過 請於縣府刨鋪工程前(115-1)完成，請於9月進場施作	
19	115-19	澎湖縣政府警察局	新設號誌埋設管線工程	澎17與縣道204線岔路口	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		取消線路地下挖掘	撤案	1. 澎17部分禁挖至117/10，請勿挖掘施作 2. 其餘部分照案通過，請於9月進場施作	
20	115-20	澎湖縣政府警察局	新設號誌埋設管線工程	縣道203線與四季常照岔路口	公路局 澎湖工務段	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		取消線路地下挖掘	撤案	1. 203縣道部分禁挖至115/8/30 2. 照案通過，俟禁挖期過後，請於9月進場施作	
21	115-21	澎湖縣政府警察局	號誌管線地下工程	縣道204線與縣道201線岔路口(興仁圓環)	澎湖縣政府	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視		施工中，預計9月底前完工	已完工解除列管	照案通過，俟禁挖期過後，請於9月進場施作	
22	115-22	台灣自來水公司第七區管理處	馬公市五福路管線汰換工程	馬公市五福路	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=2300m	預計115年10月進場	馬公市公所：此路段已接獲多次民怨，請各單位儘速於115年度將相關工程辦理完成，116年度將辦理刨鋪	照案通過 請於縣府刨鋪工程前(114-2-6)完成	
23	115-23	台灣自來水公司第七區管理處	湖西鄉204縣配合道路整修管線汰換	湖西鄉204線隘門路口到澎19路口	澎湖縣政府	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=1350m	預計115年10月進場		照案通過 請於縣府刨鋪工程前(115-1)完成，請於9月進場施作	
24	115-24	台灣自來水公司第七區管理處	望安鄉全鄉管線汰換		望安鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=12000m	設計提報中，預計115年10月進場	拆三案辦理，本案取消	照案通過	
25	115-25	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣望安鄉東安村汰換管線工程	西安村、東安村	澎湖縣政府及望安鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=0.6~1m、L=3520M	已發包，預計115年10月進場	原115-24拆案	照案通過	

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	115年度第1次決議及配合事項	115年度第2次決議及配合事項
26	115-26	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣望安鄉西安村汰換管線工程	西安村	望安鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=3907m	已發包，預計115年10月進場	原115-24拆案	照案通過	
▲27	115-27	台灣自來水公司第七區管理處	馬公市三多路、朝陽路管線汰換	三多路、朝陽路、光復路、三民路	馬公市公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=4081m	發包中，預計116/3進場		保留提案	照案通過 分兩階段，於116年4月前未完成部分，請延後至9月續施作
28	115-28	澎湖縣政府土木科	116年度鄉道改善工程	五福路(文光路至全家)	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計116年進場	原114年度提案	照案通過 請召開管線協調會	
29	115-29	澎湖縣政府下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1揚水站及壓力管工程	1. 國際廣場-體育園區道路-中華路口 2. 國際廣場-新生路-新村路	澎湖縣政府	☒ 台電、 ☒ 自來水公司、 ☒ 中華電信、 ☒ 澎湖有線電視	壓力管 L=1,440m	預計116下半年度	原113年度提案	照案通過 請召開管線協調會	
30	115-30	澎湖縣政府下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標(Ca)	新店路以北、中華路以南	澎湖縣政府	☒ 台電、 ☒ 自來水公司、 ☒ 中華電信、 ☒ 澎湖有線電視	短管推進 L=3,499m	預計117年初	原113年度提案	照案通過 請召開管線協調會	
31	115-31	澎湖縣政府下水道科	澎湖縣馬公市雨水下水道系統MD1幹線改善工程	西文工業區道路	馬公市公所	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=2.3m、L=89m	決標保留，預計115年10月進場	原114年度提案	照案通過 請召開管線協調會	
★32	115-2-1	澎湖縣政府土木科	116年度縣道改善工程(第1標)	204縣道6K+800~8K+000	澎湖縣政府	☒ 台電、 ☒ 自來水公司、 ☒ 中華電信、 ☒ 澎湖有線電視		115年底發包 預計116年上半年度進場			照案通過 1. 請召開管線協調會 2. 請與自來水確認配合施作期程
★33	115-2-2	澎湖縣政府土木科	116年度縣道改善工程(第2標)	203縣道31K+000~32K+500	澎湖縣政府	☒ 台電、 ☒ 自來水公司、 ☒ 中華電信、 ☒ 澎湖有線電視		115年底發包 預計116年下半年度進場			照案通過 1. 請召開管線協調會 2. 請與自來水確認配合施作期程
★34	115-2-3	澎湖縣政府土木科	澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊路面改善工程	樹德路(中華路-民族路)-440M 忠孝路-72M 中正路-72M 治平路-52M	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視 ☒ 後備指揮部		預計115/12開工	管線單位配合於115/11月底前完成		照案通過 請召開管線協調會
★35	115-2-4	澎湖縣政府下水道科	115年排水改善工程(第2標)	馬公市石泉里、西嶼鄉赤馬村	馬公市公所 西嶼鄉公所	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	石泉L=70m W=2.4m 赤馬L=87m W=1.4m	設計中，預計116年3月進場			照案通過 請召開管線協調會
★36	115-2-5	澎湖縣政府下水道科	鎖港SF1幹線改善工程	澎25號線	馬公市公所	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	L=350m W=2.5m	設計中，預計116年2月進場			照案通過 請召開管線協調會
★37	115-2-6	澎湖縣湖西鄉公所	湖西北營西側至玉明宮側道路(含廣場)整修工程		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約210公尺 寬：約3~3.5公尺 廣場面積：約340平方公尺	115年10月~116年3月	澎40號鄉道往湖西玉明宮方向210公尺之路口之路面及水溝改善。		照案通過 請召開管線協調會
★38	115-2-7	澎湖縣湖西鄉公所	115年湖西鄉林投村里道路改善工程	202縣道至貝嬭民宿林投活動中心南側周邊道路	湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約620公尺 寬：約2~4公尺	115年10月~116年3月	1、202縣道往貝嬭民宿方向約430公尺之路面及溝面改善 2、林投活動中心南側周邊約190公尺之路面及溝面改善		照案通過 請召開管線協調會

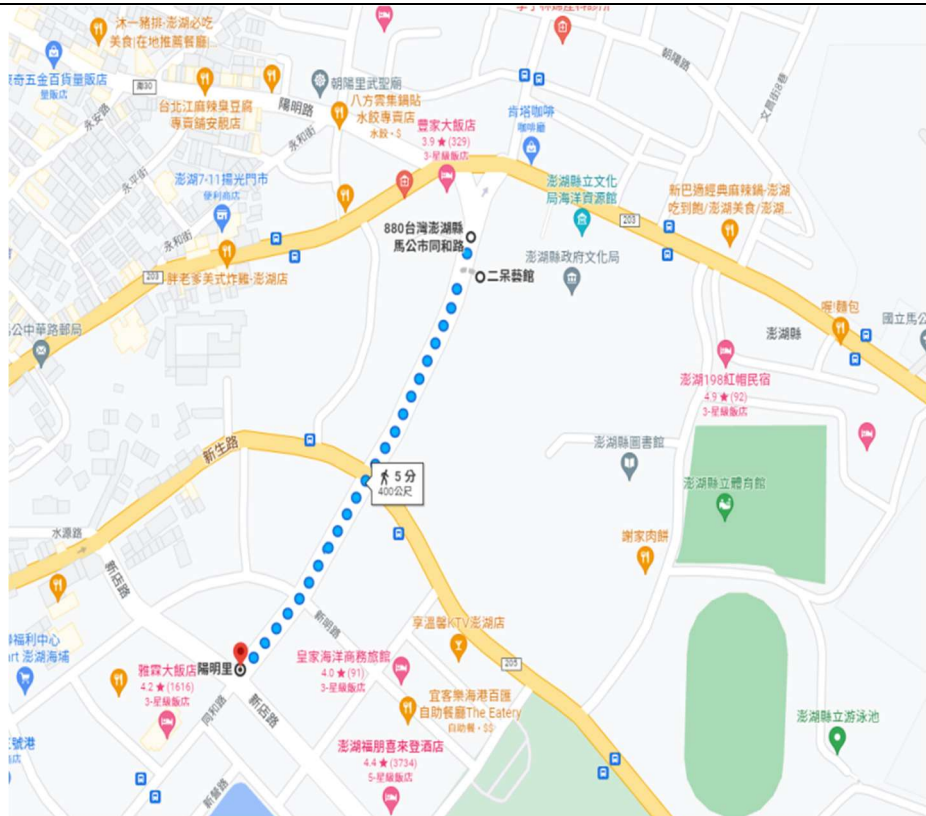
項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	115年度第1次決議及配合事項	115年度第2次決議及配合事項
★39	115-2-8	澎湖縣湖西鄉公所	澎11號鄉道水溝改善工程		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	水溝溝長：約500公尺	115年10月~116年3月	施做澎11號線之沙港派出所至沙港社區及鼎灣監獄旁溝面改善		照案通過 請召開管線協調會
★40	115-2-9	澎湖縣湖西鄉公所	115年度許家至潭邊產業道路新設工程		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約380公尺 寬：約4.5公尺	115年10月~116年3月	開闢許家段280、281、282、54地號之交通用地		照案通過 1. 請召開管線協調會 2. 為新設工程，各單位請評估預埋需求
★41	115-2-10	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖東村道路改善工程		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約260公尺 寬：約2~3公尺	115年10月~116年3月	改善湖東60-2號至36-1號宅路段路面水溝		照案通過 請召開管線協調會
★42	115-2-11	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西童軍露營區道路改善工程		湖西鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水公司 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	長：約40公尺 寬：約3~3.5公尺	115年10月~116年3月	改善湖西92-28號宅往湖西童軍露營區道路40公尺(含新設水溝)		照案通過 請召開管線協調會
★43	115-2-12	澎湖縣白沙鄉公所	116年度白沙鄉赤崁管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉赤崁村里道路	白沙鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		預計116年度	待自來水管線汰換完工後辦理修繕		照案通過 1. 請召開管線協調會，其他單位是否有配合需求 2. 設計發包程序可以預先準備
★44	115-2-13	澎湖縣西嶼鄉公所	內垵國小前道路AC鋪面修繕工程	內垵國小前道路	西嶼鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視	W=7.9~9.9m、L=400m	設計完成、監造發包中，預計115年年底進場			照案通過 1. 請召開管線協調會 2. 台電工程重疊範圍請確認期程
45	115-2-14	澎湖縣西嶼鄉公所	外垵村道路挖掘改善工程	1. 外垵村29號之1至117號宅旁道路 2. 外垵村29號之1至66號之2宅旁道路 3. 外垵村61號至110號之2宅旁道路	西嶼鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		設計完成、發包中	原114年度提案	照案通過 請召開管線協調會	
★46	115-2-15	澎湖縣西嶼鄉公所	外垵村道路修繕工程	1. 外垵村187號之2至179號宅前道路	西嶼鄉公所	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 澎湖有線電視		設計完成、預計115年年底進場			照案通過 請召開管線協調會
★47	115-2-16	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖西嶼鄉竹灣村等汰換管線工程	竹灣村、合界村	西嶼鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=0.6~1m、L=4324M	發包中，預計116年1月進場		與西嶼鄉公所114-2-17重複	照案通過 與西嶼鄉公所重疊範圍請確認期程，並取得核准
★48	115-2-17	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣西嶼鄉203號線(小門-池東)汰換管線工程	西嶼鄉203縣道(小門-池東)	工務段	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W=0.6~1m、L=2520M	提送預算中，預計115年12月進場		26K+500後到115/12/15	照案通過 1. 與縣府115-2重疊範圍請確認期程，未於時間內配合將三年禁挖 2. 與縣府115-2-2重疊範圍請確認期程，儘速配合
★49	115-2-18	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣將軍澳嶼汰換管線工程	將軍村	望安鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、L=3633m	流標修正中，預計116年1月進場			照案通過 請依望安鄉公所實際核准範圍
★50	115-2-19	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖將軍澳嶼新設取水管線工程	將軍村	望安鄉公所	☐ 台電 ☒ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、L=550m	流標修正中，預計115年12月進場			照案通過 請依望安鄉公所實際核准範圍

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	115年度第1次決議及配合事項	115年度第2次決議及配合事項
★51	115-2-20	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M36~M40人孔提升及降埋	新店路	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 5處	115/10~115/12 116年、117年9~12月	人孔開孔點檢		照案通過 本案為每年必要申請，後續會議擬解除列管，系統申請即可
★52	115-2-21	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M25人孔提升	204縣道3K+214	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 1處	115/10~115/12	69kV電纜汰換工程		照案通過
★53	115-2-22	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M11~M12人孔提升	204縣道6K+495、204縣道6K+740	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 2處	115/10~115/12	人孔開孔點檢		照案通過
★54	115-2-23	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M10人孔提升及降埋	204縣道6K+903	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 1處	115/10~115/12	配合縣府刨鋪隘門AC及人孔開孔點檢		照案通過
★55	115-2-24	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M7~M9人孔提升	204縣道7K+168、204縣道7K+418、204縣道7K+668	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 3處	115/10~115/12	配合縣府刨鋪隘門AC及人孔開孔點檢		照案通過
★56	115-2-25	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M2、69kV澎湖~尖山紅白線M1人孔微創開孔檢視	204縣道8K+911、204縣道9K+171	澎湖縣政府	☒ 台電 ☐ 自來水公司 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 2處	115/10~115/12 及116年、117年9~12月	人孔開孔點檢		照案通過 本案為每年必要申請，後續會議擬解除列管，系統申請即可
★57	115-2-26	台灣中油公司澎湖營業處	6吋長途管線穿越箱涵處腐蝕改管	中華路與林森路交叉路口	公路局 澎湖工務段	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=1.5m、 L=50m	預計115年12月進場			保留提案 本案請中油公司召開協調會議，邀集相關單位共同研議，並就施工期間封路範圍、交通維持及相關配套措施預先準備完整資料。
★58	115-2-27	新世紀資通有限公司	湖西鄉204縣埋設管線工程	湖西鄉204線5K+500~5K+900	澎湖縣政府	☐ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=400m	提送設計中，預計116年4月進場			照案通過 請於4月前或9月後施工
★59	115-2-28	臺灣電力股份有限公司澎湖區處	西嶼線路改善工程	西嶼外垵、內垵、赤馬（縣道203線、澎5號線）	澎湖縣政府/ 西嶼鄉公所	☒ 台電 ☐ 自來水 ☐ 中華電信 ☐ 澎湖有線電視	調升人孔40處	預計 115年11月~116年4月完工		203部分路段115/10刨鋪	照案通過 與縣府115~2重疊範圍請確認期程，儘速配合
★60	115-2-29	海軍馬公後勤支援指揮部	供水管路整修工程	205縣道	澎湖縣政府	☒ 台電 ☒ 自來水 ☒ 中華電信 ☒ 陸軍第一地區支援指揮部補給油料庫馬公油料分庫	w=0.6m、 L=1600m	預計115年9月進場		已於115/4/9來文，4/20本府同意	照案通過

113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置	圖
113-39 白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程 提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處		
113-40 七美鄉平和村線路改善預埋管路工程 提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處		

編號	位置	圖
113-55 「澎20線道路拓寬工程（烏坎-隘門）」 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
113-58 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主次幹管工程第一標（藍色路段） 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

編 號	位 置	圖
113-61 114 年度雨水下水道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		
113-62 馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程 提案單位： 澎湖縣政府 建設處		

編 號	位 置
113-2-5 澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營 運 所	

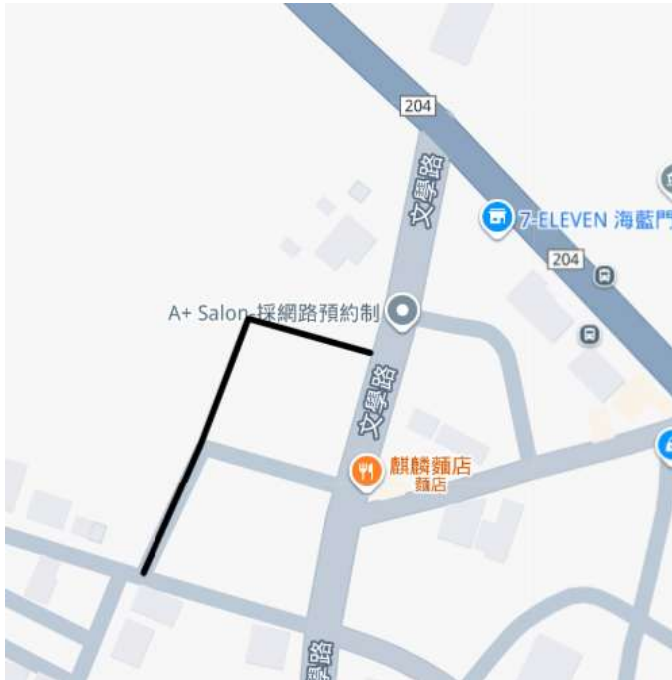
113-2-10

澎湖縣馬公
市民生治平
路等管線汰
換工程

提案單位：
自來水公司



114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

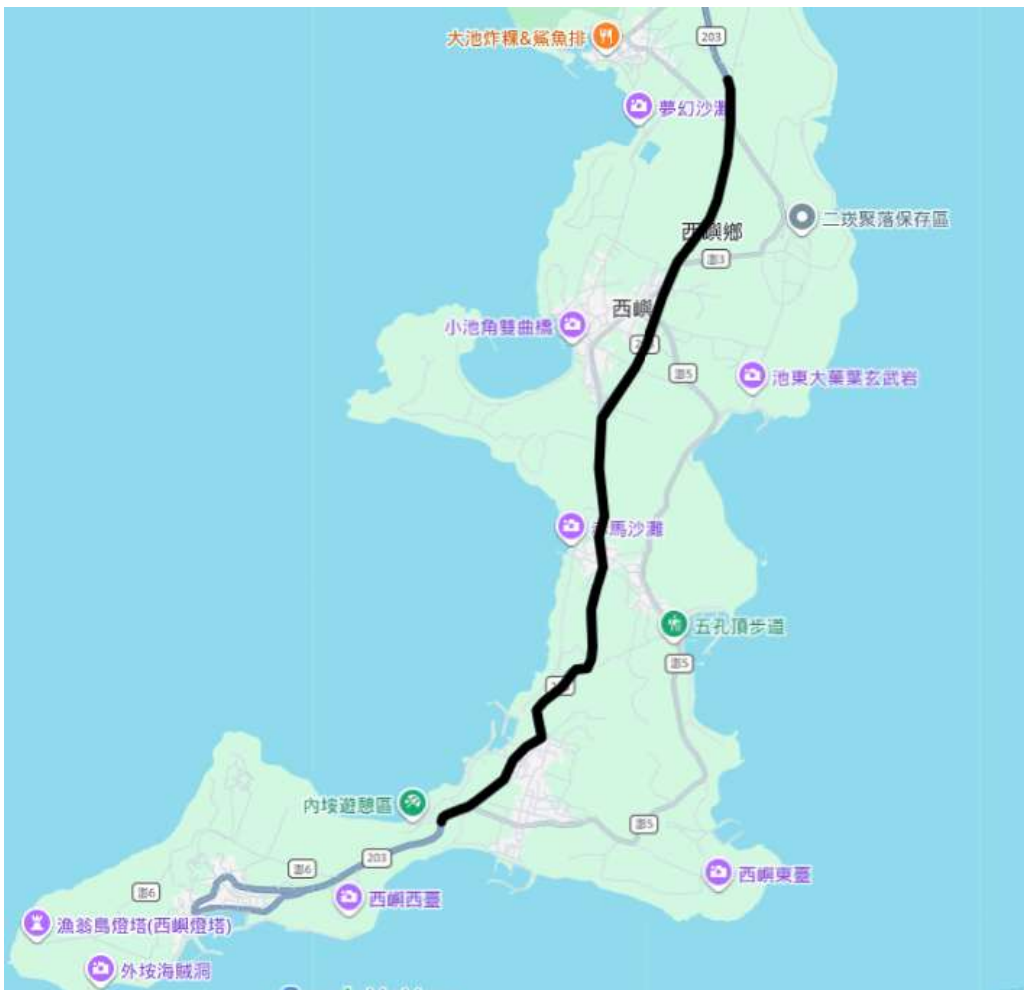
編號	位置	圖
114-1 澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-1 澎湖馬公市西文里社會住宅計畫道路開闢工程 提案單位： 國土管理署 南區工程署		

編號	位置	圖
114-2-2 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-3 澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編號	位置	圖
114-2-11 114 年度鳥嶼村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-12 115 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		

編號	位置	圖
114-2-13 116 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約 提案單位： 澎湖縣政府 土木科		
114-2-17 西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程 提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所		

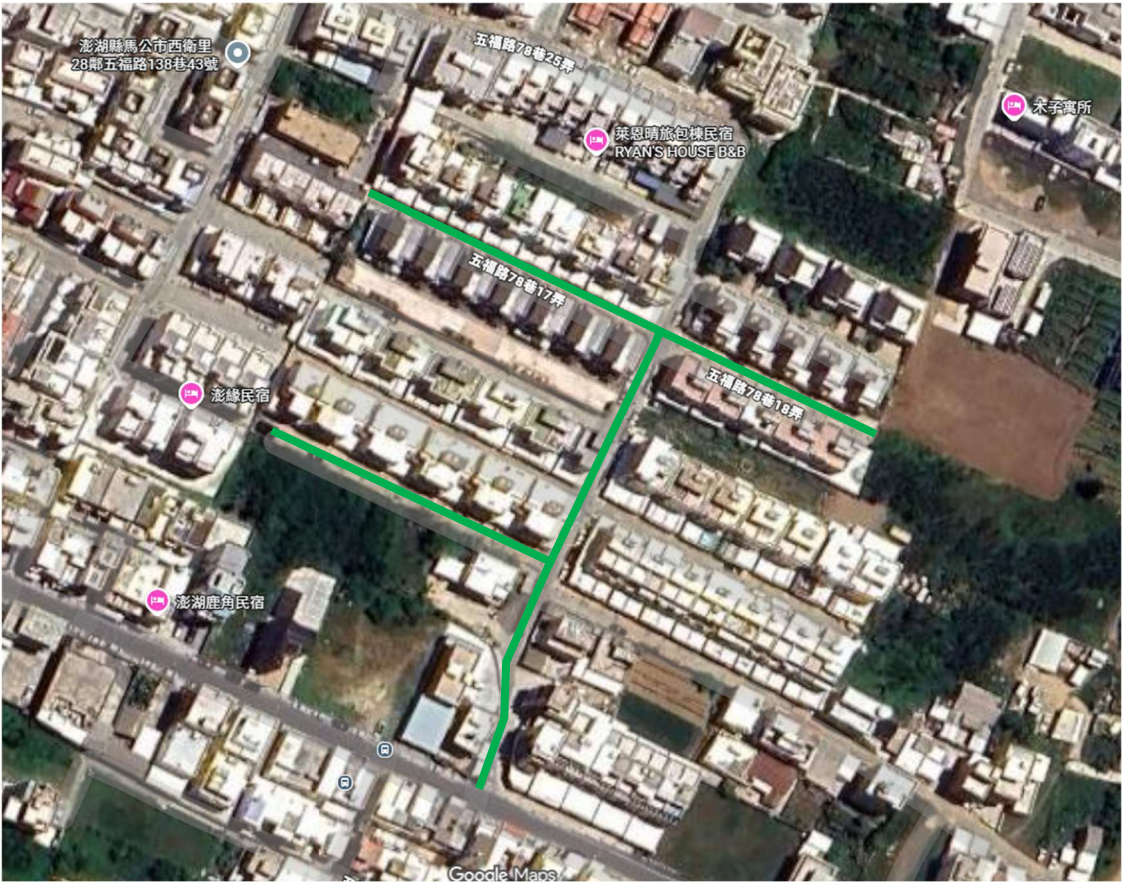
115 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

編 號	位 置	圖
115-2 115年度縣 道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	 	

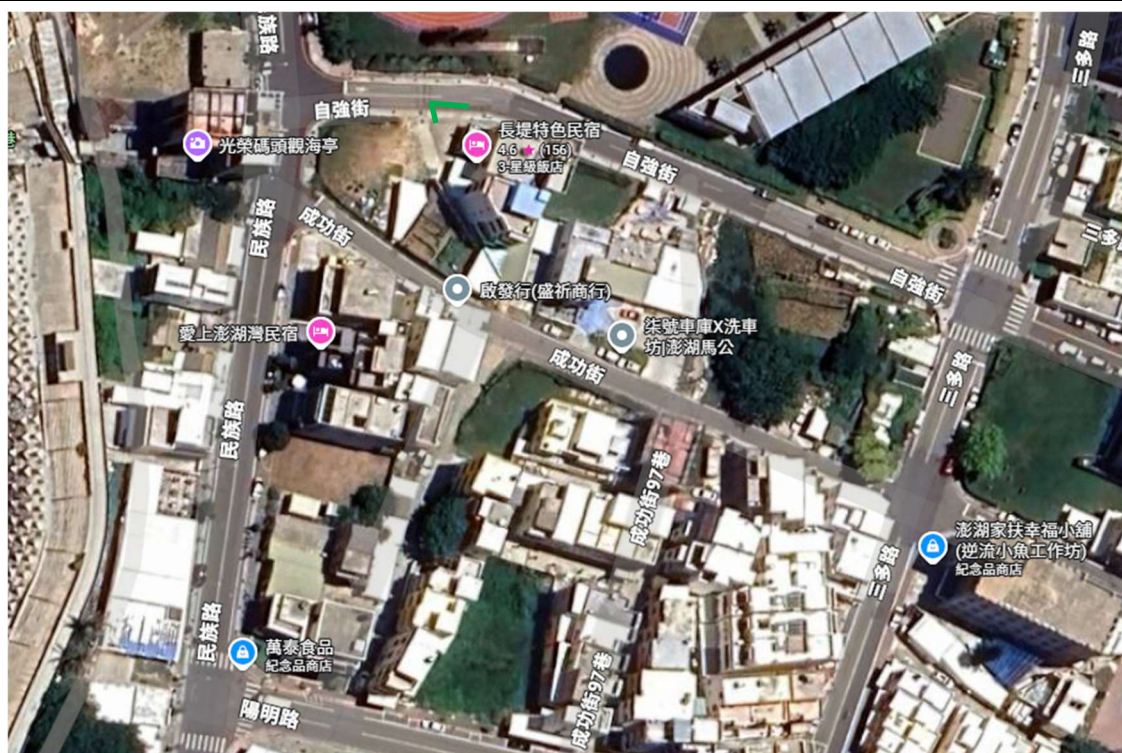
115-4 115年度村里道路改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	
--	--

編號	位置圖
115-5 115 年度村里道路急需改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	

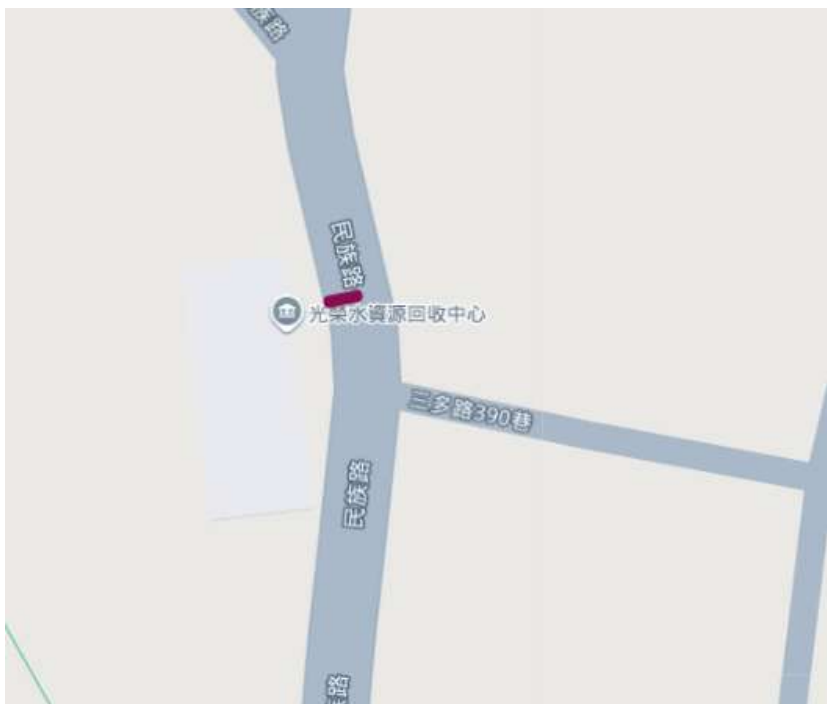
編號	位置	圖
115-6	桶盤村里道路改善工程	
115-8	澎湖縣馬公市雨水下水道系統 MB8 幹線改善工程	

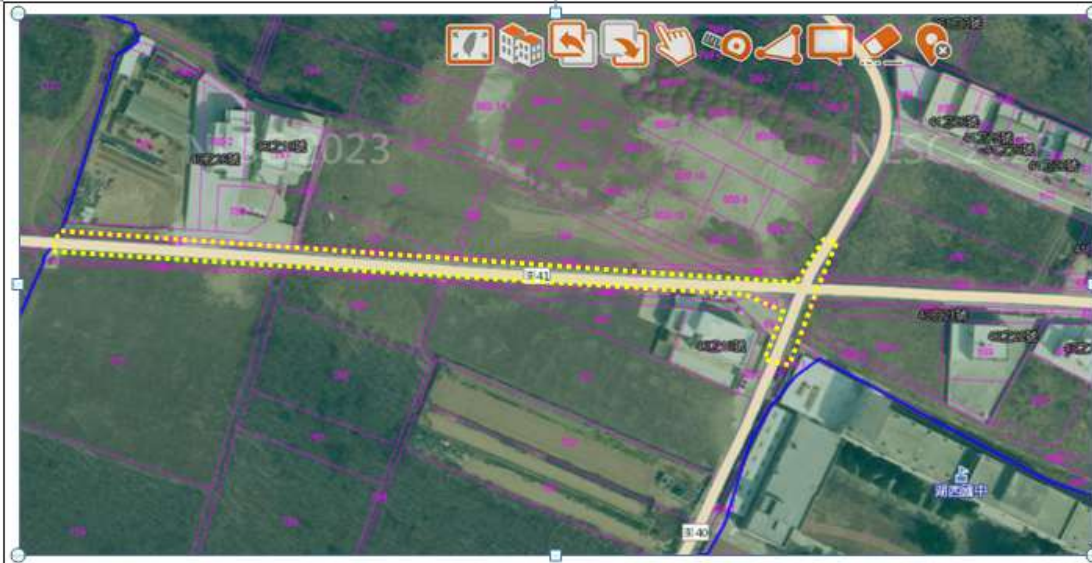
編號	位置	圖
115-9 澎湖縣馬公地區第二期光榮系統用戶接管工程第一標 五福路 78 巷 (含周邊巷道)、61 巷 (含周邊巷道)、重光活動中心旁、四維路人行道(含周邊巷道)、自強街 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科	 	





115-10 115 年度排水改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科	
---	--

編號	位置	圖
115-11 光榮水資源回收中心廠外繞流管路改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

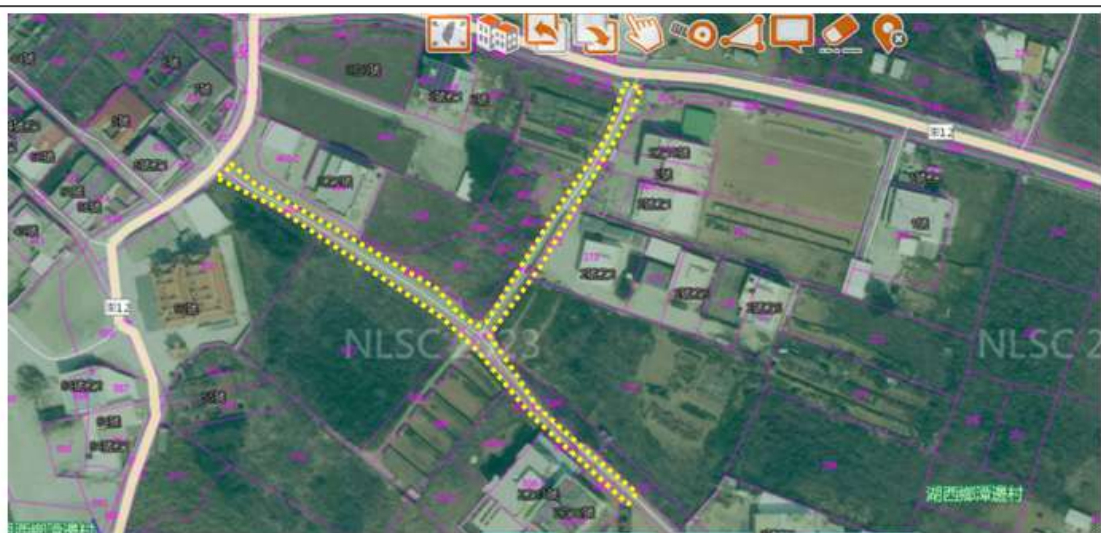
編號	位置圖
115-12 115 度湖西鄉村里道路挖掘改善工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-湖西村工區  位置圖-澎 41 號線湖西 43-26 號至 43-18 號前路段 (115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-青螺村工區  位置圖-青螺 19 號至 47-1 號宅路口路段

(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-成功村工區



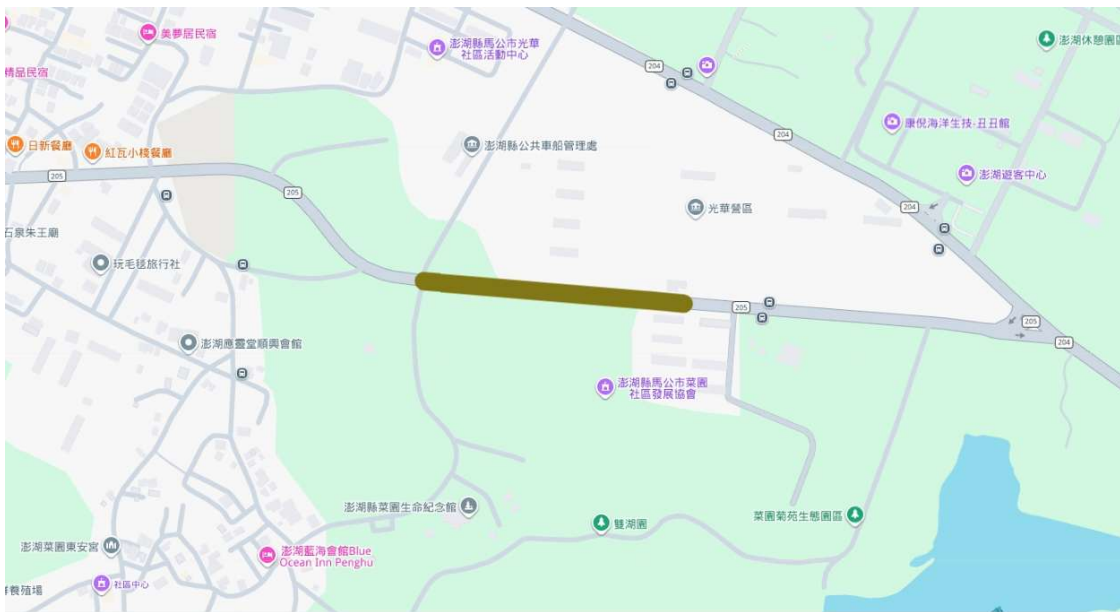
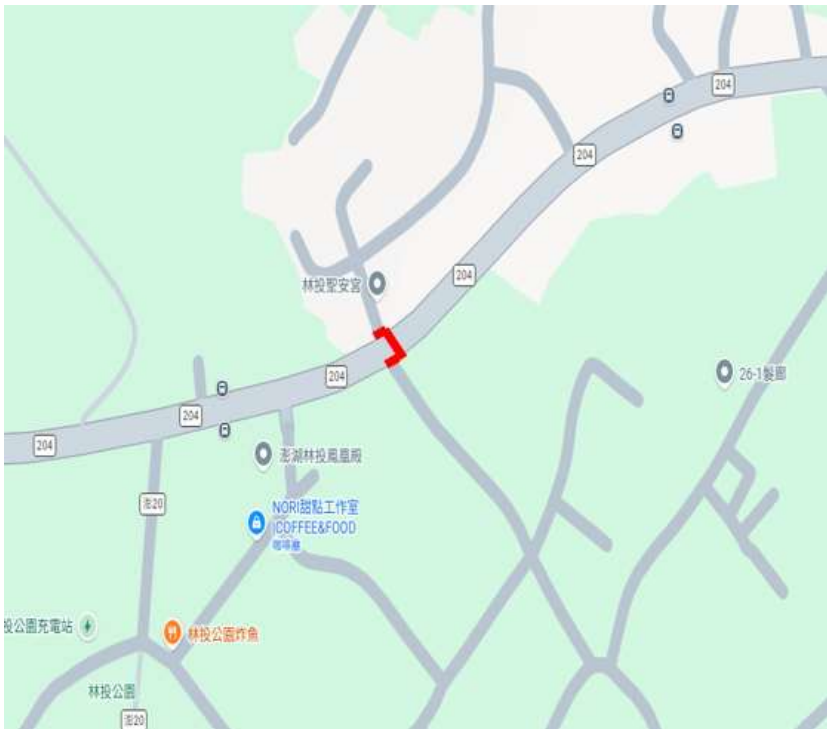
位置圖-成功 1-43 號至 226 號宅前路段

(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-潭邊村工區



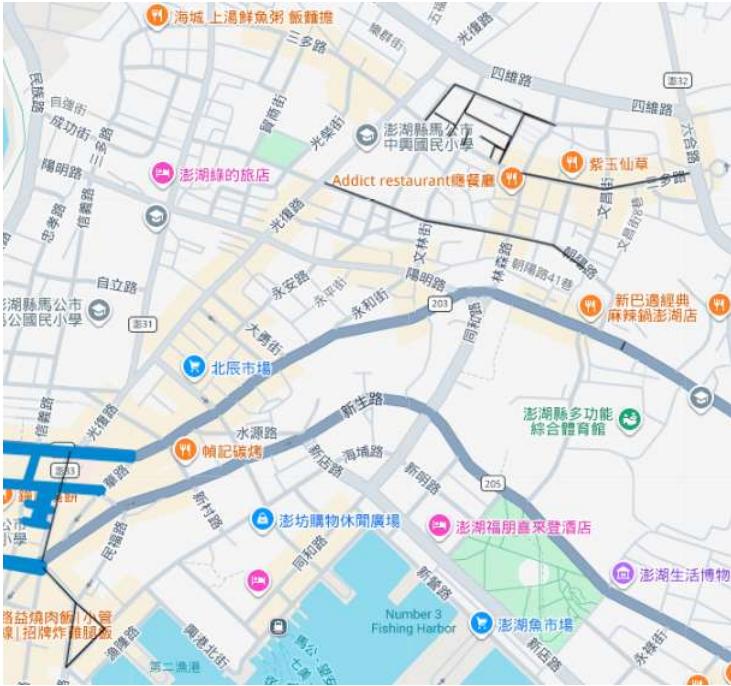
位置圖-潭邊 2-11 至東明宮路口及至 2-10 號宅前路段

編	號	位	置	圖
115-15	太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程	提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	 隘門60-8宅前路打除重鋪混凝土鋪面，$W=3m$，$th=0.15m$，$L=35.5m$ 隘門60-8宅前溝面打除重做，$W=0.8m$，$th=0.15m$，$L=35.5m$ 隘門108前路打除重鋪混凝土路面，$W=2.7、3.35、5m$，$th=0.15m$， $L=60+36+42=138m$  施工內容： 城北村19號至21號宅前溝面打除重做，$W=0.9m$，$th=0.15m$，$L=20m$	

編號	位置	圖
115-17 海軍管道強化案 提案單位： 海軍馬公通信隊		
115-18 204 縣道與鳳凰殿岔路口配合縣道改善工程道路鋪鋪下地作業 提案單位： 澎湖縣政府警察局		

115-21 縣道 204 線 與縣道 201 線岔路口 (興仁圓環) 號誌管線下 地工程 提案單位： 澎湖縣政府 警察局	
115-22 馬公市五福 路管線汰換 工程 提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處	

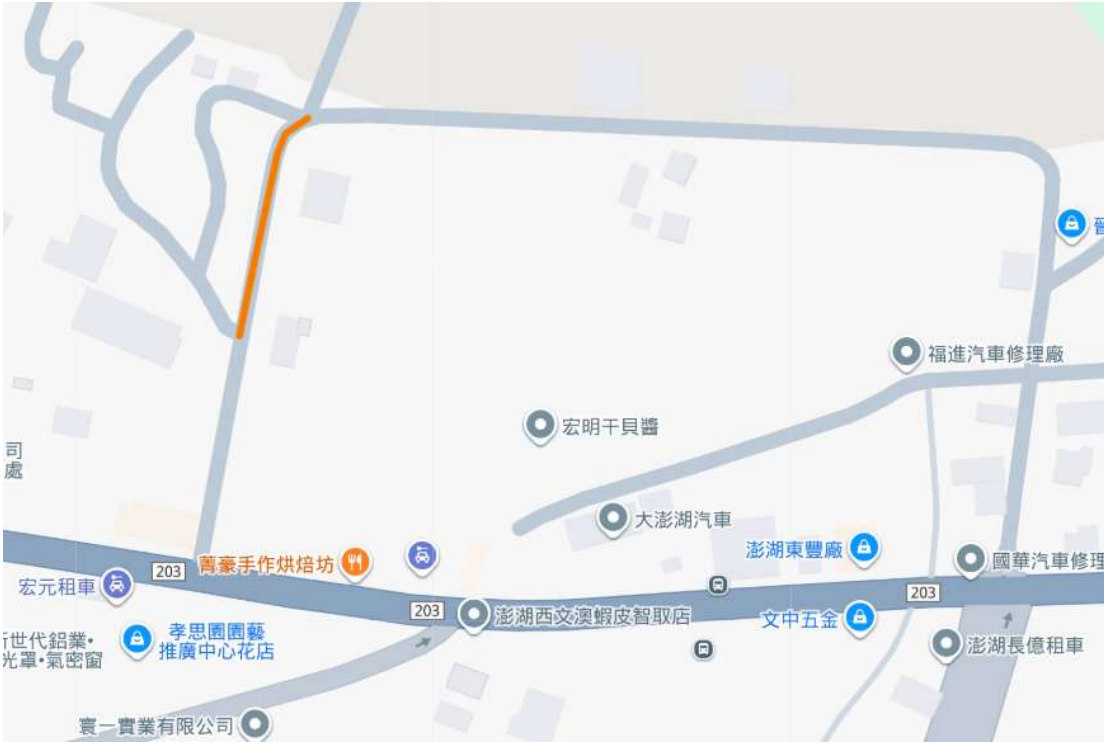
編號	位置	圖
115-23 湖西鄉 204 縣配合道路整修管線汰換 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處		
115-25 澎湖縣望安鄉東安村汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處		

編號	位置
115-26 澎湖縣望安鄉西安村汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處	
115-27 馬公市三多路、朝陽路管線汰換 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處	

115-28 116 年度鄉道改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	
--	--

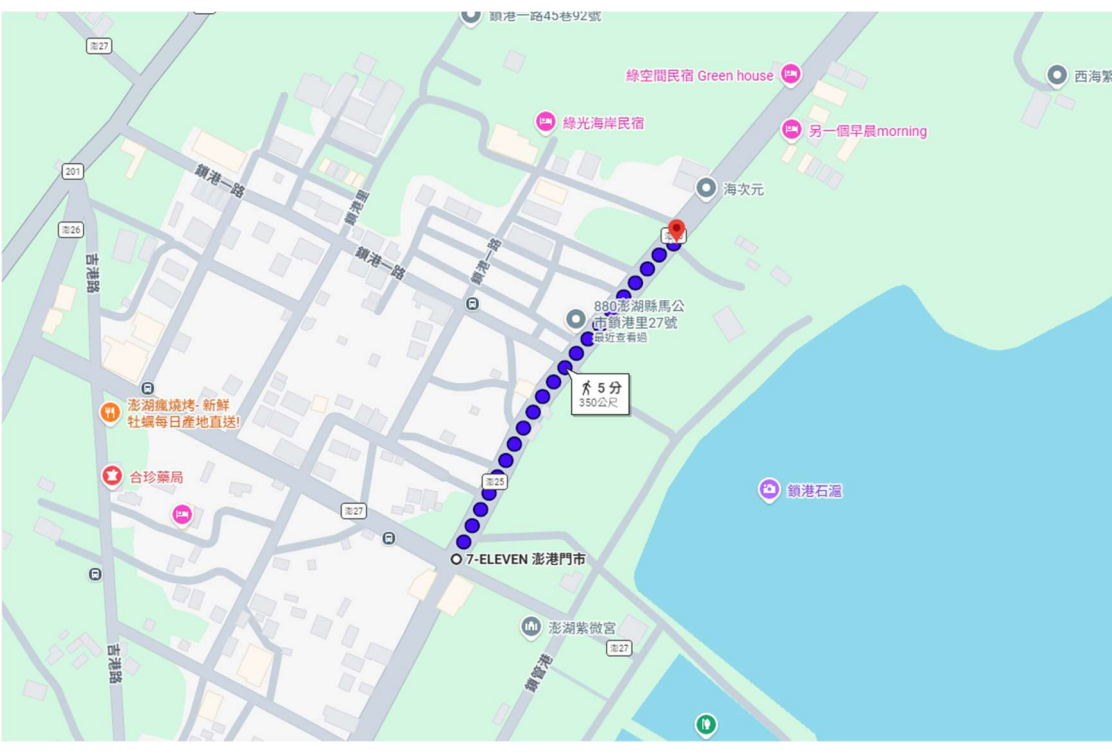
編號	位置
115-29 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1 揚水站及壓力管工程(綠色路段) 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科	

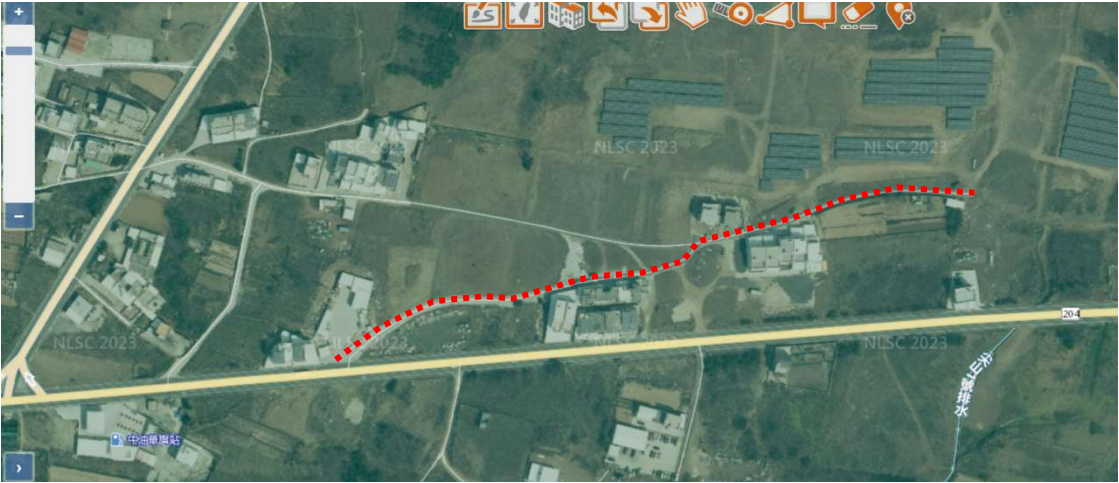
115-30 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標 (Ca)(紅色路段) 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科	
--	--

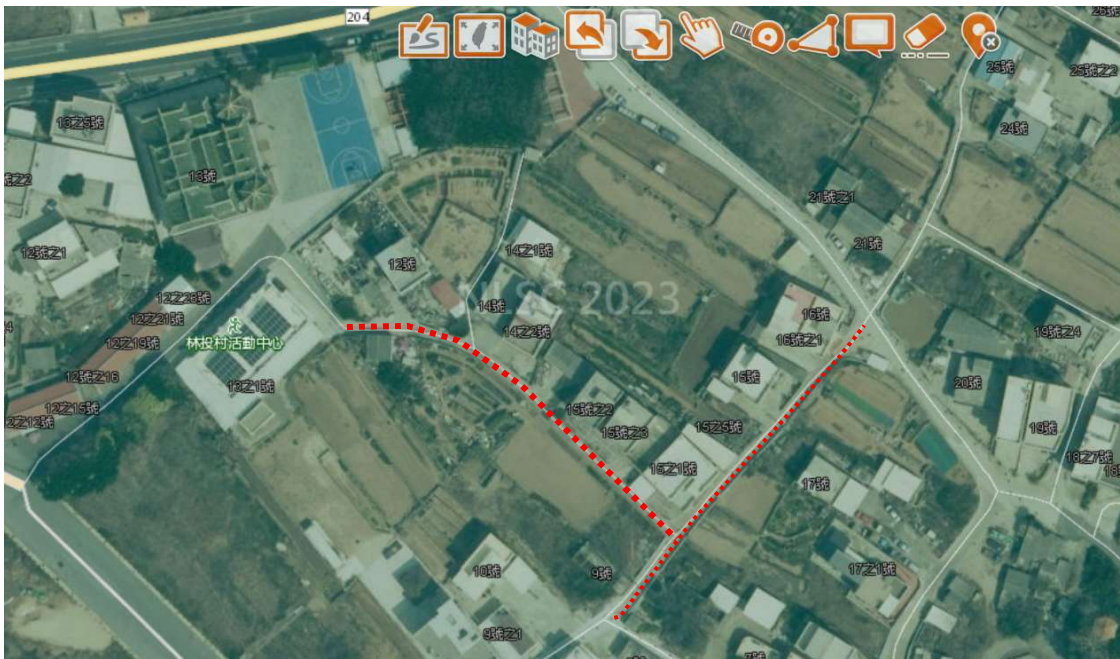
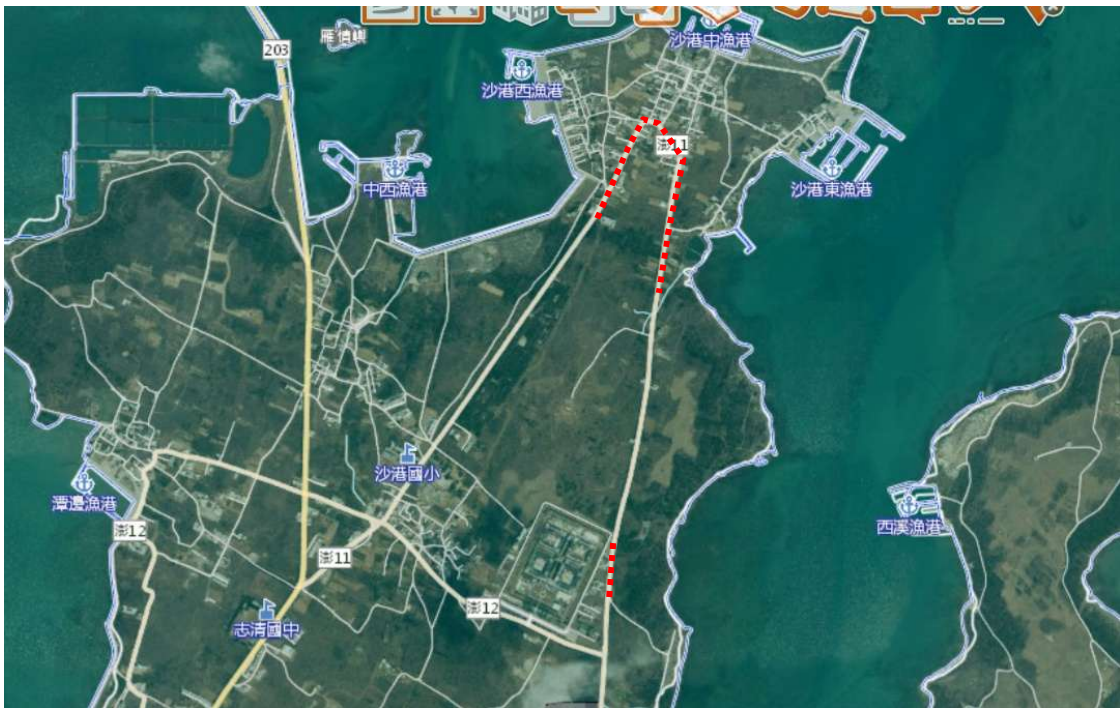
編號	位置	圖
115-31 澎湖縣馬公市雨水下水道系統 MD1 幹線改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科		

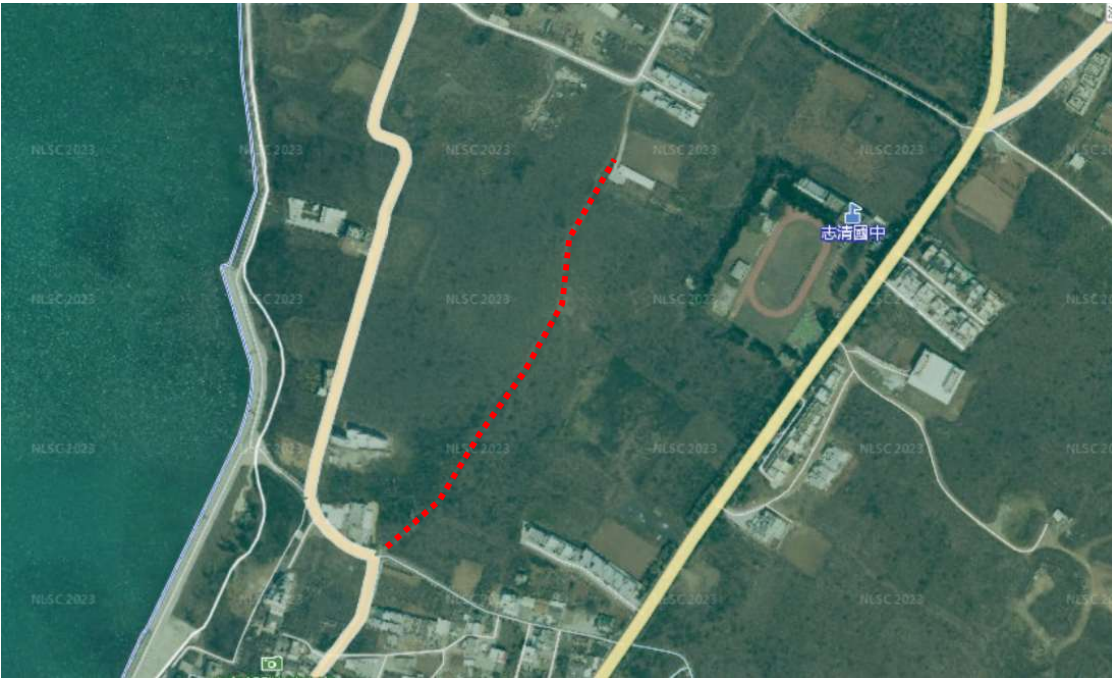
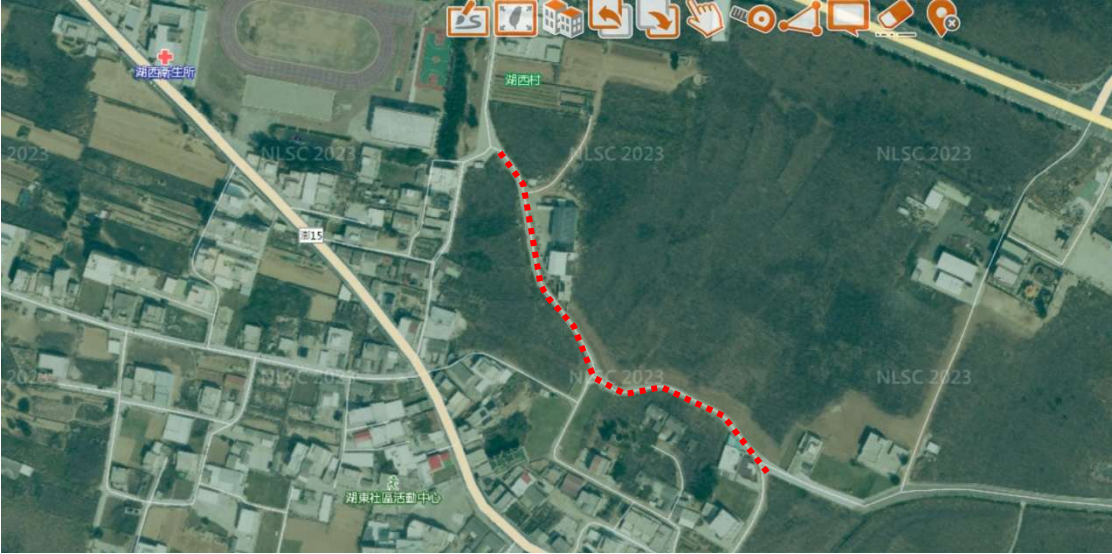
115-2-1 116 縣道改善工程(第 1 標) 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	
115-2-2 116 縣道改善工程(第 2 標) 提案單位： 澎湖縣政府 土木科	

編號	位置	圖
115-2-3	澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊路面改善工程	
115-2-4	115 年排水改善工程 (第 2 標)	

	
115-2-5 鎖港 SF1 幹 線改善工程 提案單位： 澎湖縣政府 下水道科	

編號	位置圖
115-2-6 湖西北營西側至玉明宮側道路(含廣場)整修工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	
115-2-7 115 年湖西鄉林投村里道路改善工程 (202 縣道至貝嬭民宿) 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	

編號	位置	圖
115-2-7 115 年湖西鄉林投村里道路改善工程 (林投活動中心南側周邊道路) 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		
115-2-8 澎 11 號鄉道水溝改善工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		

編號	位置圖
115-2-9 115 年度許家至潭邊產業道路新設工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	
115-2-10 115 年度湖東村道路改善工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所	

編號	位置	圖
115-2-11 115 年度湖西童軍露營區道路改善工程 提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所		
115-2-12 116 年度白沙鄉赤崁管線挖掘道路鋪面改善工程 提案單位： 澎湖縣白沙鄉公所		

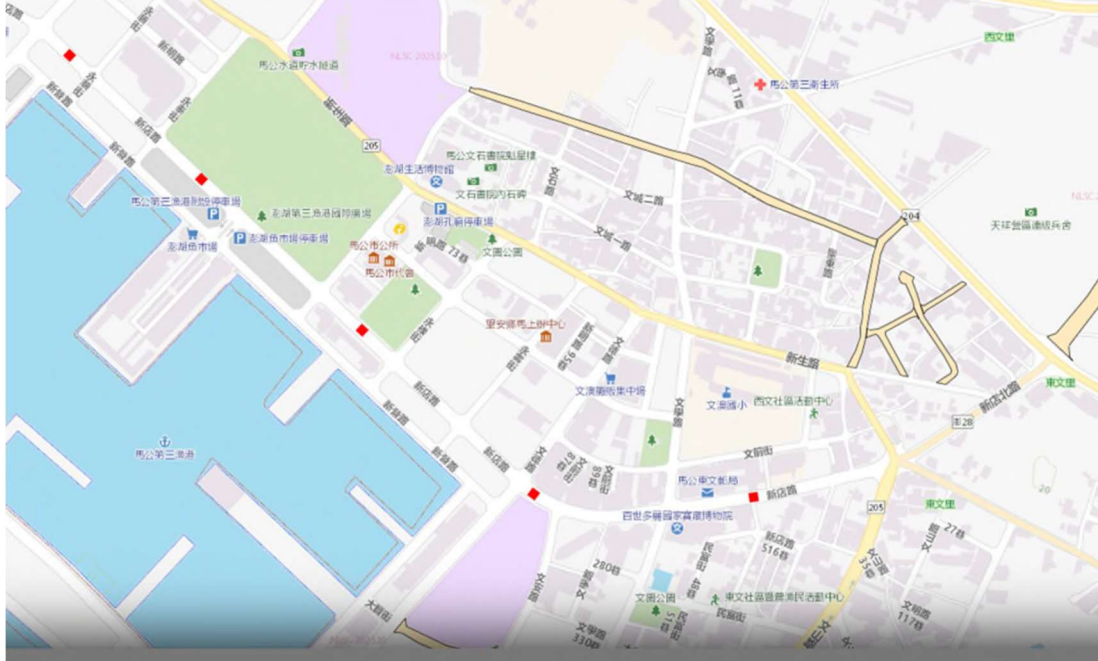
編	號	位	置	圖
	115-2-13	內垵國小前 道路 AC 鋪面 修繕工程		
	115-2-14	外垵村道路 挖掘改善工 程		

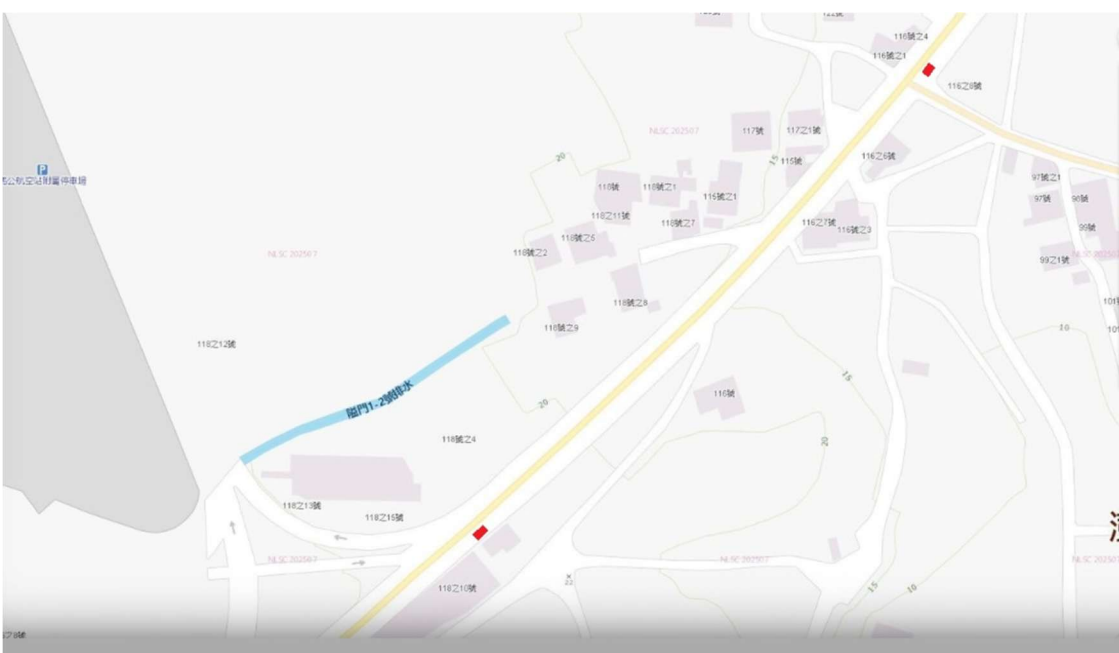
115-2-15 外垵村道路修繕工程 提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所	
---	--

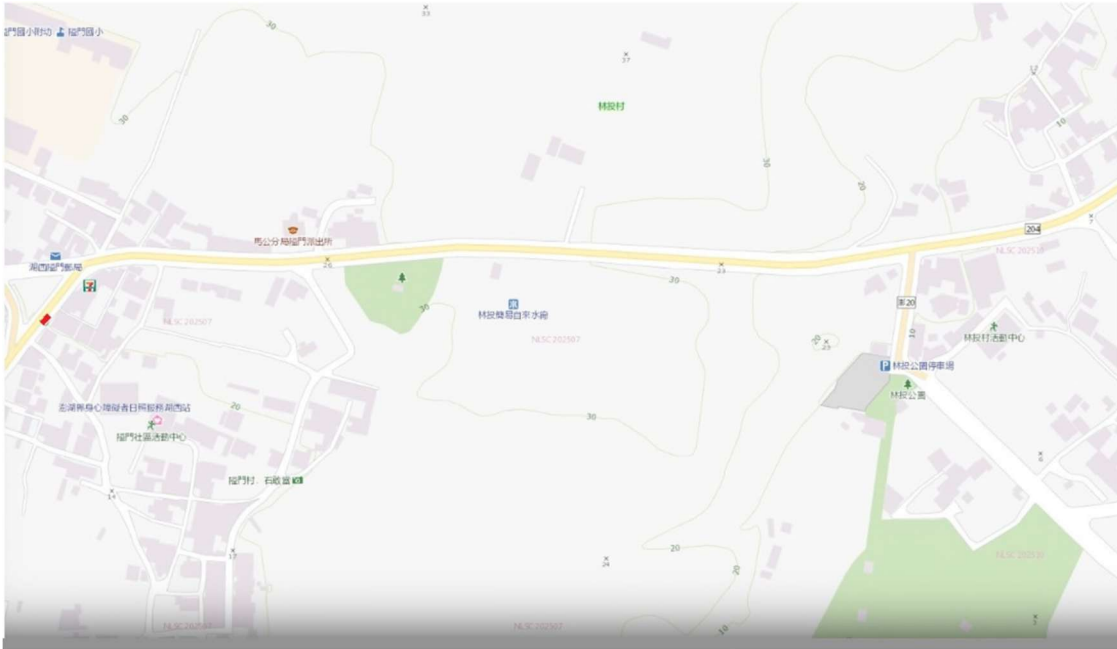
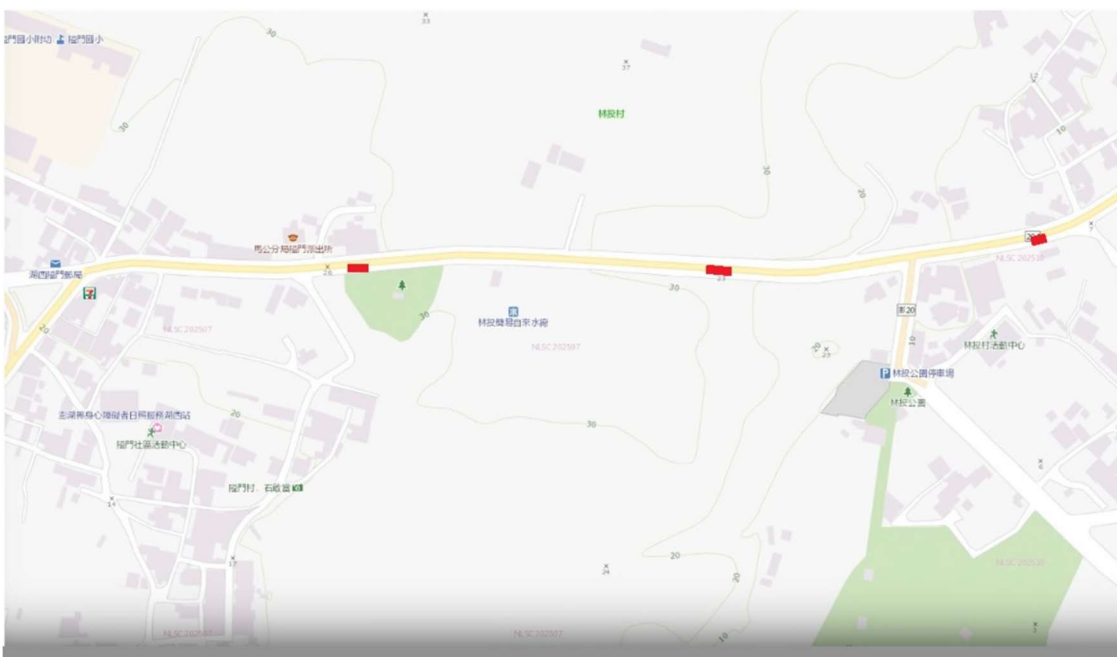
編號	位置圖
115-2-16 澎湖西嶼鄉竹灣村等汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處	

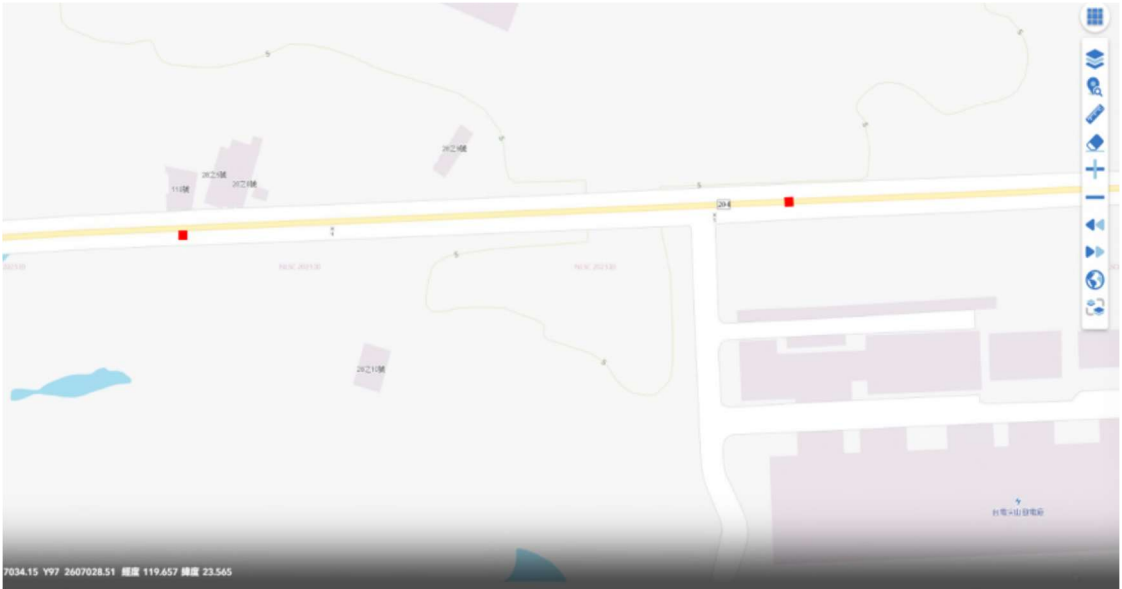
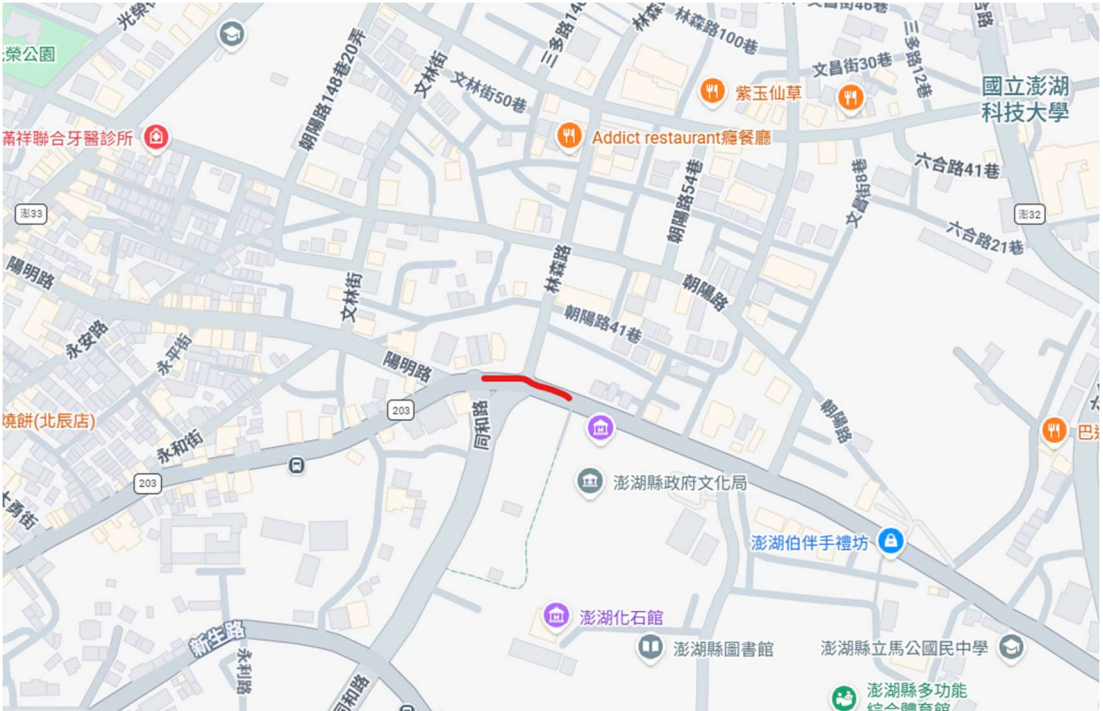
115-2-17 澎湖縣西嶼鄉 203 號線 (小門-池東) 汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處	
115-2-18 澎湖縣將軍澳嶼汰換管線工程 提案單位： 台灣自來水公司第七區 管理處	

115-2-19 澎湖將軍澳嶼新設取水 管線工程 提案單位： 台灣自來水 公司第七區 管理處	
---	--

編 號	位 置
115-2-20 69kV 澎湖~ 馬公紅白線 M36~M40 人 孔提升及降 埋 提案單位： 台電嘉南供 電區營運處	 澎湖縣馬公市新店路(人孔在內車道上)

115-2-21 69kV 澎湖~馬公紅白線 M25 人孔提升 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 204 縣道 3K+214
115-2-22 69kV 澎湖~馬公紅白線 M11-M12 人孔提升 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 204 縣道 6K+495、204 縣道 6K+740

編 號	位 置	圖
115-2-23 69kV 澎湖~馬公紅白線 M10 人孔提升及降埋 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 204 縣道 6K+903	
115-2-24 69kV 澎湖~馬公紅白線 M7-M9 人孔提升 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 204縣道7K+168、204縣道7K+418、204縣道7K+668	

115-2-25 69kV 澎湖~馬公紅白線 M2、69kV 澎湖~尖山紅白線 M1 人孔微創開孔檢視 提案單位： 台電嘉南供電區營運處	 204 縣道 8K+911、204 縣道 9K+171
115-2-26 6 吋長途管線穿越箱涵處腐蝕改管 提案單位： 台灣中油公司澎湖營業處	

115-2-27 湖西鄉 204 縣埋設管線 工程 提案單位： 新世紀資通 有限公司	
115-2-28 西嶼線路改 善工程 提案單位： 臺灣電力股 份有限公司 澎湖區處	

115-2-29 供水管路整 修工程 提案單位： 海軍馬公後 勤支援指揮 部	
---	--
