

## 澎湖縣 115 年度「路面管線工程協調小組」 第 1 次協調會議議題與宣導配合事項

### 壹、道路挖掘管理事宜

#### 一、路證審核單位：

1. 本府工務處：縣道 201、202、204、205、禁挖期內道路範圍(除村里道路外)。
2. 公路局澎湖工務段：縣道 203。
3. 各鄉市公所：除以上範圍其轄管區域內道路。  
如非屬必要措施，則禁止三年內道路計畫型挖掘申請。

二、臨近本縣觀光旺季，請各單位於 4 月底至 8 月底期間儘量減少道路挖掘，並禁止於主要幹道及市區辦理計畫性挖掘工程；相關工程請於期間前完成，或延後辦理。

三、辦理道路挖掘之單位，如有挖損其他單位管線情形，應即時通知相關單位辦理現場會勘及後續處理，不得隱匿或延誤通報。

四、施工範圍之交通維持措施請妥善控管，如需採逆向通行，務必派員現場引導指揮；如車道狹小致車輛無法通行，應於路口設置改道指引標誌。每日施工退場前應再行巡視道路通行狀況，必要時鋪設鐵板供車輛通行，以確保車輛得以順利通行。

### 貳、公共管線系統(道路整合資訊便民服務網)

一、如配合本府及各管理機關道路工程埋設作業，仍需於系統申請案件取得路證，可依協調會議紀錄(備註文號、工程)作為免收路修費依據，路權單位亦應依程序核發路證。

二、本府預訂 115 年 4 月 21 日辦理公共管線系統圖資更新作業教育訓練，請各單位派員參加(實際使用者及承辦人員務必參加)。

### 參、道路修復費用支用情形

一、各鄉市公所 113-115 年度提報經縣府核定之工程，請盡速辦理，應辦期程如下表，如未於預定期程內辦理完成將撤回經費於下一年度辦理。

項次	工程名稱	單位	核定經費	經費使用情形	
113-1	113年度七美鄉道路挖掘修復工程	七美鄉公所	6,000,000	113年度預算保留	委辦費
114-1	114湖西鄉村里道路挖掘改善工程	湖西鄉公所	9,420,000	114年度追加減保留	委辦費
114-2	114年度馬公市道挖改善工程(第1標)	馬公市公所	11,890,000	114年度追加減保留	委辦費
114-4	(114) 五德威靈宮前道路改善工程	馬公市公所	1,921,254	114年度預算.雜項	委辦費
115-1	(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程	湖西鄉公所	5,735,000	115年度預算	獎補助費
115-2	外垵村道路挖掘改善工程	西嶼鄉公所	1,911,573	113年度延至115年度	獎補助費
115-3	115年度白沙鄉管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉公所	2,050,000	115年度預算	獎補助費
115-4	西嶼鄉道路鋪面改善工程	西嶼鄉公所	6,800,000	115年度預算	獎補助費
115-5	七美鄉道路鋪面改善工程	七美鄉公所	10,000,000	115年度預算	獎補助費
115-6	115年度馬公市道挖改善工程	馬公市公所	15,000,000	115年度追加減預算	獎補助費

**肆、其他配合事項：**

- 一、本會議宗旨係協調各路權及管線單位預計施作之道路工程，使其相關單位能配合期程及相關作業，路權單位應當表率，確實提供資料，以利其他單位配合。
- 二、為配合各項活動及考試期間之交通與環境需求，請各相關單位於該期間內配合辦理道路禁挖措施，停止挖掘道路及含道路範圍內各項施工行為。

時間	活動名稱	主辦單位	禁挖範圍
115/4/11-12	2026 IRONMAN Penghu 國際鐵人三項賽	澎湖縣政府教育處	活動路線
115/4/25-26	115 學年度技專校院統一入學測驗考試	財團法人大學入學考試中心基金會	澎科大周圍

115/5/16-17	115 年國中教育會考	教育部	馬公高中周圍
115/11/22-29	115 年地方公職人員選舉	中央選舉委員會	全縣

三、於中油公司管路路線施工前請各單位務必通知該公司人員辦理會勘。

#### 伍、施工路段協調

一、113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表(附件 1)。

二、113-115 年度提報列管之道路及管線工程項目施工位置圖檔(附件 2)。

三、各單位施工位置路段彙整於

[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1b6jY8zBt5aQxPShKfjhYuJd4KxJo\\_Qw&usp=sharing](https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1b6jY8zBt5aQxPShKfjhYuJd4KxJo_Qw&usp=sharing)

#### 陸、臨時動議

澎湖縣轄區內113年度提報列管之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
1	113-1-2	公路局 澎湖工務段	縣道擇要路面修復工程	1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局-澎湖古棗味) 2. 204縣道3K+800-4K+100(興仁圓環至興仁國小) 3. 204縣道7K+120-7K+600(隘門)	公路局 澎湖工務段	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局	1. W=16, L=750 2. W=15, L=596 3. W=12, L=570	1、3.延至116年度 2.完工	原預計113年下半年度	第3條新增 照案通過 請召開管線協調會	1.中華電信大 手孔下地 2.自來水請檢 討管線修漏問 題	
2	113-9	國土管理署 南區工程署	澎湖縣馬公市機三北側8米計畫道路開闢工程	-	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 □澎湖有線電視	W=8m, L=140m	完工	114年1月16日開工	照案通過		
3	113-10	國土管理署 南區工程署	澎湖馬公市案山段8米計畫道路開闢計畫		澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 □澎湖有線電視	W=8m, L=120m	完工	114年1月16日開工	照案通過		
4	113-11	澎湖縣政府 土木科	澎13線鄉道改善工程	湖西至青螺社區(0K+000~2K+200)	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	W=8m, L=2200m	7月28日開工 目前施工中 預計115年7月份完工	新增2K-4K 案114-2-4	照案通過 請召開管線協調會		
5	113-39	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	白坑村(社區)架空線路地下化預埋管路工程	澎13號線部分~白坑社區	湖西鄉公所	■台電 □自來水 □中華電信 □澎湖有線電視	W= 0.6m, L=2,000m	施工中 預訂115年6月完工	1.原預計 113年4月-10月 2.延至預訂 114年4月-10月	照案通過	澎13線倘未能 配合縣府期程 (113-11)將撤 案	
★6	113-40	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	七美鄉平和村線路改善預埋管路工程	七美鄉平和村垃圾掩埋場~潭子港~機場跑道南側(九孔養殖池)及七美海鮮風味餐旁	七美鄉公所	■台電 □自來水 □中華電信 □澎湖有線電視	w=0.6m, L=1,600m	預計115年下半年度進場	1.原預計113年 4月-10月 2.延至預訂114年 4月-10月	照案通過	1.公所同意本 案施作 2.請公所納入 115年度創鋪 (基金專款專 用)	公所同意延期
7	113-42	台灣自來水公司第七區 管理處	烏炭海淡廠送白沙淨水場清水管工程	由澎202號線(東衛國軍副食品供應站門口)沿澎12號線至鼎灣轉203號線至赤炭白沙淨水場	公路局 澎湖工務段/ 澎湖縣政府 /湖西鄉公所	□台電 ■自來水 □中華電信 □澎湖有線電視	W=1.0m, L=14,000m	完工	114/2進場-115/2	照案通過		
8	113-43	台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所	澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程	汰換平和村頂茄埕、下茄埕與九孔生態園區等區域管線汰換	七美鄉公所	□台電 ■自來水 □中華電信 □澎湖有線電視	w=0.6m, L=5,600m	進場施工中預計115年5月完工	因管材變更重新 設計,預計5月公 告招標	照案通過	1.公所同意本 案施作 2.請公所納入 115年度創鋪 (基金專款專 用)	
9	113-50	台灣自來水公司第七區 管理處澎湖 營運所	澎湖所配水管線遷改工程	1.新店路及新生路路口 2.案山北極殿前巷道 3.鼎灣開帝殿前 4.西嶼鄉赤馬村往內垵村203縣道下坡方向	公路局 澎湖工務段/ 馬公市公所	□台電 ■自來水公司 □新世紀資通 □澎湖有線電視	W=0.6-8m L=530m	完工		照案通過	2.案山北極殿 不同意施工	
10	113-55	澎湖縣政府 土木科	「澎20線道路拓寬工程(烏炭-隘門)」		澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	W=m, L=1288m	預計11月發包 預計公告上網中,預計 115年4月份開工。	已召開設計協調 會	照案通過		
11	113-57	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路改善工程-第二標	西溪村、沙港村、龍門村、南寮村、湖東村	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		完工	原預計114年上半 年	照案通過 請召開管線協調 會		

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
12	113-58	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-主 次幹管工程第一標	1. 同和路-新店路-文德路 2. 203縣道(文化局-華勇預拌廠前)	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	短管推進 L=3,700m	預計114年~116年度	原定114年~115年 度	照案通過 請召開管線協調 會		

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
13	113-59	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-P1揚水站及壓力管工程	1. 國際廣場-體育園區道路-中華路口 2. 國際廣場-新生路-新村路	澎湖縣政府	■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視	壓力管 L=1,440m	預計115-116年度	原定114年~115年度	照案通過 請召開管線協調會		
14	113-60	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標(Ca)	新店路以北、中華路以南	澎湖縣政府	■台電、 ■自來水公司、 ■中華電信、 ■澎湖有線電視	短管推進 L=3,499m	預計116-118年度	原定114年~116年度	照案通過 請召開管線協調會		
15	113-61	澎湖縣政府 下水道科	114年度雨水下水道改善工程	同和路-中華至新生	澎湖縣政府	□台電、 □自來水公司、 □中華電信、 □澎湖有線電視 □警察局	W=m L=300m	114/9/17開工， 已開過管線協調會	同和路雨水下水道箱涵頂板改善工程	照案通過 請召開管線協調會		
16	113-62	澎湖縣政府 建設處	馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程	預計辦理民福路接至海埔路管線連接新設	澎湖縣政府	■台電 □自來水公司 ■中華電信 □澎湖有線電視	W=11m L=99.4m	114年9月8日申報開工 工期270日曆天 目前建置停車場，後續 施作道路部分，預計 115/10完工	道路開闢工程後續擴充程序刻正簽辦中，未來將於道路工程施作路基前將通知中華電信及台電公司埋設管線。	照案通過 請召開管線協調會		
17	113-64	湖西鄉公所	湖西鄉道路改善工程第6標	1. 湖西幼兒園前路段改善工程(總長450M、均寬4.5M)。 2. 沙港國小至中西生命紀念館改善工程(總長500M、均寬6M)。 3. 南北寮漁港道路改善工程((總長230M、均寬6M)。	湖西鄉公所	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：1270公尺 寬：5.5公尺	完工		照案通過 請召開管線協調會		
18	113-65	湖西鄉公所	114年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程	1、尖山45-1號旁道路改善(全長54.6M*路寬約7.5M) 2、龍門安良廟西側道路改善(不含溝面)(全長175M*路寬約5M) 3、成功1-67號宅往202縣道路面改善(含溝面)(全長210M*路寬約7M) 4、成功111-117號宅前道路改善(全長74M*路寬約6M)	湖西鄉公所	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長：約280+513.6公尺 寬：約4-8公尺	完工		照案通過 請召開管線協調會		
19	113-2-2	白沙鄉公所	小赤村管線挖掘道路鋪面改善工程		白沙鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	W=m L=330m	完工		照案通過 請召開管線協調會		
20	113-2-5	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程		公路局 澎湖工務段/ 白沙鄉公所	□台電 ■自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	w=0.6-1m L=14200m	申請路證中預計115年4月進場		照案通過 部分路段公所112年度前瞻計畫已施作完成，屬三年禁挖，遇禁挖路段不施作	公所提供禁挖路段範圍請自來水檢討減作	請與公所協調施工範圍及回填方式
★21	113-2-10	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程	民生路、文化路、忠孝路、治平路等路段	馬公市公所/ 澎湖縣政府/ 公路局澎湖工務段	□台電 ■自來水公司 □中華電信 □澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=1839m	目前剩民生路，民族路 至中正路3月底完成，中 正路至光復路口(雙 側)115/9開始施作	9月底進場施工	1. 文化路，撤案 2. 忠孝路、民生路、治平路，照案通過	1. 文化路縣府114/3/20進場 2. 忠孝路請於114年度完成 3. 忠孝路、民生路及治平路工程於8月後施作	

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
22	113-2-12	台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心	台灣中油6吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證	馬公至湖西約12公里(興港南街-民福路-樹德路-203線1K+110-4K+200-202線0K+000-7K+530-澎19號-湖西供油中心)	公路局 澎湖工務段/ 馬公市公所/ 湖西鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W=2m, L=4 m 3處	完工	針對智慧型通管器檢查後管線腐蝕較嚴重處進行開挖檢查 預計114/4/15完成	照案通過	請公所及工務段確認，是否位於禁挖範圍及114年度是否有預定辦理路面工程	1. 中華路請與路權單位確認施作時間(避開上下班尖峰時間)，施作前請發布新聞稿。 2. 因屬禁挖路段，完工後請回鋪一車道範圍。

澎湖縣轄區內114年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
1	114-1	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程	中正、永安橋	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115年年底進場		照案通過 請召開管線協調會	已開設計階段會議 邀集各單位與會	
2	114-3	澎湖縣政府 土木科	114年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	1.明遠路(信義路-光復路) 2.新村路(馬公國小-光復路) 3.忠孝路(民遠路-安一飯店-民族路) 4.三多路(敬業街-陽明路) 5.文光路(四維路-陽明路) 6.陽明路(民族路-光復路) 8.信義路(治平路-民遠路) 9.文化路(樹德路-民生路) 10.同和路(北辰街-海埔路)	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		完工	9於3/20進場，四月底第一次派工1.2.3.8.10，9月第二次派工完成	照案通過	1.明遠路及信義路口警察局兩處架空請配合下地 2.三多路下水道尚須降孔	
3	114-8	湖西鄉公所	114年度湖西鄉農路改善工程	1.編號：農澎湖027，農澎馬013 (全長450M*路寬約4.0M) 2.編號：農澎湖022——(全長210M*路寬約6.0M)	湖西鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長：約660+100公尺 寬：約4-6公尺	完工	1.編號：農澎湖027，農澎馬013 追加部分：(全長100M*路寬約6M)			
4	114-9	望安鄉公所	西安村人行環境暨路口改善工程	望安衛生所至西安村活動中心路段	望安鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W=5 m, L= 537 m	預計115/4完工	1.澎湖縣永續提升人行安全計畫 2.預計114/3/30勞務開標	照案通過 請召開管線協調會		
★5	114-11	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M41人孔提升及降埋	海埔路上快樂渡假村南路口	馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 1處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1.未確認施工期程，延至下一次會議決議 2.請於114年底發包，115/4前施作完成	照案通過
★6	114-12	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M36-M40人孔提升及降埋	新店路	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 5處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1.未確認施工期程，延至下一次會議決議 2.請於114年底發包，115/4前施作完成	照案通過 於主要幹道完工後請下地
★7	114-13	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M10-M12人孔提升及降埋	204縣道6K+495~204縣道6K+903	公路局 澎湖工務段	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 3處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1.未確認施工期程，延至下一次會議決議 2.請於114年底發包，115/4前施作完成	照案通過
★8	114-14	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M21-M23人孔提升及降埋	204縣道3K+706~204縣道4K+209)	公路局 澎湖工務段	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 3處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	人孔開孔點檢	保留提案	1.未確認施工期程，延至下一次會議決議 2.請於114年底發包，115/4前施作完成	照案通過
9	114-17	澎湖縣政府 土木科	白沙鄉通梁社區道路安全及人行道空間建置計畫		澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		完工		照案通過		
10	114-18	澎湖縣政府 警察局	監視系統裝設	1.大賢、文學路口 2.朝陽、林森路口	澎湖縣政府/ 馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		1.預計115年度下半年度 2.施作完畢		照案通過	1.大賢、文學路口遇禁挖範圍不能施作 2.朝陽、林森路口，照案通過	
★11	114-2-1	國土管理署 南區工程署	澎湖馬公市西文里社會住宅計畫道路開闢工程	文學路、文城三路	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 8 m L= 155 m	預計115/3/15前上網公告，115/3月底前決標，決標起20日內開工，工期預估150工作天				保留提案 請於設計階段邀集管線單位協調配合(三大管線務必配合)

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
12	114-2-2	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程	樹德路(中華路-民族路)-440M 忠孝路-72M 中正路-72M 治平路-52M	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■後備指揮部		施工中	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。			照案通過 請召開管線協調會
13	114-2-3	澎湖縣政府 土木科	澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程	中山路-50M 民福路-180M 仁愛路-85M	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115下半年度	包括人行道串聯與改善、路燈改善、路側排水改善、人行道附屬設施改善等。			照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合
14	114-2-4	澎湖縣政府 土木科	澎13號2K-4K路面改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		完工	發包中			照案通過 請召開管線協調會
15	114-2-5	澎湖縣政府 土木科	115年度鄉道改善工程	文光路及重光社區	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年4月進場				照案通過 請召開管線協調會
16	114-2-6	澎湖縣政府 土木科	115年度鄉道改善工程第二標	五福路(文光路至全家)	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年年底進場				照案通過 請召開管線協調會
17	114-2-7	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		施工中				照案通過 請召開管線協調會
18	114-2-8	澎湖縣政府 土木科	114年度村里道路急需改善工程(第二標)	講美、池西	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		施工中	新設水溝			照案通過 請召開管線協調會
19	114-2-9	澎湖縣政府 土木科	114年度望安鄉將軍及東吉村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年4月進場				照案通過 請召開管線協調會
20	114-2-10	澎湖縣政府 土木科	114年度桶盤村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		設計中 預計115下半年度	道路加封，管線要配合			照案通過 請召開管線協調會
21	114-2-11	澎湖縣政府 土木科	114年度烏嶼村里道路急需改善工程		澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		115/1開工 工期90天				照案通過 請召開管線協調會
22	114-2-12	澎湖縣政府 土木科	115年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約(後續擴充)	1-1. 治平路(中華路-民生路) 1-2. 自立路(信義路-忠孝路) 1-3. 忠孝路47巷(民族路-忠孝路) 1-4. 忠孝路77巷(民族路-忠孝路) 1-5. 忠孝路101巷(民族路-忠孝) 1-6. 西嶼小門橋-停車場 2-3. 詳114年度管線協調會	澎湖縣政府	■台電 ■自來水公司 ■中華電信 ■澎湖有線電視		本案屬道路挖掘開口契約，年度預計分3次派工，分別4月、8月及10份派工/第1次派工預計115年4月20日-已確定改善路段/第2次派工預計115/8/20/第3次派工預計115/10/20				照案通過 請召開管線協調會

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
23	114-2-13	澎湖縣政府 土木科	116年度澎湖縣道路挖掘AC標開口契約	<ul style="list-style-type: none"> <li>ㄣ 1-1.文光全聯前道路</li> <li>ㄣ 1-2.三多公園南側道路</li> <li>ㄣ 1-3.三多公園東側道路</li> <li>ㄣ 1-4.文光倉庫前道路</li> <li>ㄣ 2-1.文光路168巷-東西向</li> <li>ㄣ 2-2.文光路162巷</li> <li>ㄣ 2-3.文光路168巷-南北向</li> <li>ㄣ 2-4.三多路390巷</li> <li>ㄣ 3-1.自強街</li> <li>ㄣ 3-2.成功街</li> </ul>	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計116上半年度	配合下水道科工程辦理刨鋪			照案通過 請召開管線協調會
24	114-2-14	澎湖縣政府 下水道科	115年度雨水下水道改善工程	西文工業區及鎖港	澎湖縣政府/ 馬公市公所	<input type="checkbox"/> 台灣固網 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長69m、寬1.5m	預計115年1月~115年12月	下水道箱函改善			照案通過
25	114-2-15	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程(114年度後續擴充)	自立路、信義路、文光路、澎23鄉道部分路段	澎湖縣政府/ 馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	道路連接管 L=286m	預計114年底進場	污水用戶接管			照案通過
26	114-2-16	西嶼鄉公所	外垵村道路挖掘改善工程	1.外垵村29-1號至外垵7-11前巷道。	西嶼鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=管溝寬度 0.4m~0.6m、 L=348.1m	預計115下半年度	尚未發包			照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合
27	114-2-17	西嶼鄉公所	西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程	1.竹灣大義宮旁澎2段大斜坡、南甲福德廟旁道路。 2.橫礁意象旁往橫礁漁港道路。	西嶼鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115下半年度	尚未發包			照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合
28	114-2-18	西嶼鄉公所	114年鄉道及村里道路養護工程(開口契約)	1.內垵國小旁道路2.合界7-11旁交叉入口3.大池外站涼亭旁小路4.池東福德宮旁小路5.大池明興花枝丸旁路6.竹灣星月灣對面交叉道路	西嶼鄉公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input checked="" type="checkbox"/> 中華電信 <input checked="" type="checkbox"/> 澎湖有線電視		完工				照案通過 請於設計階段邀集管線單位協調配合
★29	114-2-20	台電嘉南供電區營運處	69kV澎湖~馬公紅白線M1(微創)-M2人孔提升及降埋	204縣道8K+911~9K+171	公路局澎湖工務段	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	W= 1.6 m L= 1.6 m 2處	114年11月~114年12月 115年2月~115年12月	人孔開孔點檢			照案通過
30	114-2-21	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	114年度人孔直路接頭檢測計畫(孔蓋調升檢測)	海埔路、新生路、新店路等部分鄰近路段	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	孔蓋調升40處	完工	新生路禁挖至114/12 大賢街禁挖至116/12			照案通過(除禁挖路段)
31	114-2-22	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	興炭段桿線下地工程	興仁社區加水站以北	馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		完工				屬開孔無挖掘，撤案
32	114-2-23	臺灣電力股份有限公司 澎湖區處	115年度饋線改善工程	縣道205線及周邊區域	澎湖縣政府 馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	孔蓋調升28處	完工				完工後請下地，如須留重要孔蓋請評估減量
33	114-2-24	台灣自來水公司第七區管理處	澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村汰換管線工程	西嶼鄉竹篙灣村	工務段/西嶼鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=8921m w=0.6m~1m、 L=6844m	預計115年度	203縣道禁挖至115/3 大義宮旁(澎2)公所計畫刨鋪 施工範圍重新修正再送圖簽核			照案通過(除禁挖路段，請與公所確認範圍)

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明	114年度第1次決議	配合事項	114年度第2次決議
★34	114-2-25	台灣固網股份有限公司	馬公市四維路. 後窟潭管道埋設工程	四維路. 敬業街. 後窟潭	澎湖縣政府/馬公市公所	<input checked="" type="checkbox"/> 台灣固網 <input type="checkbox"/> 自來水公司 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長38m. 寬0.6m	預計114年9月~114年12月	四維(進共管)、敬業禁挖至116/5月底 後窟潭縣府預計115年上半年度進場			保留提案(未與會說明)

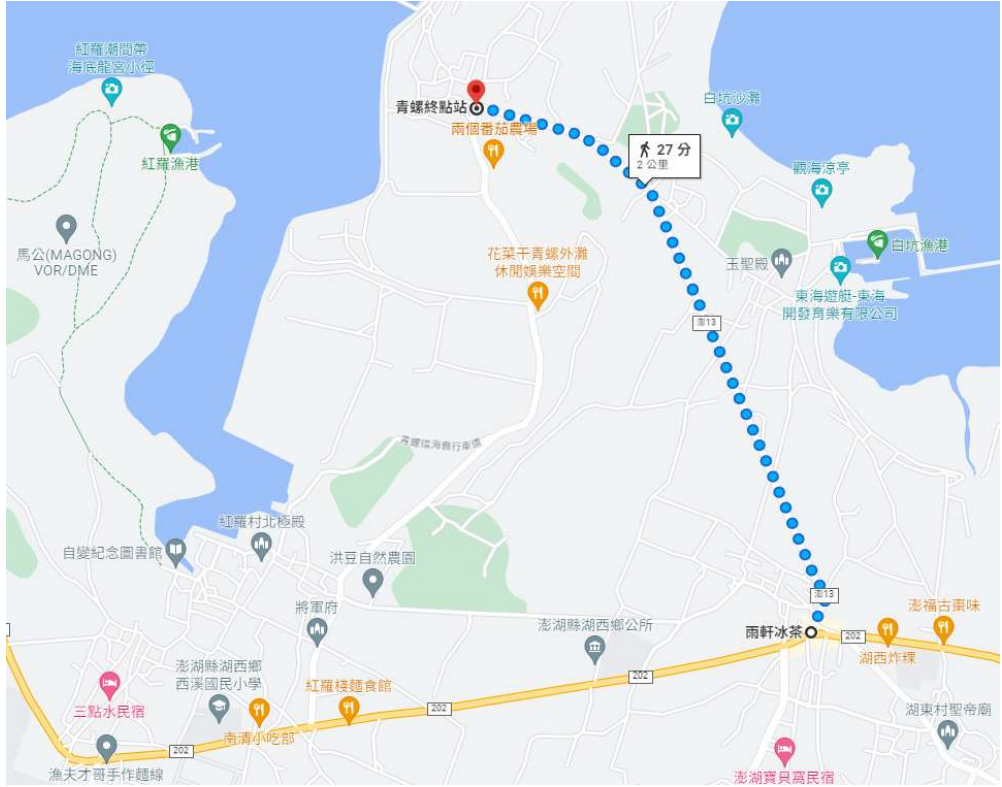
澎湖縣轄區內115年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整表

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明
1	115-1	澎湖縣政府 土木科	縣道擇要路面修復工程	1. 202縣道7K+150-7K+900(郵局~澎福古棗味) 2. 204縣道7K+120-7K+690(隘門)	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視 ■警察局	1. W=16, L=750 2. W=12, L=570	預計116年度	隘門-林投路段自來水汰換工程儘速配合
2	115-2	澎湖縣政府 土木科	115年度縣道改善工程	203縣道28K+000~34K+200	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		尚在設計中	
3	115-3	澎湖縣政府 土木科	115年度市區改善工程	1. 貿商街(光榮公園-光榮街) 2. 光榮街(貿商街-三多路) 3. 朝陽路(貿商街-光復路) 4. 光榮公園北側道路 5. 樂群街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115/3/31開工	
4	115-4	澎湖縣政府 土木科	115年度村里道路改善工程	前寮、烏崁、鎖港、重光	馬公市公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年4月底進場	
5	115-5	澎湖縣政府 土木科	115年度村里道路改善工程(第二標)	南寮、西溪、白坑	湖西鄉公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		設計中 預計115年10月底進場	
6	115-6	澎湖縣政府 土木科	桶盤村里道路改善工程	桶盤	馬公市公所	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		設計中 預計115年8月底進場	
7	115-7	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公市雨水下水道系統MB8幹線改善工程	馬公市石滬廣場	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視	長70M、寬4M	預計115年10月進場	
8	115-8	澎湖縣政府 下水道科	澎湖縣馬公地區第二期光榮系統用戶接管工程第一標	馬公市五福路78巷(含周邊巷道)、61巷(含周邊巷道)、重光活動中心旁、四維路人行道(含周邊巷道)、自強街	澎湖縣政府	■台電 ■自來水 ■中華電信 ■澎湖有線電視		預計115年10月進場	

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明
9	115-9	澎湖縣政府 下水道科	115年度排水改善工程	西嶼鄉外垵村里道路	澎湖縣政府	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長60M、寬1M	預計115年4月進場	
10	115-10	澎湖縣政府 下水道科	光榮水資源回收中心廠外繞流管路改善工程	馬公市民族路	澎湖縣政府	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長5M、寬1M	預計115年6月進場	
11	115-11	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉村里道路挖掘改善工程	1、湖西43-26號至43-18號道路改善 2、青螺19號至47-1號道路改善 3、成功1-43號至226號道路面改善 4、潭邊2-11號至東明宮路口及至2-10號道路改善	澎湖縣湖西鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長：約500公尺 寬：約3.5~7公尺	115年6月~12月	
12	115-12	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉農路改善工程	1. 編號：農澎湖011	澎湖縣湖西鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長：約430公尺 寬：約4公尺	115年6月~12月	
13	115-13	澎湖縣湖西鄉公所	115年度湖西鄉農路改善工程	1. 編號：農澎湖018	澎湖縣湖西鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長：約500公尺 寬：約4公尺	115年6月~12月	
14	115-14	澎湖縣湖西鄉公所	太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程	1、城北村宅19號至21號水溝改善-(全長20M*寬約0.6M) 2. 編號：隘門村宅60-8號路面改善：(全長35.5M*路寬約3~4M) 3. 編號：隘門村宅108號路面改善：(全長128M*路寬約	澎湖縣湖西鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	1-長：約0.6公尺 寬：約5~7.5公尺 2、3-長：約173.5公尺 寬：約2~5公尺	115年6月~12月	
15	115-15	澎湖縣白沙鄉公所	115年度白沙鄉管線挖掘道路鋪面改善工程	白沙鄉中屯村	白沙鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	長：約336.5公尺 寬：約3~5公尺	預計115年3月進場	
16	115-16	海軍馬公通信隊	海軍管道強化案	205縣道陸軍一支部口至菜園路口段	澎湖縣政府	陸軍一支部	長416.84公尺 寬0.6公尺	預計115年5月進場	目前於編案階段

項次	提報年度及編號	施工單位	工稱項目名稱概要	施工範圍	路權單位名稱	配合之管線單位	施工寬、長	施工期程	說明
17	115-17	澎湖縣政府警察局	配合縣道改善工程道路刨鋪下地作業	縣道204線與鳳凰殿岔路口	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115年2月施工	免收路修費
18	115-18	澎湖縣政府警察局	新設號誌埋設管線工程	澎17與縣道204線岔路口	澎湖縣政府	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115年施作	
19	115-19	澎湖縣政府警察局	新設號誌埋設管線工程	縣道203線與四季常照岔路口	公路局 澎湖工務段	<input checked="" type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115年施作	
20	115-20	澎湖縣政府警察局	號誌管線下地工程	縣道204線與縣道201線岔路口(興仁圓環)	澎湖縣政府	<input type="checkbox"/> 台電 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視		預計115年施作	
21	115-21	台灣自來水公司第七區管理處	馬公市五福路管線汰換工程	馬公市五福路	馬公市公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=2300m	發包公告中，預計115年7月進場	
22	115-22	台灣自來水公司第七區管理處	湖西鄉204縣配合道路整修管線汰換	湖西鄉204線隘門路口到澎19路口	澎湖縣政府	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=1350m	發包公告中，預計115年7月進場	
23	115-23	台灣自來水公司第七區管理處	望安鄉全鄉管線汰換		望安鄉公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=12000m	設計提報中，預計115年10月進場	
24	115-24	台灣自來水公司第七區管理處	馬公市三多路、朝陽路管線汰換	三多路、朝陽路、中華路、三民路	馬公市公所	<input type="checkbox"/> 台電 <input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 中華電信 <input type="checkbox"/> 澎湖有線電視	w=0.6m~1m、 L=4081m	提送設計中，預計115年10月進場	


### 113 年度提報列管之道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>113-11</p> <p>澎 13 線 0K+000~2K+200</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	
<p>113-39</p> <p>白坑村(社區)架空線 路地下化預埋 埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司 澎湖區處</p>	

編號	位置	圖
<p>113-40</p> <p>七美鄉平和村線路改善預埋管路工程</p> <p>提案單位： 臺灣電力股份有限公司澎湖區處</p>		
<p>113-43</p> <p>澎湖湖七美鄉平和村汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		

編號	位置	圖
<p>113-55</p> <p>「澎 20 線道路拓寬工程 (烏崁-隘門)」</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	 <p>A map showing the proposed widening of Highway 20 from Wukang to Aimen. The route is highlighted with a blue dotted line. Key locations include Penghu Airport, Penghu National Rental Car Company, and various local businesses and landmarks. A scale bar indicates 2.2 kilometers.</p>	
<p>113-58</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程- 主次幹管工程第一標 (藍色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>	 <p>A map of Matsu City showing the proposed wastewater sewerage system. The main route is highlighted with a blue line, and secondary routes are shown in green. Key locations include the Matsu City Market, Matsu City Middle School, and various commercial and public facilities. The map shows the system's layout relative to the city's streets and waterfront.</p>	

編號	位置	圖
<p>113-59</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程 -P1 揚水站及壓力管工程(綠色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>		
<p>113-60</p> <p>澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期工程-分支管網及用戶接管工程第一標 (Ca)(紅色路段)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>		

編號	位置
<p>113-61</p> <p>114 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>	
<p>113-62</p> <p>馬公市台電舊電廠內計畫道路開闢工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 建設處</p>	

編號	位置	圖
<p>113-2-5</p> <p>澎湖縣白沙鄉赤崁村管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所</p>		
<p>113-2-10</p> <p>澎湖縣馬公市民生治平路等管線汰換工程</p> <p>提案單位： 自來水公司</p>		

編號	位置	圖
<p>113-2-12</p> <p>台灣中油 6 吋長途管線智慧型通管器檢查後開挖驗證</p> <p>提案單位： 台灣中油澎湖營業處湖西供油服務中心</p>	 <p>The map shows a coastal area with a large body of water. A road labeled '湖11' runs along the shore. A yellow line indicates the location of the project, which is a 6-inch long-distance pipeline. A blue box highlights a specific area near the water, labeled '成功漁港'. The map also shows some buildings and a green area in the lower-left corner.</p>	


### 114 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

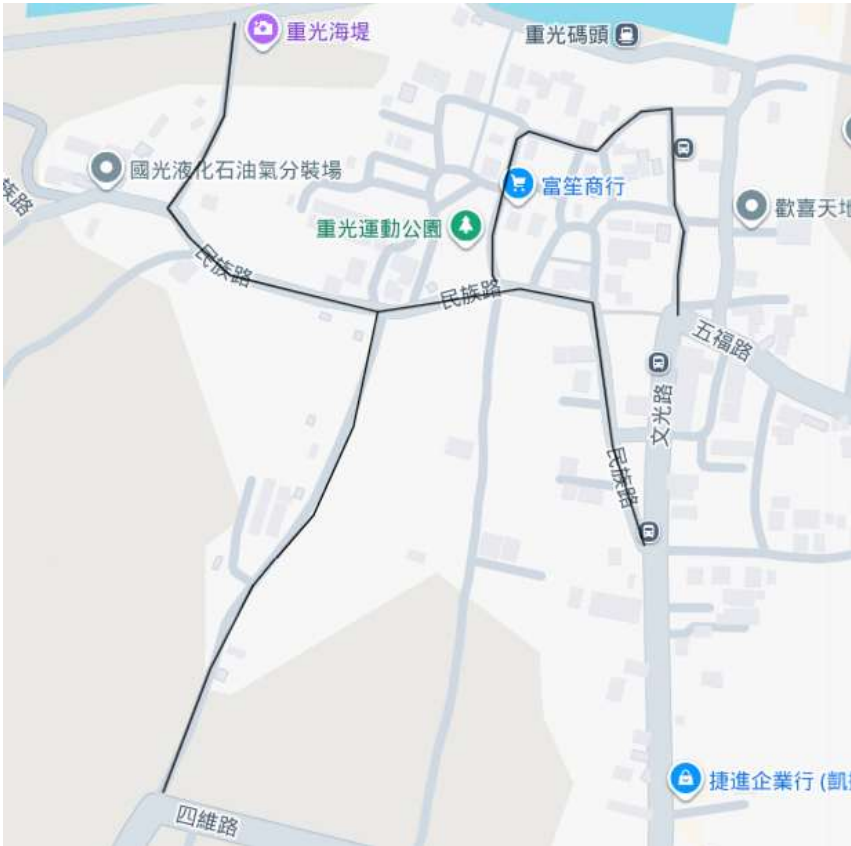

編號	位置
<p>114-1</p> <p>澎湖縣白沙鄉中正、永安橋整建工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	
<p>114-9</p> <p>西安村人行環境暨路口改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 望安鄉公所</p>	

編號	位置
<p>114-11</p> <p>69kV 澎湖-馬公紅白線 M41 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>	
<p>114-12</p> <p>69kV 澎湖-馬公紅白線 M36~M40 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>	

編號	位置	圖
<p>114-13</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M10-M12 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		
<p>114-14</p> <p>69kV 澎湖~馬公紅白線 M21-M23 人孔提升及降埋</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		



編號	位置	圖
<p>114-18</p> <p>監視系統裝設</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		
<p>114-2-1</p> <p>澎湖馬公市西文里社會住宅計畫道路開闢工程</p> <p>提案單位： 國土管理署 南區工程署</p>		

編號	位置	圖
<p>114-2-2</p> <p>澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>114-2-3</p> <p>澎湖縣馬公市區民福路人行空間改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		

編號	位置	圖
<p>114-2-5</p> <p>115 年度鄉道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>114-2-6</p> <p>115 年度鄉道改善工程 第二標</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		


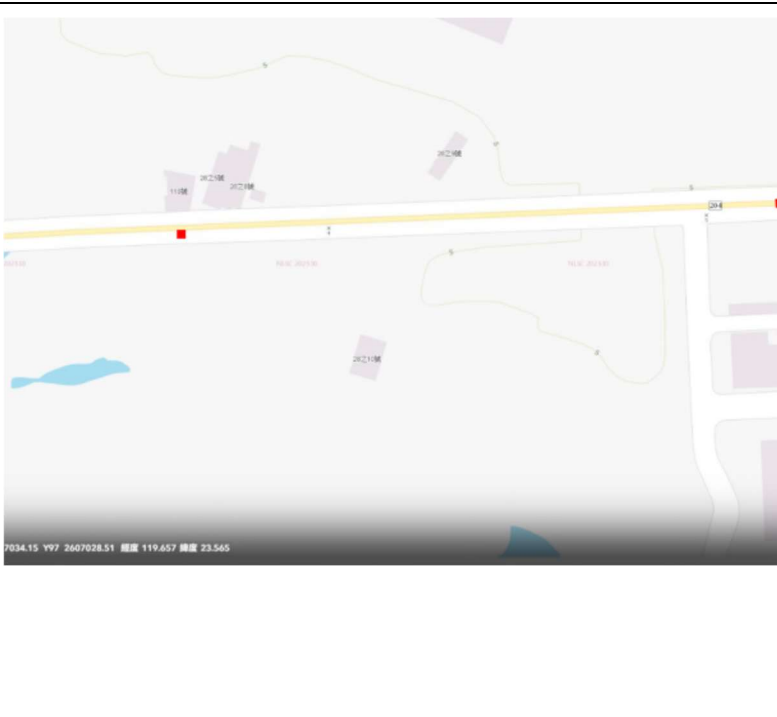
編號	位置	圖
<p>114-2-7</p> <p>114 年度村里道路急需改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木工程</p>		
<p>114-2-8</p> <p>114 年度村里道路急需改善工程 (第二標)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木工程</p>		

編號	位置	圖
<p>114-2-9</p> <p>114 年度望安鄉將軍及東吉村里道路急需改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		圖
<p>114-2-10</p> <p>114 年度桶盤村里道路急需改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		圖

編號	位置	圖
<p>114-2-11</p> <p>114 年度鳥嶼村里道路急需改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>114-2-12</p> <p>115 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		

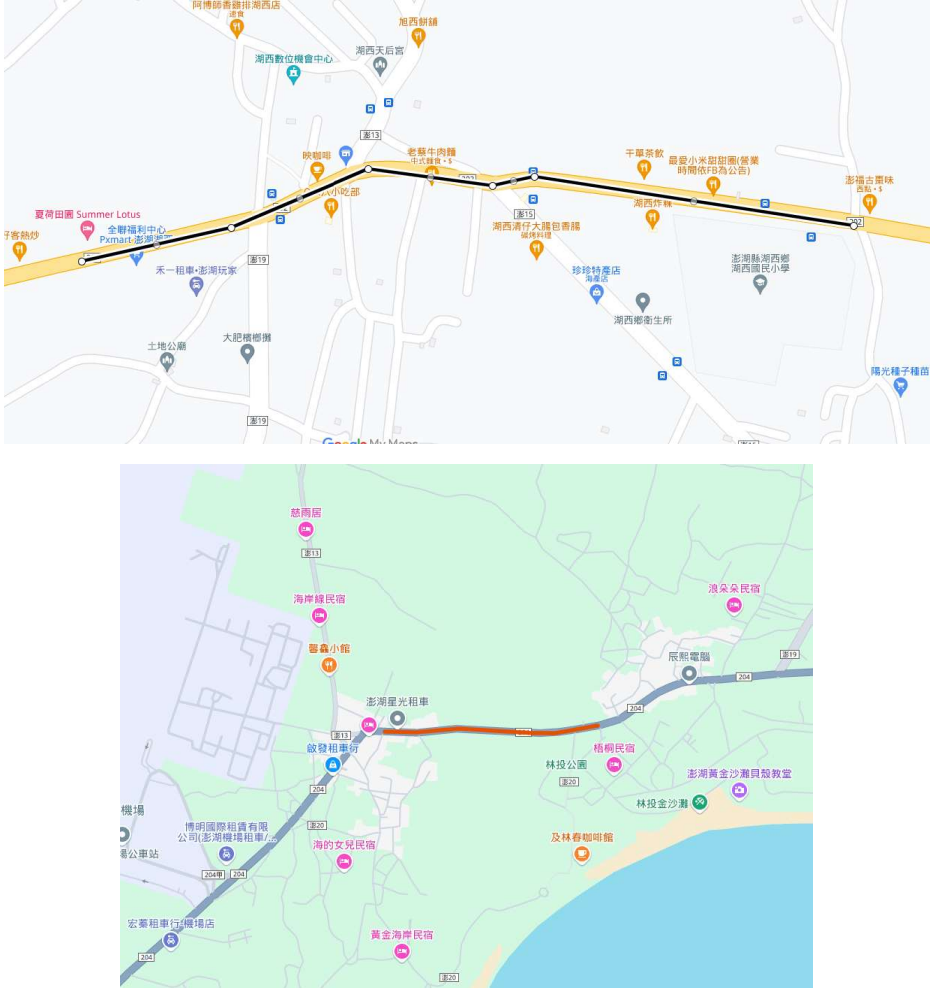

編號	位置	圖
<p>114-2-13</p> <p>116 年度澎湖縣道路挖掘 AC 標開口契約</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>114-2-14</p> <p>115 年度雨水下水道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>		

編號	位置	圖
<p>114-2-15</p> <p>澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程(114年度後續擴充)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>114-2-16</p> <p>外垵村道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所</p>	 <p>現況檢照</p> <p>A段工程概要說明： 1.水溝新設污水管長合計共118m。 2.新設檢井每5m設置1組；共計23組。 3.既有PC鋪面打除，重新鋪設共250.5m<sup>2</sup>。 4.新設鋪面厚度為15cm。</p>  <p>現況檢照</p> <p>B段工程概要說明： 1.水溝新設污水管長合計共49.7m。 2.新設檢井每5m設置1組；預計9組。 3.既有PC鋪面打除面積共86.5m<sup>2</sup>。 4.新設鋪面厚度為15cm。</p>	 <p>施工平面圖</p> <p>C段工程概要說明： 1.水溝新設污水管長合計共118.8m。 2.新設檢井每5m設置1組；預計23組。 3.既有PC鋪面打除面積共278.4m<sup>2</sup>。 4.新設鋪面厚度為15cm。</p>  <p>現況檢照</p> <p>D段工程概要說明： 1.水溝新設污水管長合計共61.6m。 2.新設檢井每5m設置1組；預計12組。 3.既有PC鋪面打除面積共115.6m<sup>2</sup>。 4.新設鋪面厚度為15cm。</p>  <p>現況檢照</p> <p>澎湖縣西嶼鄉公所</p> <p>工程名稱：外垵村道路挖掘改善工程</p> <p>圖名：施工平面圖、工程概要說明</p> <p>圖序：03</p> <p>圖號：(6)</p>

編號	位置	圖
<p>114-2-17</p> <p>西嶼鄉竹灣橫礁道路修繕工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 西嶼鄉公所</p>		
<p>114-2-20</p> <p>69kV澎湖~馬公紅白線M2、69kV澎湖~尖山紅白線M1人孔微創開孔檢視</p> <p>提案單位： 台電嘉南供電區營運處</p>		


編號	位置	圖
<p>114-2-24</p> <p>澎湖縣西嶼鄉竹篙灣村汰換管線工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>		
<p>114-2-25</p> <p>馬公市四維路.後窟潭管道埋設工程</p> <p>提案單位： 台灣固網股份有限公司</p>		

## 115 年度提報預計辦理之道路及管線工程項目彙整位置圖

編號	位置
<p>115-1</p> <p>202 縣道 7K+150-7K+900(澎湖郵局~澎湖古棗味)</p> <p>204 縣道 7K+120-7K+690(隘門)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	
<p>115-2</p> <p>115 年度縣道改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	

編號	位置	圖
<p>115-3</p> <p>115 年度市區改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	 <p>The map shows an urban area with several streets including 三多路, 敬業街, 光復路, 朝陽路, and 文林街. Two red circles highlight specific areas: one around the 'butterfly Cafe' and another around '光榮公園' (Guangrong Park). Other landmarks include 'DAISY HOUSE' and '文康滷菜'.</p>	
<p>115-4</p> <p>115年度村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>	 <p>The map shows a rural area with a road improvement project indicated by a line with circles. Landmarks include '暗仁預拌企業有限公司', '資源場', and '澎湖滿之音露營區'. A road labeled '區25' is also visible.</p>	

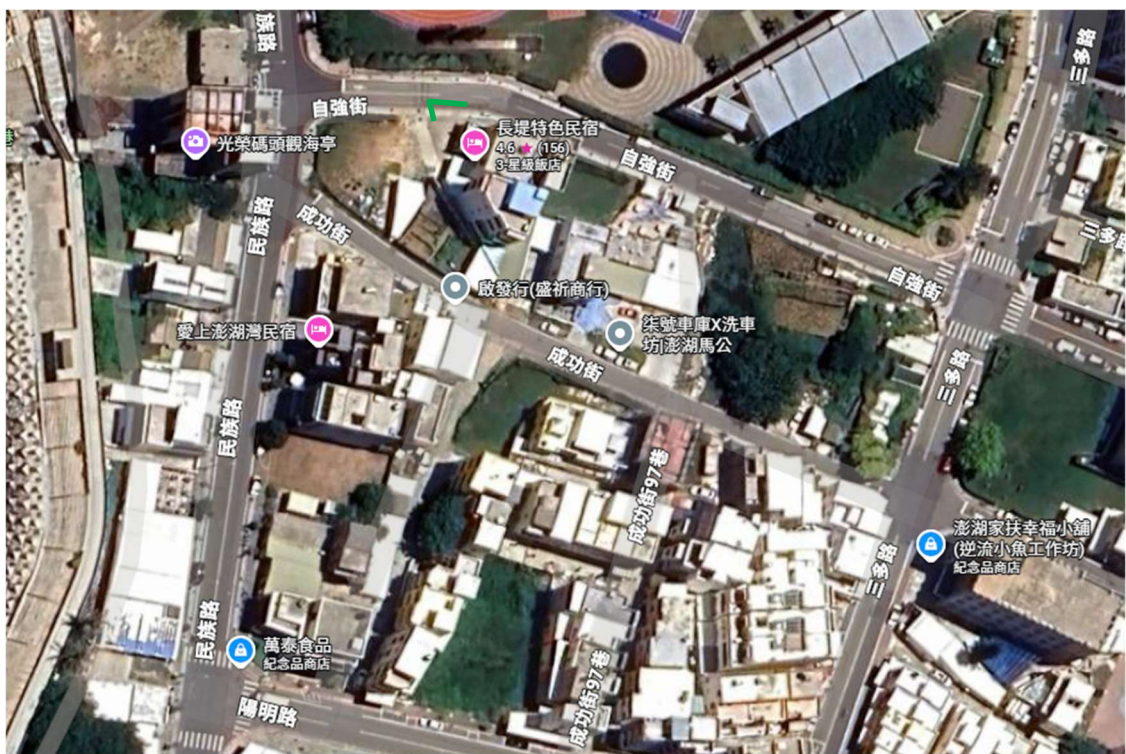



編 號	位 置	圖
<p>115-5</p> <p>115 年度村里 道路改善工程 (第二標)</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		


編號	位置	圖
<p>115-6</p> <p>桶盤村里道路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		
<p>115-7</p> <p>澎湖縣馬公市雨水下水道系統 MB8 幹線改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>		

編號	位置
<p>115-8</p> <p>五福路 78 巷 (含周邊巷道)、61 巷 (含周邊巷道)、重光活動中心旁、四維路人行道(含周邊巷道)、自強街</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>	





<p>115-9</p> <p>外垵村里道路</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 下水道科</p>	
--	--

編 號	位 置	圖
<p>115-10</p> <p>光榮水資源回收中心廠外繞流管路改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 土木科</p>		

編號	位置
<p>115-11</p> <p>115 度湖西鄉村里道路挖掘改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	<p>(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-湖西村工區</p>  <p>位置圖-澎 41 號線湖西 43-26 號至 43-18 號前路段</p> <p>(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-青螺村工區</p>  <p>位置圖-青螺 19 號至 47-1 號宅路口路段</p>

(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-成功村工區





位置圖-成功 1-43 號至 226 號宅前路段

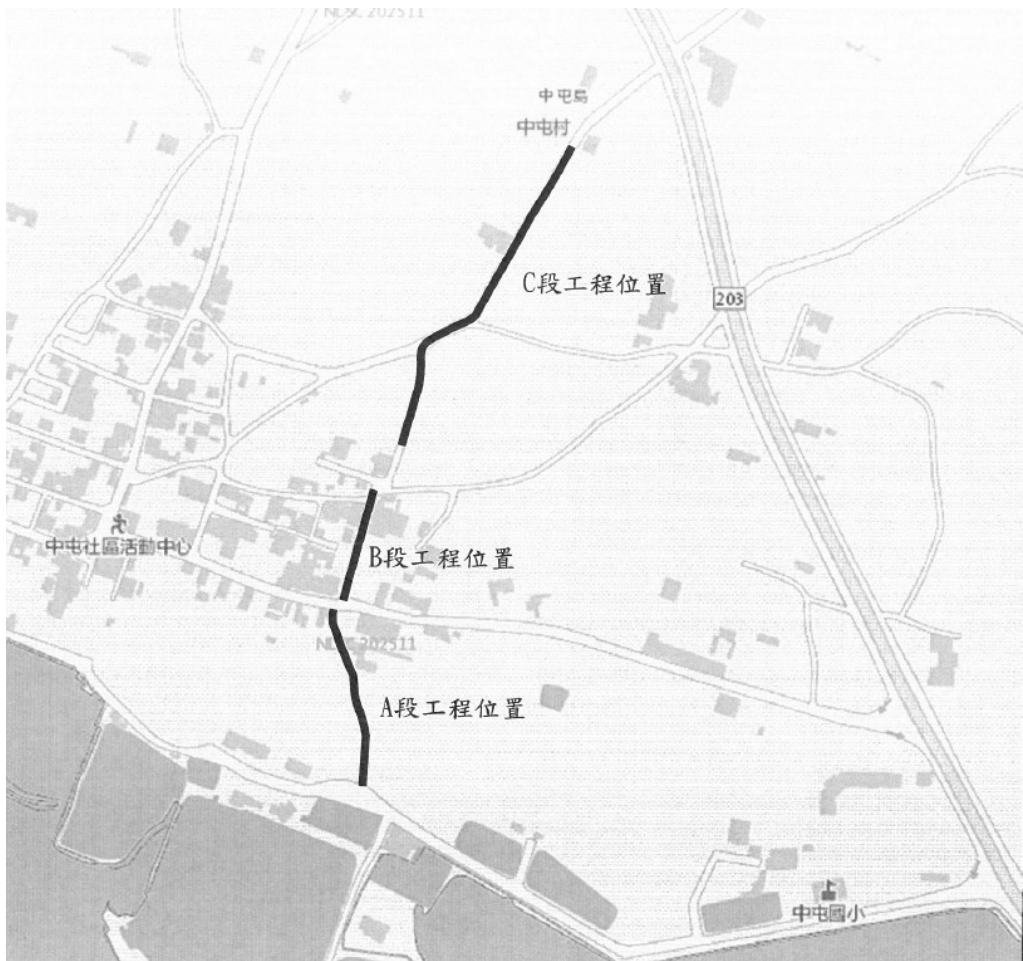
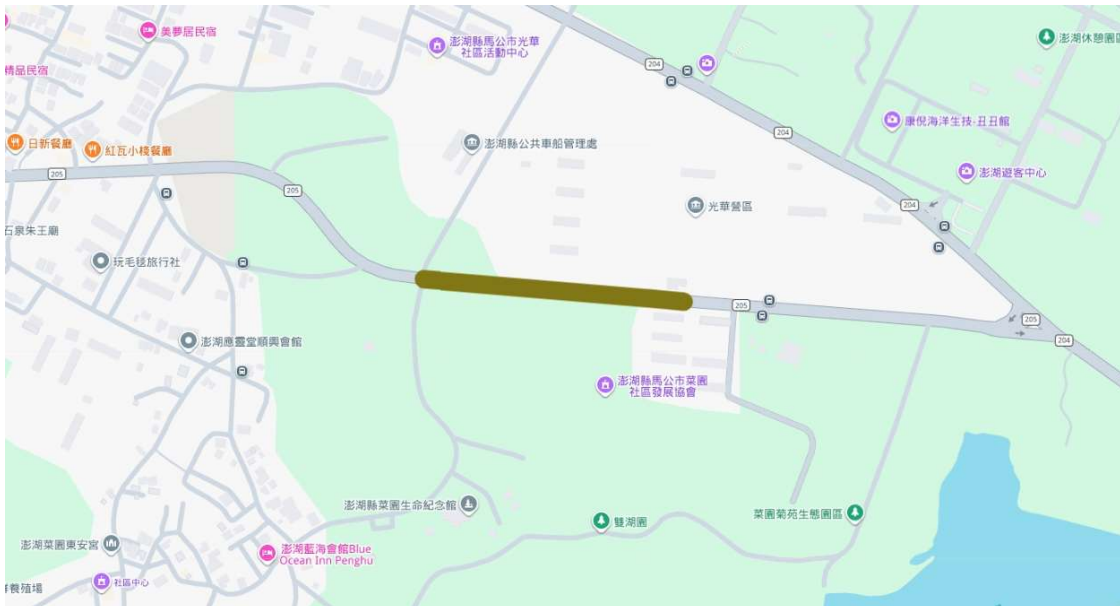
(115)湖西鄉村里道路挖掘改善工程-潭邊村工區



位置圖-潭邊 2-11 至東明宮路口及至 2-10 號宅前路段

編號	位置	圖
<p>115-12</p> <p>115 年度湖西鄉農路改善工程 澎湖縣湖西鄉西溪新段 164、172、202 地號區間</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		
<p>115-13</p> <p>115 年度湖西鄉農路改善工程(農澎湖 018) 澎湖縣湖西鄉西溪北營區到南營區 區間</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>		

編號	位置	圖
<p>115-14</p> <p>太武村、城北村、隘門村環境設施改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣湖西鄉公所</p>	 <p>隘門60-8宅前路打除重鋪混凝土鋪面，<math>W=3m</math>，<math>th=0.15m</math>，<math>L=35.5m</math>              隘門60-8宅前溝面打除重做，<math>W=0.8m</math>，<math>th=0.15m</math>，<math>L=35.5m</math>              隘門108前路打除重鋪混凝土路面，<math>W=2.7、3.35、5m</math>，<math>th=0.15m</math>，  <math>L=60+36+42=138m</math></p>  <p>施工內容：              城北村19號至21號宅前溝面打除重做，<math>W=0.9m</math>，<math>th=0.15m</math>，<math>L=20m</math></p>	

編號	位置	圖
<p>115-15</p> <p>115 年度白沙鄉管線挖掘道路鋪面改善工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣白沙鄉公所</p>		
<p>115-16</p> <p>海軍管道強化案</p> <p>提案單位： 海軍馬公通信隊</p>		

編號	位置	圖
<p>115-17</p> <p>204 縣道與鳳凰殿岔路口配合縣道改善工程道路刨鋪下地作業</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		
<p>115-18</p> <p>澎 17 與縣道 204 線岔路口新設號誌埋設管線工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		

編 號	位 置	圖
<p>115-19</p> <p>縣道 203 線 與四季常照 岔路口新設 號誌埋設管 線工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		
<p>115-20</p> <p>縣道 204 線 與縣道 201 線岔路口 (興仁圓環) 號誌管線下 地工程</p> <p>提案單位： 澎湖縣政府 警察局</p>		

編號	位置
<p>115-21</p> <p>馬公市五福路管線汰換工程</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>	
<p>115-22</p> <p>湖西鄉 204 縣配合道路整修管線汰換</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>	

編號	位置
<p>115-23</p> <p>望安鄉全鄉管線汰換</p> <p>提案單位： 台灣自來水公司第七區管理處</p>	



